

รายงานสถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2567
เดือนตุลาคม 2566 - เมษายน 2567

① งบสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2567 มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขต (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 มีภาพรวมงบประมาณดำเนินการ 7,053 ครั้วเรือน คงเหลืองบประมาณรอดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงิน 733,913,184.54 บาท รายละเอียดภาพรวมโครงการ ดังนี้

ตารางภาพรวมการอนุมัติ-เบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.2567

โครงการ	งบที่ได้รับจัดสรร (1)	อนุมัติงบประมาณ		รับคืนเงินจากชุมชน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณ		เงินคงเหลือ		รวมคงเหลือ ณ 30 เม.ย.2567
		จำนวนเงิน (2)	ครั้วเรือน		ค่าบริหารจัดการ(4)	เงินอุดหนุน(5)	รอเบิกจ่าย(2)-(3)-(5)	รอจัดสรร(1)-(2)-(4)	
1.งบสนับสนุนปี 2560	751,360,000.00	404,129,523.00	2,968	89,892,728.00	47,406,400.00	471,251,735.00	22,770,516.00	299,824,077.00	322,594,593.00
2.งบสนับสนุนปี 2561	199,680,000.00	177,687,669.00	927	863,800.00	-	195,201,903.46	4,879,000.00	462,896.54	5,341,896.54
3.งบสนับสนุนปี 2563	548,240,000.00	510,329,381.00	3,115	2,133,500.00	34,703,592.00	333,246,623.00	177,154,758.00	5,140,277.00	182,295,035.00
4.งบสนับสนุนปี 2564	175,120,000.00	3,892,628.00	43	-	11,085,096.00	1,351,128.00	2,541,500.00	160,142,276.00	162,683,776.00
5.งบสนับสนุนปี 2565	35,200,000.00	-	-	-	2,228,160.00	-	-	32,971,840.00	32,971,840.00
6.งบสนับสนุนปี 2566	17,600,000.00	-	-	-	1,114,100.00	-	-	16,485,900.00	16,485,900.00
7.งบสนับสนุนปี 2567	12,320,000.00	-	-	-	779,856.00	-	-	11,540,144.00	11,540,144.00
รวม	1,739,520,000.00	1,096,039,201.00	7,053	92,890,028.00	97,317,204.00	1,001,051,389.46	207,345,774.00	526,567,410.54	733,913,184.54

② รายงานสถานะการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม-เมษายน 2567 (ไตรมาส 3)

งบดำเนินโครงการใช้งบประมาณคงเหลือมาดำเนินการต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2567 เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 จำนวน 100 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 17,600,000 บาท โดยได้รับอนุมัติงบจัดสรรให้กับชุมชน จำนวน 70 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 12,320,000 บาท หักเป็นงบสำหรับใช้ดำเนินงาน 779,856 บาท คงเหลือใช้สนับสนุน จำนวน 11,540,144 บาท ณ เดือนเมษายน 2567 มีสถานะการดำเนินโครงการ ดังนี้

ตารางสรุป ณ 30 เม.ย.2567

โครงการ	ณ 30 ก.ย. 2566					ดำเนินการปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.-ก.ย.67)							คงเหลือรอเบิก	คงเหลืองบจัดสรร	
	งบที่ได้รับจัดสรร		คงเหลืองบจัดสรร	คงเหลือดำเนินการในปี 67		คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืนยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณ	คืนงบประมาณ	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย			ร้อยละ
	งบประมาณ	ครั้วเรือน	งบประมาณ	งบประมาณ	ครั้วเรือน										
1.คลองลาดพร้าว	751,360,000	4,696	299,824,077	24,193,162.00	2,968	-	-	2,968	-	-	-	1,422,646.00	5.88	22,770,516.00	299,824,077.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ค86568	338,112,000	-	144,340,239.00	19,229,897.00	-	-	-	-	-	-	-	958,049.00	-	18,271,848.00	144,340,239.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ค86668	365,841,600	-	155,483,838.00	4,963,265.00	-	-	-	-	-	-	-	464,597.00	-	4,498,668.00	155,483,838.00
-งบดำเนินงาน	47,406,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.คลองเปรมประชากร	988,260,000	5,407	231,477,833.54	204,950,423.00	4,068	17	-	4,085	6,667,750.00	200,250.00	1,933,250.00	27,042,915.00	13.30	184,575,258.00	226,743,333.54
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2561-62	199,680,000	927	606,896.54	5,214,394.00	927	-	-	927	144,000.00	-	-	479,394.00	9.19	4,879,000.00	462,896.54
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2563	548,240,000	3115	7,189,277.00	199,736,029.00	3,115	-	-	3,115	3,982,250.00	200,250.00	1,933,250.00	26,563,521.00	13.30	177,154,758.00	5,140,277.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2564	175,120,000	995	162,683,776.00	-	26	17	-	43	2,541,500.00	-	-	-	-	2,541,500.00	160,142,276.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2565	35,300,000	200	32,971,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,971,840.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2566	17,600,000	100	16,485,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,485,900.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2567	12,320,000	70	11,540,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,540,144.00
รวม	1,739,620,000	10,103	531,301,910.54	229,143,585.00	7,036	17	-	7,053	6,667,750.00	200,250.00	1,933,250.00	28,465,561.00	13.30	207,345,774.00	526,567,410.54

รายละเอียดตามข้อ 1-2

1. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560-2567

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2566 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 2,968 ครัวเรือน 24,193,162 บาท

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองลาดพร้าวในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงิน 1,422,646 บาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ 9 องค์กร 599 ครัวเรือน มีงบคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 22,770,516 บาท

2. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณปี 2561-2567

2.1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2561-2562 มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 927 ครัวเรือน 5,214,394 บาท

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2567 มีการเบิกงบคงเหลือรอเบิกจ่าย 479,394 บาท และได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าว 144,000 บาท จึงมีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ 4,879,000 บาท

2.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2563 มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 3,115 ครัวเรือน จำนวนเงิน 199,736,029 บาท

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2567 ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชน จำนวน 3,982,250 บาท มีการเบิกจ่าย 26,563,521 บาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ 177,154,758 บาท

2.3 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2564 มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบ สผ. จำนวนเงิน 1,351,128 บาท โดยมีงบประมาณดำเนินการสำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 162,683,776 บาท

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 องค์กร 17 ครัวเรือน จำนวน 2,541,500 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2565-2567 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

③ สถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

1. คลองลาดพร้าว กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ดำเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ 7 เขต คือ พื้นที่ 1 เขตสายไหม 1,454 ครัวเรือน พื้นที่ 2 เขตหลักสี่และดอนเมือง 1,356 ครัวเรือน พื้นที่ 3 เขตบางเขน 1,469 ครัวเรือน พื้นที่ 4 เขตจตุจักร 1,283 ครัวเรือน และพื้นที่ 5 เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 1,507 ครัวเรือน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 35 ชุมชน 3,646 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.58 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,413 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 43 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 190 ครัวเรือน

ความคืบหน้าก่อสร้าง	ชุมชน	ครัวเรือน	สร้างเสร็จ	กำลังสร้าง	พร้อมสร้าง
สายไหม	10	1,454	1,199	-	-
ดอนเมือง/หลักสี่	6	1,357	778	12	41
บางเขน	8	1,469	664	-	41
จตุจักร	11	1,283	398	31	104
ห้วยขวาง/วังทองหลาง	15	1,506	374	-	4
รวม	50	7,069	3,413	43	190

2. คลองเปรมประชากร กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) เมื่อมิถุนายน 2561 คือ มีผู้รูกล้าลำน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน จากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน

ณ วันที่ วันที่ 30 เมษายน 2567 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 20 ชุมชน 1,768 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.69 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น


- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,257 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 352 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 159 ครัวเรือน

ตารางแสดงความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2567 (สิ้นเดือนกันยายน 2566 ถึงปัจจุบัน)

(คลองเปรมประชากรสามารถดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม 265 ครัวเรือน)

ผลการดำเนินงาน (ครัวเรือน)	พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2567			
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ	1,034	1,057	1,097	1,117	1,197	1,214	1,257	1,257
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	368	349	410	411	336	393	352	352
- พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	101	274	173	171	166	155	159	159
รวม	1,503	1,680	1,680	1,699	1,699	1,762	1,768	1,768
คิดเป็นร้อยละ	23.54	26.31	26.31	26.61	26.61	27.59	27.69	27.69
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า		177	-	19	-	63	6	-

แผนภูมิเปรียบเทียบความคืบหน้าการดำเนินงาน

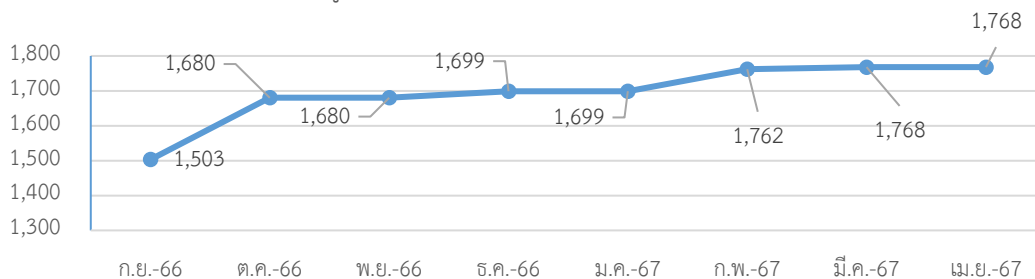

④ สรุปปัญหา/ข้อติดขัดการดำเนินงานโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1. ผู้ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ ไม่รู้ย้ายบ้านเดิม มีกลุ่มแกนนำต่อต้านโครงการให้ข้อมูล บิดเบือนไม่เป็นความจริง เช่น ที่ดินริมคลองไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ และสามารถออกโฉนดได้ การรื้อย้ายบ้านเดิมจะต้องได้รับความ ชดเชยจากภาครัฐ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความลังเลไม่มั่นใจ ที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการ ซึ่งในบางชุมชนมีการรวมตัวปิด ล้อมพื้นที่งานก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถชี้แจงสร้างความเข้าใจและ ก่อสร้างตามแผนงานได้	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธนารักษ์ชี้แจงเรื่องขอบเขตที่ดินราชพัสดุ กรม ที่ดินชี้แจงยืนยันเรื่องการไม่สามารถออกโฉนดพื้นที่ ริมคลอง โดยทุกหน่วยงานให้ข้อมูลกับประชาชน ตรงกันเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการตามแผน แม่บทฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไปพร้อมกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชน และพิจารณาการใช้กฎหมาย

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

2. ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนงานของชุมชน
การดำเนินการของหน่วยงานร่วมบูรณาการล่าช้ากว่าแผนงาน อาทิ การอนุญาตให้เช่าที่ดิน การกำหนดขอบเขตที่ดิน ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน
3. บางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดดำเนินการ ไม่ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงการ เนื่องจากขาดความมั่นใจในแผนการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ กทม.
4. บางชุมชนคลองเปรมประชากรพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างบ้าน และต้องดำเนินการพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานอื่น เช่น การสร้างถนนของท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา

เพิ่มเติม

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงานและกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบเวลา ซึ่งจะทำให้การรื้อย้ายบ้านของประชาชนและการก่อสร้างเขื่อนดำเนินการไปได้ตามแผนงาน
3. สำนักการระบายน้ำ กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน พร้อมเร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อน
4. มีกลไกติดตามและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
