


รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคง
ปีงบประมาณ 2565 ณ 30 พฤศจิกายน 2564

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2564 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง เกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2564 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 3,750 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน จึงได้รวบรวม ผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 2 โครงการ ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณ ปี 2565 รวมทั้งสิ้น 8.830 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

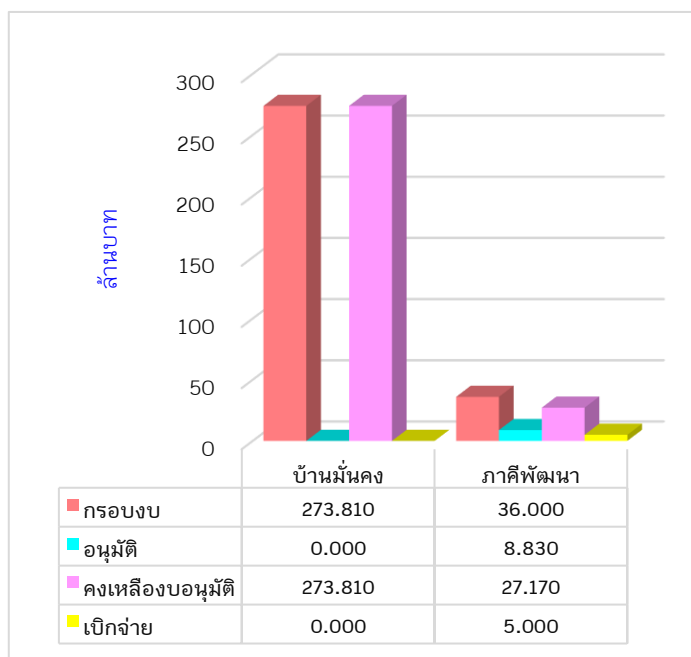

โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ		การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	จ่ายแล้ว (ล้านบาท)	งบคงเหลือรอเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด (บ้านมั่นคง)	273.810	-	-	-	-	-	-	273.810
พัฒนากระบวนเมือง (สนับสนุนภาคีพัฒนา)	36.000	2	8.830	5.000	3.830	56.62	13.88	27.170
รวม	309.810	2	8.830	5.000	3.830	56.62	13.88	300.980

1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ


เป้าหมายในการทำงานปี 2565 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 3,750 ครั้วเรือน ทั่วประเทศ สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 2.50 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2564

ภาค	ผลการอนุมัติตามมติคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงฯ						งบประมาณกระบวนเมือง		รวมอนุมัติทั้งสิ้น
	โครงการ	จังหวัด	เมือง	ชนบท	รวม	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	
กทม./ตะวันออก									-
กลาง/ตะวันตก									-
ตะวันออกเฉียงเหนือ									-
ใต้									-
เหนือ									-
สำนักบ้านมั่นคง							2	8,830,000	8,830,000
รวม	-	-	-	-	-	-	2	8,830,000	8,830,000

2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ปี 2565


เบิกจ่ายงบประมาณได้ 5.000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.62 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 3.830 ล้านบาท ทั้งนี้ เจ็อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้

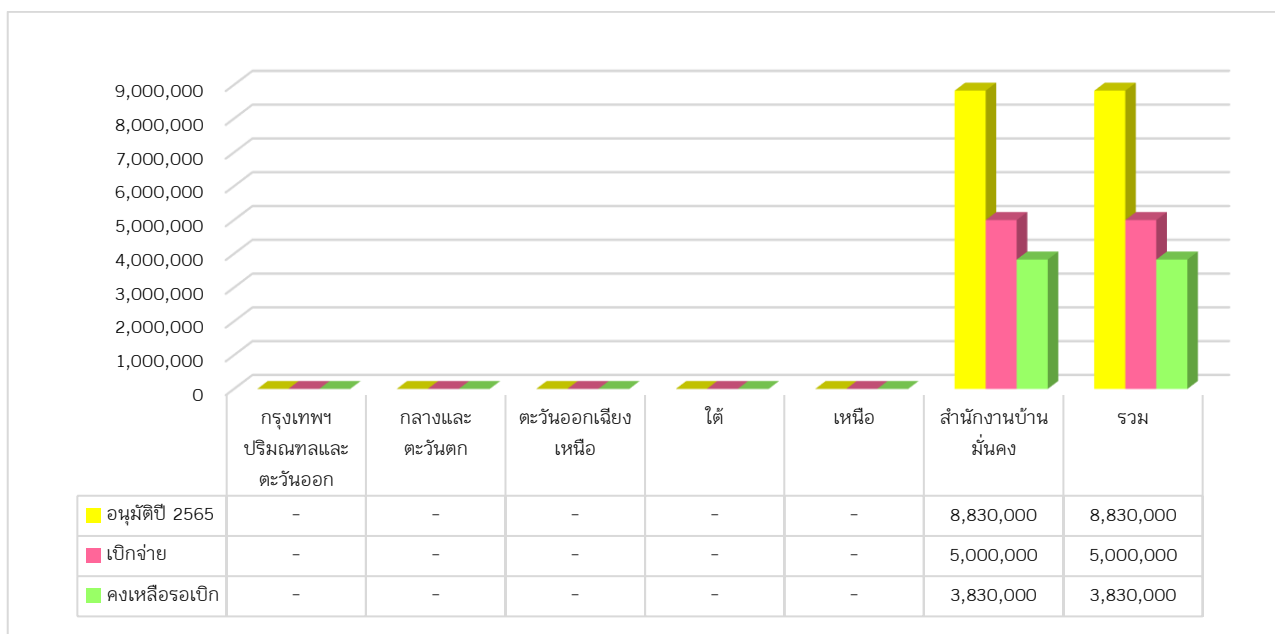

**รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่าย
ยกมาจากปีก่อนร่วมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2565**

ในปีงบประมาณ 2565 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2564 จำนวน 458.285 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2565 ทั้งสิ้น 8.830 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 467.115 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	คงเหลือยกมา+อนุมัติ ปี 2565	คิ่งบ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิก	ร้อยละเบิกจ่าย
กทม./ตะวันออก	160,509,476.00	-	400,000.00	160,109,476.00	0.25
กลาง/ตะวันตก	25,063,117.00	-	2,499,602.00	22,563,515.00	9.97
ตะวันออกเฉียงเหนือ	49,816,612.50	-	-	49,816,612.50	-
ใต้	45,979,633.00	-	-	45,979,633.00	-
เหนือ	104,500,736.00	-	480,000.00	104,020,736.00	0.46
สำนักบ้านมั่นคง	81,246,137.00	-	6,200,000.00	75,046,137.00	7.63
รวม	467,115,711.50	-	9,579,602.00	457,536,109.50	2.05

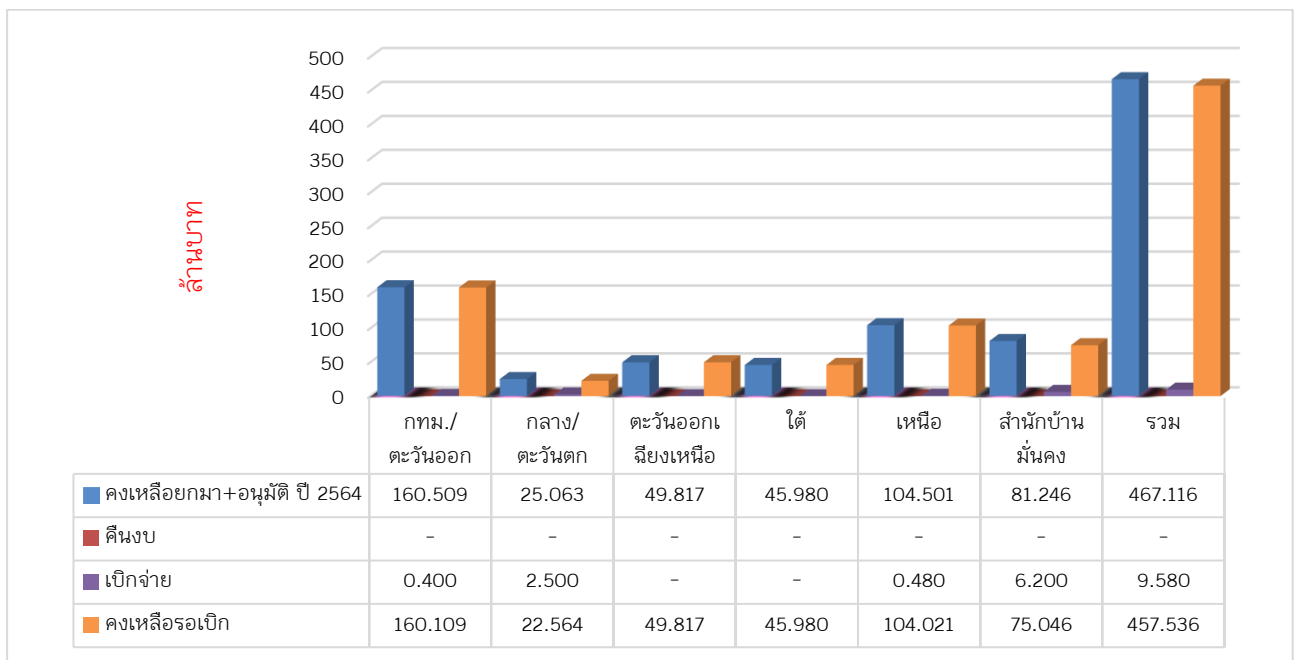

รายงานสถานะโครงการบ้านพอเพียง
ปีงบประมาณ 2565 ณ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 24,700 ครัวเรือน วงเงินรวม 555,750,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าพันเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นงบดำเนินงาน 29,621,475 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 526,128,525 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2565 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานภาคอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงยังไม่สามารถอนุมัติโครงการได้ ซึ่งแต่ละภาคมีเป้าหมายการดำเนินโครงการ ดังนี้

ภาค	จ.จังหวัด	จ.กลุ่ม จว.	เป้าหมาย	งบประมาณ		รวมงบประมาณ
				งบพัฒนาที่อยู่อาศัย	งบขับเคลื่อนกลไก	
กทม./ตะวันออก	13	3	4,800	98,400,000.00	3,843,705.00	102,243,705.00
กลาง/ตะวันตก	13	3	4,800	98,400,000.00	3,843,705.00	102,243,705.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	5	4,860	99,630,000.00	3891705	103,521,705.00
ใต้	14	3	4,800	98,400,000.00	3,843,705.00	102,243,705.00
เหนือ	17	4	4,800	98,400,000.00	3,843,705.00	102,243,705.00
สำนักบ้านมั่นคง			640	13,120,000.00	512000	13,632,000.00
รวม	77	18	24,700	506,350,000.00	19,778,525.00	526,128,525.00

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไลรื้อ ปีงบประมาณ 2565 ณ 30 พฤศจิกายน 2564


โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไลรื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2565 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 7,452 ครั้วเรือน วงเงินรวม 116,137,500 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 11,613,750 บาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 104,523,750 บาท เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 5,097 ครั้วเรือน วงเงินอนุมัติรวม 79,118,030 บาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,355 ครั้วเรือน งบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 25,405,720 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รับเงินงบประมาณจากรัฐ

กรอบงบ	เป้าหมาย ครั้วเรือน	งบรับจากรัฐ	งบดำเนินงานพัฒนา 10%	คงเหลืองบดำเนินการ	อนุมัติสุทธิ			คงเหลืองบดำเนินการ
					คก.	ครั้ว เรือน	จำนวนเงิน	
ปี 2559	1,170	21,060,000.00	2,106,000.00	18,954,000.00	30	1,448	16,346,447.00	3,255,553.00
ปี 2560	1,082	19,477,500.00	1,947,750.00	17,529,750.00	37	1,043	17,513,346.00	495,072.00
ปี 2561	1,200	21,600,000.00	2,160,000.00	19,440,000.00	15	1,148	19,385,724.00	7,756,855.00
ปี 2562	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	16,200,000.00	39	866	15,513,806.00	776,194.00
ปี 2563	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	16,200,000.00	14	504	8,774,707.00	9,302,787.00
ปี 2564	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	16,200,000.00	47	496	8,760,209.00	7,439,791.00
ปี 2565	1,000	18,000,000.00	1,350,000.00	16,650,000.00	-	-	-	16,650,000.00
รวม	7,452	134,137,500.00	12,963,750.00	121,173,750.00	182	5,505	86,294,239.00	45,676,252.00

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2564

กรอบงบ	เป้าหมาย ครั้วเรือน	คงเหลืองบดำเนินการ	อนุมัติสุทธิ			เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย
			คก.	ครั้ว เรือน	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย	
ปี 2559	1,170	18,954,000.00	30	1,448	16,346,447.00	16,346,447.00	-	100.00
ปี 2560	1,082	17,529,750.00	37	1,043	17,513,346.00	17,513,346.00	-	100.00
ปี 2561	1,200	19,440,000.00	15	1,148	19,385,724.00	19,043,724.00	342,000.00	98.24
ปี 2562	1,000	16,200,000.00	39	866	15,513,806.00	15,153,806.00	360,000.00	97.68
ปี 2563	1,000	16,200,000.00	14	504	8,774,707.00	7,874,707.00	900,000.00	89.74
ปี 2564	1,000	16,200,000.00	47	496	8,760,209.00	8,220,209.00	540,000.00	93.84
ปี 2565	1,000	16,650,000.00	-	-	-	-	-	-
รวม	7,452	121,173,750.00	182	5,505	86,294,239.00	84,152,239.00	2,142,000.00	97.52

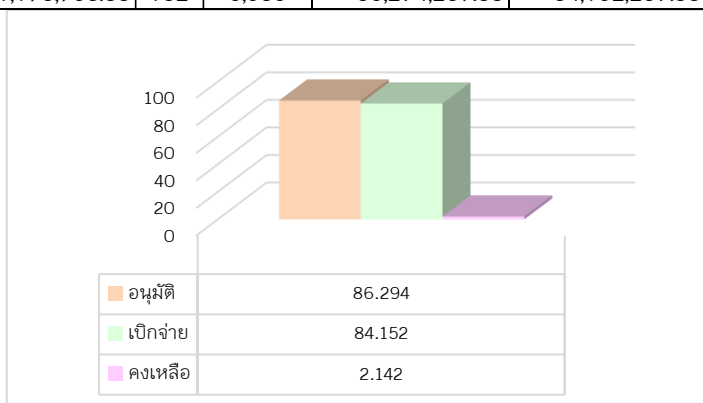

รายงานสถานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท
ปีงบประมาณ 2565 ณ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 500 ตำบล/เมือง วงเงินรวม 73,439,170 บาท (เจ็ดสิบล้านสามพันสี่แสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) หักเป็นงบดำเนินงาน 2,449,170 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 70,990,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ที่มาของงบประมาณประกอบด้วย

- งบประมาณอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 32,655,600 บาท แบ่งเป็น
 - (1) งบสนับสนุนการพัฒนา จำนวน 30,206,430 บาท
 - (2) งบเพื่อการบริหารจัดการโครงการ จำนวน 2,449,170 บาท
- งบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 40,783,570 บาท

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2565 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานภาคอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงยังไม่สามารถอนุมัติโครงการได้ ซึ่งแต่ละภาคมีเป้าหมายการดำเนินโครงการ ดังนี้

ภาค	จน.จังหวัด	จน.กลุ่ม จว.	จำนวนตำบล/เมือง	งบประมาณ		รวมงบประมาณ
				ตำบล/เมือง	ระดับภาค	
กทม./ตะวันออก	13	3	90	9,600,000.00	480,000.00	10,080,000.00
กลาง/ตะวันตก	13	3	90	9,600,000.00	480,000.00	10,080,000.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	5	150	16,000,000.00	480,000.00	16,480,000.00
ใต้	14	3	90	9,600,000.00	480,000.00	10,080,000.00
เหนือ	17	4	120	12,800,000.00	480,000.00	13,280,000.00
สำนักบ้านมั่นคง						10,990,000.00
รวม	77	18	540	57,600,000.00	2,400,000.00	70,990,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
