


**รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคง
ปีงบประมาณ 2566 ณ 31 ตุลาคม 2565**

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2566 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง เกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2565 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 3,750 คริวเรือนทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน จึงได้รวบรวม ผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 3 โครงการ ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6.600 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

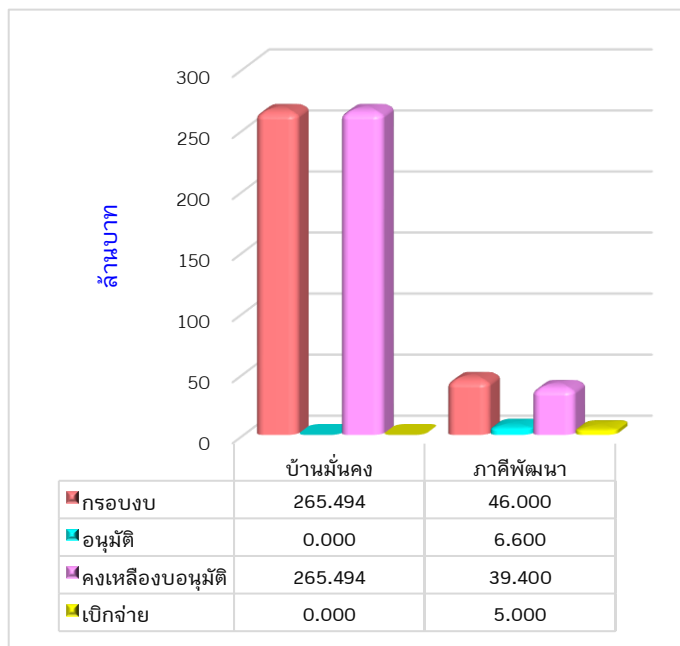

โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ		การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	จ่ายแล้ว (ล้านบาท)	คงเหลือรอเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด (บ้านมั่นคง)	265.494	-	-	-	-	0.00	0.00	265.494
พัฒนากระบวนเมือง (สนับสนุนภาคีพัฒนา)	46.000	3	6.600	5.000	1.600	75.76	10.87	39.400
รวม	311.494	3	6.600	5.000	1.600	75.76	1.60	304.894

1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ


เป้าหมายในการทำงานปี 2565 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 3,750 ครั้วเรือน ทั่วประเทศ สามารถอนุมัติ 3 โครงการ วงเงิน 6.600 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2566

ภาค	ผลการอนุมัติตามมติคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงฯ						งบพัฒนากระบวนเมือง		รวมอนุมัติทั้งสิ้น
	โครงการ	จังหวัด	เมือง	ชนบท	รวม	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	
กทม./ตะวันออก									-
กลาง/ตะวันตก									-
ตะวันออกเสียงเหนือ									-
ใต้									-
เหนือ							1	400,000	400,000
สำนักบ้านมั่นคง							2	6,200,000	6,200,000
รวม	-	-	-	-	-	-	3	6,600,000	6,600,000

2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ปี 2566


เบิกจ่ายงบประมาณได้ 5.000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.76 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 1.600 ล้านบาท ทั้งนี้ เจ็อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้

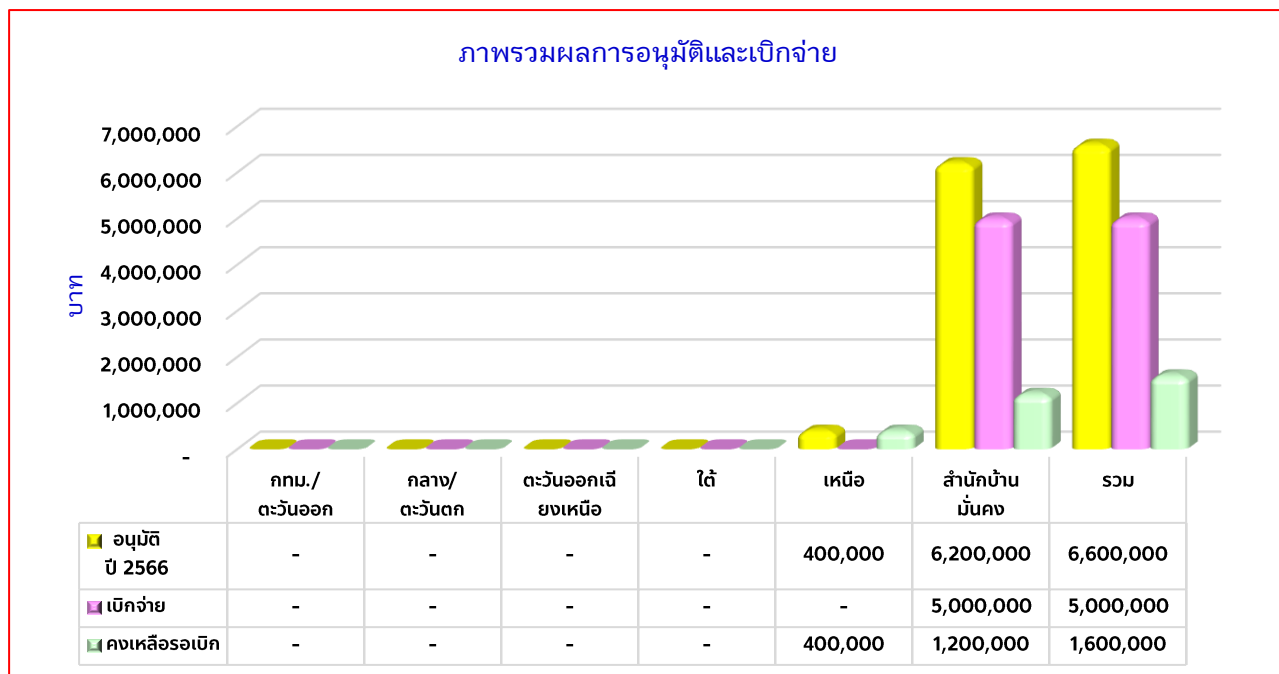

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่าย ยกมาจากปีก่อนร่วมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2566

ในปีงบประมาณ 2566 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2565 จำนวน 421.157 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2566 ทั้งสิ้น 6.600 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 427.757 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	คงเหลือยกมา+อนุมัติ ปี 2566	คืบจน	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิก	ร้อยละ เบิกจ่าย
กทม./ตะวันออก	119,177,466.00	-	-	119,177,466.00	-
กลาง/ตะวันตก	23,764,097.00	-	-	23,764,097.00	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	35,891,728.00	-	-	35,891,728.00	-
ใต้	102,105,999.00	-	-	102,105,999.00	-
เหนือ	80,087,603.00	-	-	80,087,603.00	-
สำนักบ้านมั่นคง	66,729,784.00	-	5,000,000.00	61,729,784.00	7.49
รวม	427,756,677.00	-	5,000,000.00	422,756,677.00	1.17

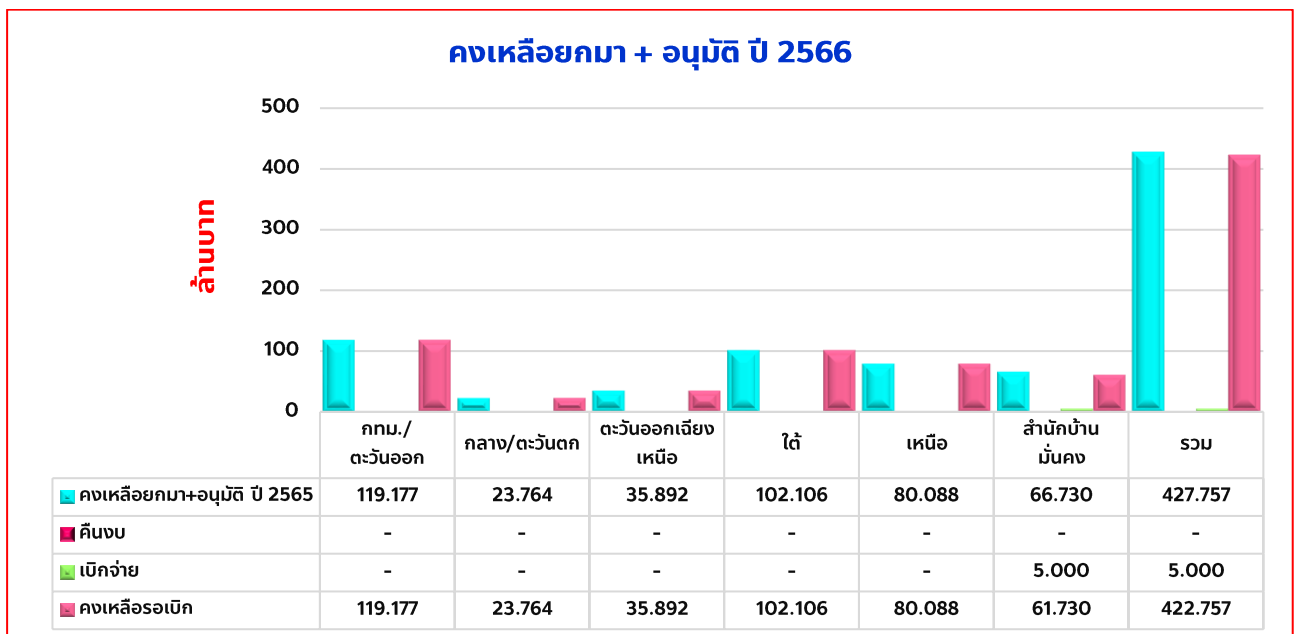

รายงานสถานะโครงการบ้านพอเพียง
ปีงบประมาณ 2566 ณ 31 ตุลาคม 2565

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 25,000 ครัวเรือน วงเงินรวม 562,500,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) หักเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 24,975,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 537,525,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2566 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานภาคอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงยังไม่สามารถอนุมัติโครงการได้ ซึ่งแต่ละภาคมีเป้าหมายการดำเนินโครงการ ดังนี้

ภาค	จ.น. จังหวัด	จ.น. กลุ่ม จว.	เป้าหมาย	งบประมาณ		รวมงบประมาณ
				งบพัฒนาที่อยู่อาศัย	งบขับเคลื่อนกลไก	
กทม./ตะวันออก	13	3	4,850	99,425,000.00	3,133,000.00	102,558,000.00
กลาง/ตะวันตก	13	3	4,850	99,425,000.00	3,133,000.00	102,558,000.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	5	4,950	101,475,000.00	3,693,000.00	105,168,000.00
ใต้	14	3	4,850	99,425,000.00	3,213,000.00	102,638,000.00
เหนือ	17	4	4,850	99,425,000.00	3,453,000.00	102,878,000.00
ประชาสังคม			500	10,250,000.00	200,000.00	10,450,000.00
สำนักบ้านมั่นคง (ส่วนกลาง)			550	11,275,000.00		11,275,000.00
รวม	77	18	25,400	520,700,000.00	16,825,000.00	537,525,000.00

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ปีงบประมาณ 2566 ณ 31 ตุลาคม 2565


โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2566 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 8,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 152,137,500 บาท หักเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 14,313,750 บาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 137,823,750 บาท เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 6,061 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 95,754,571 บาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 2,391 ครัวเรือน งบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 42,069,179 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รับเงินงบประมาณจากรัฐ

กรอบงบ	เป้าหมาย ครัวเรือน	งบรับจากรัฐ	งบดำเนินงานพัฒนา 10%	คงเหลือ งบดำเนินการ	อนุมัติสุทธิ			คงเหลืองบดำเนินการ
					คก.	ครัว เรือน	จำนวนเงิน	
ปี 2559	1,170	21,060,000.00	2,106,000.00	18,954,000.00	30	1,448	16,346,447.00	2,607,553.00
ปี 2560	1,082	19,477,500.00	1,947,750.00	17,529,750.00	37	1,043	17,513,346.00	16,404.00
ปี 2561	1,200	21,600,000.00	2,160,000.00	19,440,000.00	15	1,148	19,385,724.00	54,276.00
ปี 2562	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	16,200,000.00	39	866	15,513,806.00	686,194.00
ปี 2563	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	16,200,000.00	17	504	8,774,707.00	7,425,293.00
ปี 2564	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	16,200,000.00	47	496	8,760,209.00	7,439,791.00
ปี 2565	1,000	18,000,000.00	1,350,000.00	16,650,000.00	31	556	9,460,332.00	7,189,668.00
ปี 2566	1,000	18,000,000.00	1,350,000.00	16,650,000.00				16,650,000.00
รวม	8,462	152,137,500.00	14,313,750.00	137,823,750.00	216	6,061	95,754,571.00	42,069,179.00

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2566

กรอบงบ	คงเหลือ งบดำเนินการ	อนุมัติสุทธิ			เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย
		คก.	ครัว เรือน	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย	
ปี 2559	18,954,000.00	30	1,448	16,346,447.00	16,346,447.00	-	100.00
ปี 2560	17,529,750.00	37	1,043	17,513,346.00	17,513,346.00	-	100.00
ปี 2561	19,440,000.00	15	1,148	19,385,724.00	19,043,724.00	342,000.00	98.24
ปี 2562	16,200,000.00	39	866	15,513,806.00	15,153,806.00	360,000.00	97.68
ปี 2563	16,200,000.00	17	504	8,774,707.00	8,774,707.00	-	100.00
ปี 2564	16,200,000.00	47	496	8,760,209.00	8,400,209.00	360,000.00	95.89
ปี 2565	16,650,000.00	31	556	9,460,332.00	9,406,332.00	54,000.00	99.43
ปี 2566	16,650,000.00			-	-	-	-
รวม	137,823,750.00	216	6,061	95,754,571.00	94,638,571.00	1,116,000.00	98.83

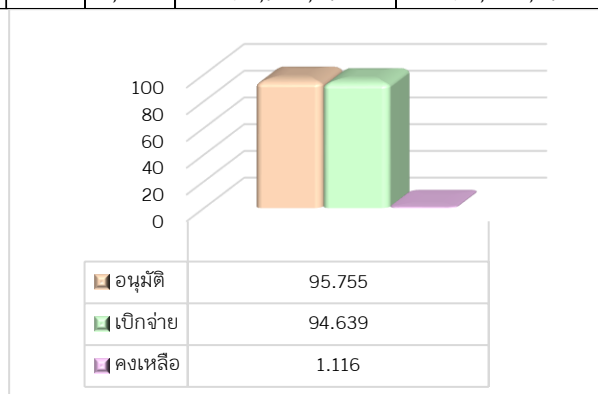

รายงานสถานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท
ปีงบประมาณ 2566 ณ 31 ตุลาคม 2565

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 500 ตำบล/เมือง วงเงินรวม 32,655,600 บาท (สามสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) หักเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 2,449,200 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 30,206,400 บาท (สามสิบล้านสองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2566 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานภาคอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงยังไม่สามารถอนุมัติโครงการได้ ซึ่งแต่ละภาคมีเป้าหมายการดำเนินโครงการ ดังนี้

ภาค	จ.จังหวัด	จ.กลุ่ม จว.	จำนวนตำบล/เมือง	งบประมาณ		รวมงบประมาณ
				ตำบล/เมือง	ระดับภาค	
กทม./ตะวันออก	13	3	100			30,206,400.00
กลาง/ตะวันตก	13	3	100			
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	5	100			
ใต้	14	3	100			
เหนือ	17	4	100			
รวม	77	18	500	-	-	30,206,400.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
