

สถานะการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร (สิ้นเดือนเมษายน 2567)

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 66



คลองลาดพร้าว

44 โครงการ

3,781 ครัวเรือน

อนุมัติ 608.35 ลบ.

เบิกจ่าย 584.25 ลบ.

คงเหลือ 24.10 ลบ.

ผลการดำเนินงาน ณ เม.ย.67

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	ครัวเรือน	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	1,422,646
2	-	144,000	-
3	-	-	-
4	-	-	-
รวม	0	144,000	1,422,646


ผลการดำเนินงานสะสม

คลองลาดพร้าว 44 โครงการ **3,781** ครัวเรือน

- อนุมัติ 608.49 ลบ.

- เบิกจ่าย 585.67 ลบ.

- คงเหลือ 22.82 ลบ.

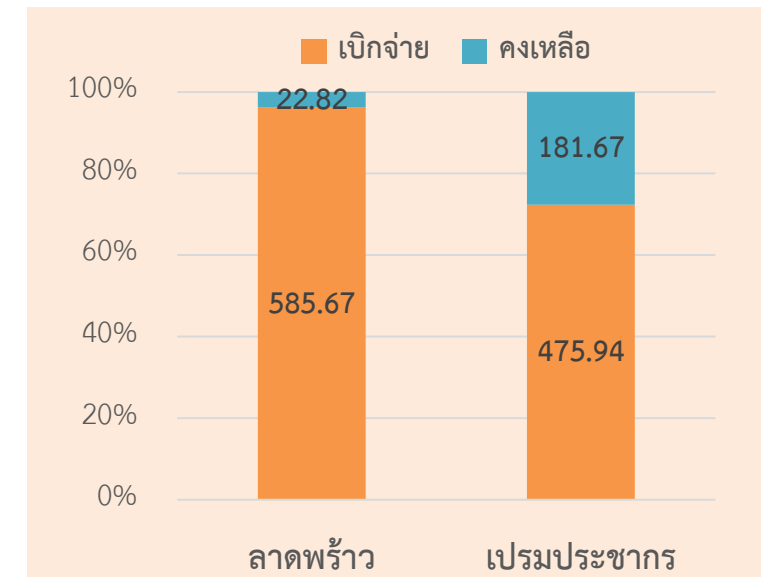

คลองเปรมประชากร

33 โครงการ

4,068 ครัวเรือน

อนุมัติ 653.02 ลบ.

เบิกจ่าย 448.07 ลบ.

คงเหลือ 204.95 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	ครัวเรือน	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	6,478,865
2	17	4,596,500	21,391,550
3	-	-	-
4	-	-	-
รวม	17	4,596,500	27,870,415

คลองเปรมประชากร 33 โครงการ **4,085** ครัวเรือน

- อนุมัติ 657.61 ลบ.

- เบิกจ่าย 475.94 ลบ.

- คงเหลือ 181.67 ลบ.

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ภาพแสดงที่ตั้ง 9 คลอง ตามแผนของ กทม. ความยาวประมาณ 128.37 กิโลเมตร 13,060 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 74,115 คน

คลองลาดพร้าวและบางซื่อ

7 พื้นที่ 50 ชุมชน 7,069 คร้วเรือน

เริ่มดำเนินการปี 2559

คลองเปรมประชากร

คลองเปรมประชากร

4 พื้นที่ 38 ชุมชน 6,386 คร้วเรือน

เริ่มดำเนินการปี 2562



- จตุจักร : 5 ชุมชน 621 คร้วเรือน
 - ดอนเมือง : 14 ชุมชน 2,542 คร้วเรือน
 - หลักสี่ : 13 ชุมชน 2,248 คร้วเรือน
 - ต.หลักหก จ.ปทุมธานี : 6 หมู่ 929 คร้วเรือน
- ** ยังรับรองสิทธิ์ไม่ครบทุกชุมชน **

อนุมัติงบประมาณ

3,781 คร้วเรือน 42 ชุมชน
จำนวน 608.49 ล้านบาท
เบิกจ่าย 585.67 ล้านบาท (96%)
คงเหลือ 22.82 ล้านบาท



อนุมัติงบประมาณ

4,085 คร้วเรือน 33 ชุมชน
จำนวน 657.61 ล้านบาท
เบิกจ่าย 475.94 ล้านบาท (72%)
คงเหลือ 181.67 ล้านบาท



ความคืบหน้าการดำเนินงาน (30 เมษายน 2567)

ดำเนินการได้ 35 ชุมชน **3,646 คร้วเรือน** (51.58%)

ลาดพร้าว 50 ชุมชน 7,069 คร้วเรือน

เปรมประชากร 38 ชุมชน 6,386 คร้วเรือน

ดำเนินการได้ 20 ชุมชน **1,768 คร้วเรือน** (27.69%)

3,413 คร้วเรือน (48.28%) ก่อสร้างแล้วเสร็จ **1,257 คร้วเรือน (19.68%)**

43 คร้วเรือน (0.61%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง **352 คร้วเรือน (5.51%)**


190 คร้วเรือน (2.69%) พื้นที่พร้อมก่อสร้าง **159 คร้วเรือน (2.49%)**

สถิติผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567 สิ้นเดือน กันยายน 2566 ถึงปัจจุบัน


คลองลาดพร้าว ดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม 93 คร้วเรือน

คลองเปรมประชากร ดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม 265 คร้วเรือน


ผลการดำเนินงาน (คร้วเรือน)	พ.ศ. 2566				พ.ศ.2567			
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
ก่อสร้างแล้วเสร็จ	3,331	3,339	3,339	3,342	3,368	3,374	3,413	3,413
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	67	60	60	57	46	78	43	43
พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	155	154	154	154	154	194	190	190
รวม	3,553	3,553	3,553	3,553	3,568	3,646	3,646	3,646
คิดเป็นร้อยละ	50.26	50.26	50.26	50.26	50.47	51.58	51.58	51.58
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า	-	-	-	-	15	78	-	-



ผลการดำเนินงาน (คร้วเรือน)	พ.ศ. 2566				พ.ศ.2567			
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
ก่อสร้างแล้วเสร็จ	1,034	1,057	1,097	1,117	1,197	1,214	1,257	1,257
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	368	349	410	411	336	393	352	352
พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	101	274	173	171	166	155	159	159
รวม	1,503	1,680	1,680	1,699	1,699	1,762	1,768	1,768
คิดเป็นร้อยละ	23.54	26.31	26.31	26.61	26.61	27.59	27.69	27.69
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า	-	177	-	19	-	63	6	-



แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2567
(ตุลาคม 2566 ถึงปัจจุบัน)

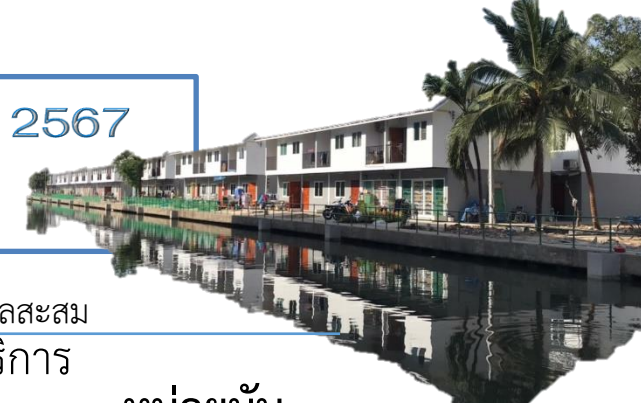

ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	ผลสะสม จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		ลาดพร้าว	เปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	-	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	1	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	0.14	4.60	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	1.42	27.87	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	-	231	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	82	223	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน

