

**รายงานสถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เดือนตุลาคม 2565 ถึง สิงหาคม 2566**

① งบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2566 มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขต (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 7,271 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 273,252,318 บาท ซึ่งการดำเนินงานในปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณระหว่างปี จำนวน 126 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 17,172,664 บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน 366 ครั้วเรือน 54,805,950 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 37,868,908 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28,445,625 บาท ส่งผลให้ ณ 31 กรกฎาคม 2566 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 245,042,315 บาท รายละเอียดภาพรวมโครงการและสถานะโครงการ ดังนี้

ตารางภาพรวมการอนุมัติ-เบิกจ่าย

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 65		ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณ	คืนงบประมาณ	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1. คลองลาดพร้าว	39,706,858.00	3,300	31	363	2,968	1,422,646.00	54,364,950.00	37,427,908.00	-	-	24,192,462.00
เขตสายไหม	-	905			905						-
เขตดอนเมือง	-	-			-						-
เขตหลักสี่	-	533			533						-
เขตบางเขน	5,082,417.00	469		63	406		9,683,800.00	5,126,800.00			525,417.00
เขตจตุจักร	18,190,264.00	736	31		767	1,422,646.00					19,612,910.00
เขตห้วยขวาง/	16,434,177.00	657		300	357		44,681,150.00	32,301,108.00			4,054,135.00
2. คลองเปรมประชากร	233,545,460.00	3,971	95	3	4,063	15,750,018.00	441,000.00	441,000.00	28,445,625.00		220,849,853.00
เขตดอนเมือง	103,779,720.00	1,311	55	-	1,366	8,222,500.00	-	-			112,002,220.00
เขตหลักสี่	94,559,655.00	1,246	37	-	1,283	5,696,996.00	-	-	26,484,375.00		73,772,276.00
เขตจตุจักร	4,738,750.00	610	3	3	610	479,394.00	441,000.00	441,000.00	3,750.00		5,214,394.00
จังหวัดปทุมธานี	30,467,335.00	804		-	804	1,351,128.00	-	-	1,957,500.00		29,860,963.00
รวม	273,252,318.00	7,271	126	366	7,031	17,172,664.00	54,805,950.00	37,868,908.00	28,445,625.00	12.07	245,042,315.00

1. สถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560-2561

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2565 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 3,300 ครั้วเรือน 39,706,858 บาท

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 การดำเนินงานชุมชนริมคลองลาดพร้าวในปี 2566 มีการคืนโครงการ/ยกเลิกครั้วเรือน 366 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 54,805,950 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวนเงิน 37,868,908 บาท โดยมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 31 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 1,422,646 บาท รวม 2,968 ครั้วเรือน จำนวนเงินรวม 24,192,462 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน บาท ดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 65		คลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณ คงเหลือ	ครุว์เรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบ ระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินสด	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตสายไหม	-	905			905				-	-	-
เขตดอนเมือง	-	-			-				-	-	-
เขตหลักสี่	-	533			533				-	-	-
เขตบางเขน	5,082,417	469		63	406		9,683,800	5,126,800	-	-	525,417
เขตจตุจักร	18,190,264	736	31		767	1,422,646			-	-	19,612,910
เขตห้วยขวาง/วังทองหลาง	16,434,177	657		300	357		44,681,150	32,301,108	-	-	4,054,135
รวม	39,706,858	3,300	31	363	2,968	1,422,646	54,364,950	37,427,908	-	-	24,192,462

โครงการคลองลาดพร้าวที่ดำเนินการปี 2566 โดยมีโครงการ/ชุมชน/งบประมาณคงเหลือ

- จำนวน 10 โครงการ 10 องค์กร 630 ครุว์เรือน คงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวนเงิน 24,192,462 บาท

2. สถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณปี 2561-2566

2.1 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 ใช้งบประมาณปี 2561 ในการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 927 ครุว์เรือน 4,735,000 บาท

ณวันที่ 31 สิงหาคม 2566 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2566 มีการคืนโครงการ/ยกเลิก ครุว์เรือน 3 ครุว์เรือน จำนวนเงิน 441,000 บาท ได้รับโอนเงินสดจากชุมชน จำนวนเงิน 441,000 บาท โดยมีการ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 3 ครุว์เรือน จำนวนเงิน 479,394 บาท รวม 927 ครุว์เรือน จำนวนเงินรวม 5,214,394 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ... บาท ดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 65		งบประมาณปี 2561-2562 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณ คงเหลือ	ครุว์เรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบ ระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินสด	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
จังหวัดปทุมธานี	4,735,000	344	-	-	344	-	-	-	-	-	4,735,000
เขตจตุจักร	-	583	3	3	583	479,394	441,000	441,000	-	-	479,394
รวม	4,735,000	927	3	3	927	479,394	441,000	441,000	-	-	5,214,394

โครงการคลองเปรมประชากรใช้งบประมาณปี 2561-2562 โดยมีโครงการ/ชุมชน/งบประมาณ คงเหลือ จำนวน 2 โครงการ 2 องค์กร 100 ครุว์เรือน คงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวนเงิน 5,214,394 บาท

2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563-2565 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 3,044 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 228,810,460 บาท

ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 การดำเนินงานในปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 92 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 13,919,496 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน 28,445,625 บาท คงเหลือรอเบิกจ่ายทั้งหมด จำนวน 214,284,331 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.65		งบประมาณปี 2563 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตดอนเมือง	103,779,720	1,311	55	-	1,366	8,222,500	-	-	-	-	112,002,220
เขตหลักสี่	94,559,655	1,246	37	-	1,283	5,696,996	-	-	26,484,375	-	73,772,276
เขตจตุจักร	3,750	27	-	-	27	-	-	-	3,750	-	-
จังหวัดปทุมธานี	30,467,335	460	-	-	460	-	-	-	1,957,500	-	28,509,835
รวม	228,810,460	3,044	92	-	3,136	13,919,496	-	-	28,445,625	11.72	214,284,331

โครงการคลองเปรมประชากรใช้งบประมาณปี 2563 โดยมีโครงการ/ชุมชน/งบประมาณคงเหลือจำนวน 20 โครงการ 20 องค์กร 2,999 ครั้วเรือน มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวนเงิน 214,284,331 บาท

2.3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2566 โดยใช้งบประมาณปี 2564 ในการอนุมัติโครงการและงบประมาณ มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน...1,351,128...บาท ดำเนินการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน......ครั้วเรือน จำนวนเงิน...-...บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน ...-...บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน...-...บาท ส่งผลให้ ณ 31 กรกฎาคม 2566 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 1,351,128 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.65		งบประมาณปี 2564 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
จังหวัดปทุมธานี	-	-	-	-	-	1,351,128	-	-	-	-	1,351,128.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,351,128.00


โครงการคลองเปรมประชากรใช้งบประมาณปี 2564 โดยมีโครงการ/ชุมชน/งบประมาณคงเหลือจำนวน 1 โครงการ 1 องค์กร - ครั้วเรือน มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวนเงิน 1,351,128 บาท

② ผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

1. **คลองลาดพร้าว** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ดำเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ 7 เขต คือ พื้นที่ 1 เขตสายไหม 1,454 ครัวเรือน พื้นที่ 2 เขตหลักสี่และดอนเมือง 1,356 ครัวเรือน พื้นที่ 3 เขตบางเขน 1,469 ครัวเรือน พื้นที่ 4 เขตจตุจักร 1,283 ครัวเรือน และพื้นที่ 5 เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 1,507 ครัวเรือน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 35 ชุมชน 3,553 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.26 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น


- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,274 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 124 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 155 ครัวเรือน

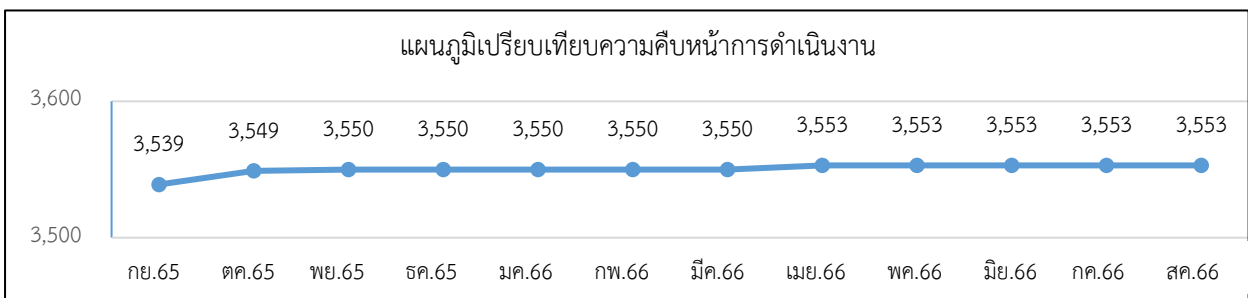

2. **คลองเปรมประชากร** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) เมื่อมิถุนายน 2561 คือ มีผู้รुक้ำลำน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 15 ชุมชน 1,489 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.32 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 995 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 295 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 199 ครัวเรือน

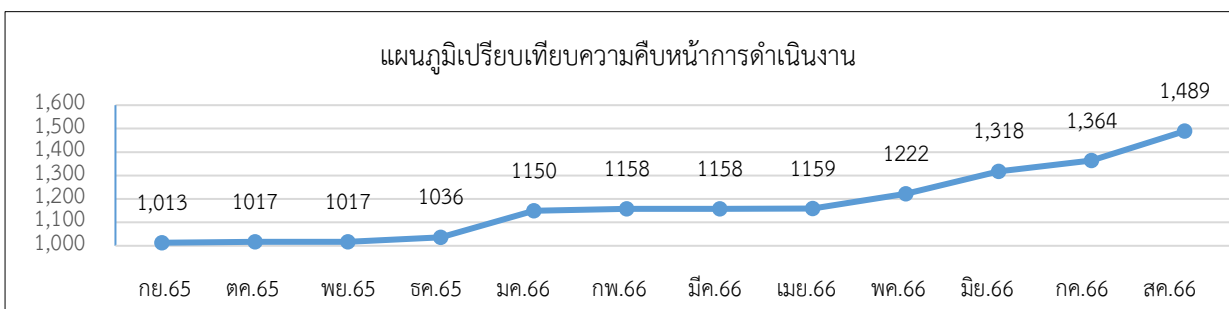


การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

**คลองลาดพร้าว
และคลองบางซื่อ**
7,069 ครัวเรือน
50 ชุมชน 7 พื้นที่

- สายไหม : 10 ชุมชน 1,454 ครัวเรือน
- คอนเมือง : 1 ชุมชน 370 ครัวเรือน
- หลักสี่ : 5 ชุมชน 987 ครัวเรือน
- บางเขน : 8 ชุมชน 1,469 ครัวเรือน
- จตุจักร : 11 ชุมชน 1,283 ครัวเรือน
- ห้วยขวาง : 14 ชุมชน 1,453 ครัวเรือน
- วังทองหลาง : 1 ชุมชน 53 ครัวเรือน

คลองเปรมประชากร
6,386 ครัวเรือน
38 ชุมชน 4 พื้นที่

- จตุจักร : 5 ชุมชน 621 ครัวเรือน
 - หลักสี่ : 13 ชุมชน 2,248 ครัวเรือน
 - คอนเมือง : 14 ชุมชน 2,542 ครัวเรือน
 - ค.หลักหก จ.ปทุมธานี : 6 หมู่ 929 ครัวเรือน
- ** ยังรับรองสิทธิไม่ครบทุกชุมชน **

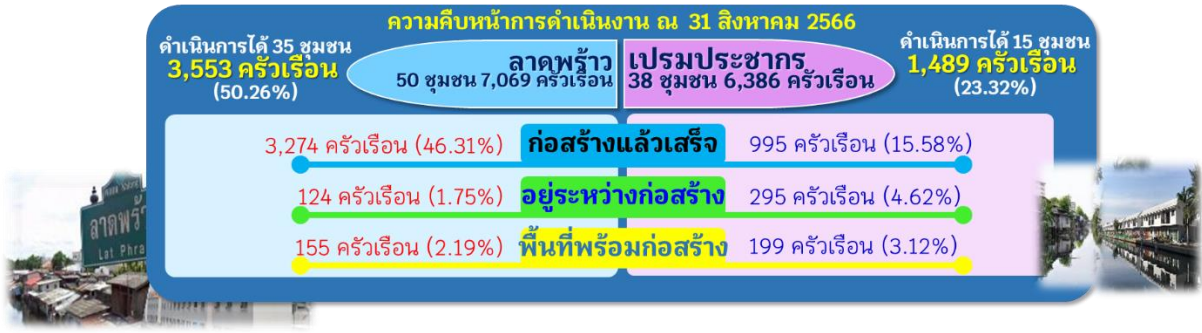

③ สรุปปัญหา/ข้อติดขัดการดำเนินงานโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>1. ผู้ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ</p> <p>ไม่รู้รื้อย้ายบ้านเดิม มีกลุ่มแกนนำต่อต้านโครงการให้ข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริง เช่น ที่ดินริมคลองไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ และสามารถออกโฉนดได้ การรื้อย้ายบ้านเดิมจะต้องได้รับความชัดเจนจากภาครัฐ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความลังเลไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการ ซึ่งในบางชุมชนมีการรวมตัวปิดล้อมพื้นที่งานก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถชี้แจงสร้างความเข้าใจและก่อสร้างตามแผนงานได้</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธนารักษ์ชี้แจงเรื่องขอบเขตที่ดินราชพัสดุ กรมที่ดินชี้แจงยืนยันเรื่องการไม่สามารถออกโฉนดพื้นที่ริมคลอง โดยทุกหน่วยงานให้ข้อมูลกับประชาชนตรงกัน เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และพิจารณาการใช้กฎหมายเพิ่มเติม</p>
<p>2. ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนงานของชุมชน</p> <p>การดำเนินการของหน่วยงานร่วมบูรณาการล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดร่วมกัน อาทิ การอนุญาตให้เช่าที่ดินและก่อสร้างบ้านของกรมธนารักษ์ การลงพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ และการอนุญาตก่อสร้างเชื่อมโดยกรมชลประทาน ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงานและกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบเวลา ซึ่งจะทำให้การรื้อย้ายบ้านของประชาชนและการก่อสร้างเชื่อมดำเนินการไปได้ตามแผนงาน</p>
<p>3. บางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดดำเนินการ ไม่ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงการ เนื่องจากขาดความมั่นใจในแผนการก่อสร้างเชื่อมของสำนักการระบายน้ำ กทม.</p>	<p>สำนักการระบายน้ำ กทม. ดำเนินการก่อสร้างเชื่อมและชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p>
