

รายงานสถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2567

① งบสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2566 มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขต (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีภาพรวมงบประมาณดำเนินการ 7,036 ครัวเรือน คงเหลืองบประมาณใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงิน 748,905,351.54 บาท รายละเอียดภาพรวมโครงการ ดังนี้

ตารางภาพรวมการอนุมัติ-เบิกจ่าย ณ 30 กย.2566

โครงการ	งบที่ได้รับจัดสรร (1)	อนุมัติงบประมาณสะสม		รับคืนเงินจากชุมชน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณ		เงินคงเหลือ		รวมคงเหลือ ยกไปปีงบประมาณ 2567
		จำนวนเงิน (2)	ครัวเรือน		การบริหารจัดการ(4)	เงินอุดหนุน(5)	รอเบิกจ่าย(2)+(3)-(5)	รอจัดสรร(1)-(2)-(4)	
1. งบสนับสนุนปี 2560	751,360,000.00	404,129,523.00	2,968	89,892,728.00	47,406,400.00	469,829,089.00	24,193,162.00	299,824,077.00	324,017,239.00
2. งบสนับสนุนปี 2561	199,680,000.00	177,543,669.00	927	863,800.00	21,529,434.46	173,193,075.00	5,214,394.00	606,896.54	5,821,290.54
3. งบสนับสนุนปี 2563	548,240,000.00	506,347,131.00	3,115	72,000.00	34,703,592.00	306,683,102.00	199,736,029.00	7,189,277.00	206,925,306.00
4. งบสนับสนุนปี 2564	175,120,000.00	1,351,128.00	26	-	11,085,096.00	1,351,128.00	-	162,683,776.00	162,683,776.00
5. งบสนับสนุนปี 2565	35,200,000.00	-	-	-	2,228,160.00	-	-	32,971,840.00	32,971,840.00
6. งบสนับสนุนปี 2566	17,600,000.00	-	-	-	1,114,100.00	-	-	16,485,900.00	16,485,900.00
รวม	1,727,200,000.00	1,089,371,451.00	7,036	90,828,528.00	118,066,782.46	951,056,394.00	229,143,585.00	519,761,766.54	748,905,351.54

② รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เดือนตุลาคม 2566 (ไตรมาส 1)

งบดำเนินโครงการใช้งบประมาณคงเหลือมาดำเนินการต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2567 เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 จำนวน 100 ครัวเรือน จำนวนเงิน 17,600,000 บาท โดยได้รับอนุมัติงบจัดสรรให้กับชุมชนระยะแรก จำนวน 70 ครัวเรือน จำนวนเงิน 12,320,000 บาท หักเป็นงบสำหรับใช้ดำเนินงาน 779,856 บาท คงเหลือใช้สนับสนุน จำนวน 11,540,144 บาท ณ เดือนตุลาคม 2566 มีสถานะการดำเนินโครงการ ดังนี้

ตารางสรุป ณ 31 ตค.2566

โครงการ	ณ 30 ก.ย. 2566					ดำเนินการปีงบประมาณ 2567 (ตค.-กย.67)							คงเหลือรอเบิก	คงเหลืองบจัดสรร	
	งบที่ได้รับจัดสรร		คงเหลืองบจัดสรร	คงเหลือดำเนินการในปี 67		คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.สืบยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบประมาณ	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย			ร้อยละ
	งบประมาณ	ครัวเรือน	งบประมาณ	งบประมาณ	ครัวเรือน										
1. คลองลาดพร้าว	751,360,000	4,696	299,824,077	24,193,162.00	2,968	-	-	2,968	-	-	-	1,422,646.00	5.88	22,770,516.00	299,824,077.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ค86568	338,112,000	-	144,340,239.00	19,229,897.00	-	-	-	-	-	-	-	958,049.00	-	18,271,848.00	144,340,239.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ค86668	365,841,600	-	155,483,838.00	4,963,265.00	-	-	-	-	-	-	-	464,597.00	-	4,498,668.00	155,483,838.00
- งบดำเนินงาน	47,406,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. คลองเปรมประชากร	993,540,000	5,437	236,423,589.54	204,950,423.00	4,068	-	-	4,068	-	-	-	654,990.00	-	204,295,433.00	236,423,589.54
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2561-62	199,680,000	927	606,896.54	5,214,394.00	927	-	-	927	-	-	-	479,394.00	9.19	4,735,000.00	606,896.54
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2563	548,240,000	3115	7,189,277.00	199,736,029.00	3,115	-	-	3,115	-	-	-	175,596.00	0.09	199,560,433.00	7,189,277.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2564	175,120,000	995	162,683,776.00	-	26	-	-	26	-	-	-	-	-	-	162,683,776.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2565	35,300,000	200	32,971,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,971,840.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2566	17,600,000	100	16,485,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,485,900.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2567	17,600,000	100	16,485,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,485,900.00
รวม	1,744,900,000	10,133	536,247,666.54	229,143,585.00	7,036	-	-	7,036	-	-	-	2,077,636.00	-	227,065,949.00	536,247,666.54

รายละเอียดตามข้อ 1-2

1. สถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560-2567

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2566 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 2,968 ครัวเรือน 24,193,162 บาท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 การดำเนินงานชุมชนริมคลองลาดพร้าวในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงิน 1,422,646 บาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ 9 องค์กร 599 ครัวเรือน งบคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 22,770,516 บาท

2. สถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณปี 2561-2567

2.1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2561-2562 มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 927 ครัวเรือน 5,214,394 บาท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 479,394 บาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ องค์กร 97 ครัวเรือน งบคงเหลือจำนวน 4,735,000 บาท

2.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2563 มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 3,115 ครัวเรือน จำนวนเงิน 199,736,029 บาท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 175,596 บาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 19 โครงการ 19 องค์กร 3,014 ครัวเรือน จำนวน 199,560,433 บาท

2.3 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2564 มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงิน 1,351,128 บาท โดยมีงบประมาณดำเนินการสำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 162,683,776 บาท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ยังไม่มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

2.4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2565-2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ยังไม่มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

③ สถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

1. คลองลาดพร้าว กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ดำเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ 7 เขต คือ พื้นที่ 1 เขตสายไหม 1,454 ครัวเรือน พื้นที่ 2 เขตหลักสี่และดอนเมือง 1,356 ครัวเรือน พื้นที่ 3 เขตบางเขน 1,469 ครัวเรือน พื้นที่ 4 เขตจตุจักร 1,283 ครัวเรือน และพื้นที่ 5 เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 1,507 ครัวเรือน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 35 ชุมชน 3,553 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.26 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น


- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,339 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 60 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 154 ครัวเรือน

2. คลองเปรมประชากร กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) เมื่อมิถุนายน 2561 คือ มีผู้รื้อกล้าลำน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 20 ชุมชน 1,680 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.31 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,057 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 349 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 274 ครัวเรือน

ตารางแสดงความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2567 (สิ้นเดือนกันยายน 2566 ถึงปัจจุบัน)
(สามารถดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม 177 ครัวเรือน)

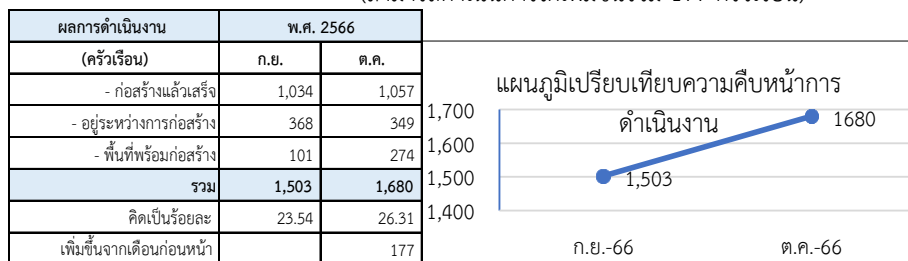

④ สรุปปัญหา/ข้อติดขัดการดำเนินงานโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ผู้ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ
ไม่รื้อย้ายบ้านเดิม มีกลุ่มแกนนำต่อต้านโครงการให้ข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริง เช่น ที่ดินริมคลองไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ และสามารถออกโฉนดได้ การรื้อย้ายบ้านเดิมจะต้องได้รับความชัดเจนจากภาครัฐ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความลังเลไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการ ซึ่งในบางชุมชนมีการรวมตัวปิดล้อมพื้นที่งานก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถชี้แจงสร้างความเข้าใจและก่อสร้างตามแผนงานได้
2. ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนงานของชุมชน
การดำเนินการของหน่วยงานร่วมบูรณาการล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดร่วมกัน อาทิ การอนุญาตให้เข้าที่ดินและก่อสร้างบ้านของกรมธนารักษ์ การลงพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ และการอนุญาตก่อสร้างเชื่อมโดยกรมชลประทาน ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน
3. บางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดดำเนินการ ไม่ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงการ เนื่องจากขาดความมั่นใจในแผนการก่อสร้างเชื่อมของสำนักการระบายน้ำ กทม.

แนวทางการแก้ไข

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธนารักษ์ชี้แจงเรื่องขอบเขตที่ดินราชพัสดุ กรมที่ดินชี้แจงยืนยันเรื่องการไม่สามารถออกโฉนดพื้นที่ริมคลอง โดยทุกหน่วยงานให้ข้อมูลกับประชาชนตรงกัน เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และพิจารณาการใช้กฎหมายเพิ่มเติม
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงานและกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบเวลา ซึ่งจะทำให้การรื้อย้ายบ้านของประชาชนและการก่อสร้างเชื่อมดำเนินการไปได้ตามแผนงาน
3. สำนักการระบายน้ำ กทม. ดำเนินการก่อสร้างเชื่อมและชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
