

**รายงานสถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2567**  
**เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567**

**① งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง**

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2567 มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขต (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มีภาพรวมงบประมาณดำเนินการ 7,125 ครัวเรือน คงเหลืองบประมาณรอดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงิน 732,888,890.54 บาท รายละเอียดภาพรวมโครงการ ดังนี้

ตารางภาพรวมการอนุมัติ-เบิกจ่ายสะสม ณ 31 พค.2567

โครงการ	งบที่ได้รับจัดสรร (1)	อนุมัติงบประมาณสะสม		รับคืนเงินจากชุมชน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณ		เงินคงเหลือ		รวมคงเหลือ ณ 31 พค.2567
		จำนวนเงิน (2)	ครัวเรือน		คำบริหารจัดการ(4)	เงินอุดหนุน(5)	รอเบิกจ่าย(2)-(3)-(5)	รอจัดสรร(1)-(2)-(4)	
1.งบสนับสนุนปี 2560	751,360,000.00	407,251,523.00	2,987	89,892,728.00	47,406,400.00	471,251,735.00	25,892,516.00	296,702,077.00	322,594,593.00
2.งบสนับสนุนปี 2561	199,680,000.00	178,087,669.00	927	863,800.00	-	195,201,903.46	5,279,000.00	62,896.54	5,341,896.54
3.งบสนับสนุนปี 2563	548,240,000.00	511,259,381.00	3,115	2,133,500.00	34,703,592.00	334,270,998.00	177,060,383.00	4,210,277.00	181,270,660.00
4.งบสนับสนุนปี 2564	175,120,000.00	11,816,128.00	96	-	11,085,096.00	1,351,128.00	10,465,000.00	152,218,776.00	162,683,776.00
5.งบสนับสนุนปี 2565	35,200,000.00	-	-	-	2,228,160.00	-	-	32,971,840.00	32,971,840.00
6.งบสนับสนุนปี 2566	17,600,000.00	-	-	-	1,114,100.00	-	-	16,485,900.00	16,485,900.00
7.งบสนับสนุนปี 2567	12,320,000.00	-	-	-	779,856.00	-	-	11,540,144.00	11,540,144.00
<b>รวม</b>	<b>1,739,520,000.00</b>	<b>1,108,414,701.00</b>	<b>7,125</b>	<b>92,890,028.00</b>	<b>97,317,204.00</b>	<b>1,002,075,764.46</b>	<b>218,696,899.00</b>	<b>514,191,910.54</b>	<b>732,888,809.54</b>

**② รายงานสถานะการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม-พฤษภาคม 2567 (ไตรมาส 3)**

งบดำเนินโครงการใช้งบประมาณคงเหลือมาดำเนินการต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2567 เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 ได้รับอนุมัติงบประมาณจัดสรรให้กับชุมชน จำนวน 70 ครัวเรือน จำนวนเงิน 12,320,000 บาท หักเป็นงบสำหรับใช้ดำเนินงาน 779,856 บาท คงเหลือใช้สนับสนุน จำนวน 11,540,144 บาท ณ เดือนพฤษภาคม 2567 มีสถานะการดำเนินโครงการ ดังนี้

ตารางสรุปสถานะ ตค.66 - 31 พค.67

โครงการ	ณ 30 ก.ย. 2566					ดำเนินการปีงบประมาณ 2567 (ตค.-กย.67)							คงเหลือ รอเบิก	คงเหลือ งบจัดสรร			
	งบที่ได้รับจัดสรร		คงเหลืองบจัดสรร งบประมาณ	คงเหลือดำเนินการในปี 67		คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติ งบระหว่างปี	คืนงบ ประมาณ	รับโอน เงินคืน	เบิกจ่าย			ร้อยละ		
	งบประมาณ	ครัวเรือน		งบประมาณ	ครัวเรือน												
<b>1.คลองลาดพร้าว</b>	<b>751,360,000</b>	<b>4,696</b>	<b>299,824,077</b>	<b>24,193,162.00</b>	<b>2,968</b>												
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ค86568	338,112,000	-	144,340,239.00	19,229,897.00	-	-	-	1,368,000.00	-	-	958,049.00			19,639,848.00		142,972,239.00	
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ค86668	365,841,600	-	155,483,838.00	4,963,265.00	-	-	-	1,754,000.00	-	-	464,597.00			6,252,668.00		153,729,838.00	
<b>2.คลองเปรมประชากร</b>	<b>988,260,000</b>	<b>5,407</b>	<b>231,477,833.54</b>	<b>204,950,423.00</b>	<b>4,068</b>												
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2561-62	199,680,000	927	606,896.54	5,214,394.00	927	-	-	927	544,000.00	-	479,394.00	9.19		5,279,000.00		62,896.54	
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2563	548,240,000	3,115	7,189,277.00	199,736,029.00	3,115	-	-	3,115	4,912,250.00	200,250.00	27,587,896.00	13.81		177,060,383.00		4,210,277.00	
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2564	175,120,000	995	162,683,776.00	-	26	70	-	96	10,465,000.00	-	-	-		10,465,000.00		152,218,776.00	
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2565	35,300,000	200	32,971,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		32,971,840.00	
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2566	17,600,000	100	16,485,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		16,485,900.00	
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2567	12,320,000	70	11,540,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		11,540,144.00	
<b>รวม</b>	<b>1,739,620,000</b>	<b>10,103</b>	<b>531,301,910.54</b>	<b>229,143,585.00</b>	<b>7,036</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>7,125</b>	<b>19,043,250.00</b>	<b>200,250.00</b>	<b>1,933,250.00</b>			<b>218,696,899.00</b>		<b>514,191,910.54</b>	

รายละเอียดตามข้อ 1-2

## 1. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560-2567

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2566 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 2,968 ล้านบาท 24,193,162 บาท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองลาดพร้าวในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวนเงิน 1,422,646 บาท และได้รับอนุมัติงบสนับสนุน 19 ล้านบาท จำนวนเงิน 3,122,000 บาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ 561 ล้านบาท จำนวนเงิน 25,892,516 บาท

## 2. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณปี 2561-2567

2.1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2561-2562 มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 927 ล้านบาท 5,214,394 บาท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2567 มีการเบิกงบคงเหลือรอเบิกจ่าย 479,394 บาท และได้รับอนุมัติงบสนับสนุนชุมชนสะสม 544,000 บาท จึงมีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ 5,279,000 บาท

2.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2563 มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 3,115 ล้านบาท จำนวนเงิน 199,736,029 บาท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบคงเหลือรอเบิกจ่าย 27,587,896 บาท และได้รับอนุมัติงบสนับสนุนชุมชนสะสม 4,912,250 บาท จึงมีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ 177,060,383 บาท

2.3 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2564 มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบส.จำนวนเงิน 1,351,128 บาท โดยมีงบประมาณดำเนินการสำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 162,683,776 บาท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มีการอนุมัติงบสนับสนุนชุมชนสะสม จำนวน 2 องค์กร 70 ล้านบาท จำนวนเงิน 10,465,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2565-2567 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

## ③ สถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

1. **คลองลาดพร้าว** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ดำเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ 7 เขต คือ พื้นที่ 1 เขตสายไหม 1,454 ครัวเรือน พื้นที่ 2 เขตหลักสี่และดอนเมือง 1,356 ครัวเรือน พื้นที่ 3 เขตบางเขน 1,469 ครัวเรือน พื้นที่ 4 เขตจตุจักร 1,283 ครัวเรือน และพื้นที่ 5 เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 1,507 ครัวเรือน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 35 ชุมชน 3,646 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.58 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,413 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 43 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 190 ครัวเรือน

ความคืบหน้างานก่อสร้าง	ชุมชน	ครัวเรือน	สร้างเสร็จ	กำลังสร้าง	พร้อมสร้าง
สายไหม	10	1,454	1,199	-	-
ดอนเมือง/หลักสี่	6	1,357	778	12	41
บางเขน	8	1,469	664	-	41
จตุจักร	11	1,283	398	31	104
ห้วยขวาง/วังทองหลาง	15	1,506	374	-	4
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>7,069</b>	<b>3,413</b>	<b>43</b>	<b>190</b>

**2. คลองเปรมประชากร** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) เมื่อมิถุนายน 2561 คือ มีผู้รูกล้าลำน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน


ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 20 ชุมชน 1,770 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.72 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,267 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 352 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 151 ครัวเรือน

**ตารางแสดงความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2567 (สิ้นเดือนกันยายน 2566 ถึงปัจจุบัน)**

(คลองเปรมประชากรสามารถดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม 267 ครัวเรือน)

ผลการดำเนินงาน (ครัวเรือน)	พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2567				
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ	1,034	1,057	1,097	1,117	1,197	1,214	1,257	1,257	1,267
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	368	349	410	411	336	393	352	352	352
- พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	101	274	173	171	166	155	159	159	151
<b>รวม</b>	<b>1,503</b>	<b>1,680</b>	<b>1,680</b>	<b>1,699</b>	<b>1,699</b>	<b>1,762</b>	<b>1,768</b>	<b>1,768</b>	<b>1,770</b>
คิดเป็นร้อยละ	23.54	26.31	26.31	26.61	26.61	27.59	27.69	27.69	27.72
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า		177	-	19	-	63	6	-	2

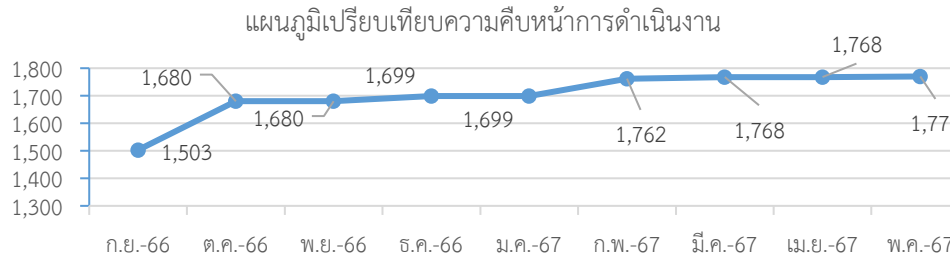

**④ สรุปปัญหา/ข้อติดขัดการดำเนินงานโครงการ**

**ปัญหา/อุปสรรค**

1. ผู้ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ  
ไม่รื้อย้ายบ้านเดิม มีกลุ่มแกนนำต่อต้านโครงการให้ข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริง เช่น ที่ดินริมคลองไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ และสามารถออกโฉนดได้ การรื้อย้ายบ้านเดิมจะต้องได้รับความชัดเจนจากภาครัฐ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความลังเลไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการ ซึ่งในบางชุมชนมีการรวมตัวขัดขวางการดำเนินงานในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถชี้แจงสร้างความเข้าใจและก่อสร้างตามแผนงานได้

**แนวทางการแก้ไข**

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธนารักษ์ชี้แจงเรื่องขอบเขตที่ดินราชพัสดุ กรมที่ดินชี้แจงยืนยันเรื่องการไม่สามารถออกโฉนดพื้นที่ริมคลอง โดยทุกหน่วยงานให้ข้อมูลกับประชาชนตรงกันเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และพิจารณาการใช้กฎหมายเพิ่มเติม

## ปัญหา/อุปสรรค

2. ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนงานของชุมชน  
การดำเนินการของหน่วยงานร่วมบูรณาการล่าช้ากว่าแผนงาน อาทิ การอนุญาตให้เช่าที่ดิน การกำหนดขอบเขตที่ดิน ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน
3. บางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดดำเนินการ ไม่ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงการ เนื่องจากขาดความมั่นใจในแผนการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ กทม.
4. บางชุมชนคลองเปรมประชากรพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างบ้าน และต้องดำเนินการพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานอื่น เช่น การสร้างถนนของท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา

## แนวทางการแก้ไข

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงานและกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบเวลา ซึ่งจะทำให้การรื้อย้ายบ้านของประชาชนและการก่อสร้างเขื่อนดำเนินการไปได้ตามแผนงาน
3. สำนักการระบายน้ำ กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน พร้อมเร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อน
4. มีกลไกติดตามและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
