

รายงานสถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2567
เดือนตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567

①งบสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2567 มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขต (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มีภาพรวมงบประมาณดำเนินการ 7,125 ครั้วเรือน คงเหลืองบประมาณรอดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงิน 731,237,809.54 บาท รายละเอียดภาพรวมโครงการ ดังนี้

ตารางภาพรวมการอนุมัติ-เบิกจ่ายสะสม ณ 31 ก.ค. 2567

โครงการ	งบที่ได้รับจัดสรร (1)	อนุมัติงบประมาณสะสม		รับเงินจากชุมชน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณ		เงินคงเหลือ		รวมคงเหลือ ณ 31 ก.ค. 2567
		จำนวนเงิน (2)	ครั้วเรือน		ค่าบริหารจัดการ(4)	เงินอุดหนุน(5)	รอเบิกจ่าย(2)-(3)-(5)	รอจัดสรร(1)-(2)-(4)	
1. งบสนับสนุนปี 2560	751,360,000.00	407,251,523.00	2,987	89,892,728.00	47,406,400.00	471,251,735.00	25,892,516.00	296,702,077.00	322,594,593.00
2. งบสนับสนุนปี 2561	199,680,000.00	178,087,669.00	927	863,800.00	-	195,745,903.46	4,735,000.00	62,896.54	4,797,896.54
3. งบสนับสนุนปี 2563	548,240,000.00	511,259,381.00	3,115	2,133,500.00	34,703,592.00	335,377,998.00	175,953,383.00	4,210,277.00	180,163,660.00
4. งบสนับสนุนปี 2564	175,120,000.00	11,816,128.00	96	-	11,085,096.00	1,351,128.00	10,465,000.00	152,218,776.00	162,683,776.00
5. งบสนับสนุนปี 2565	35,200,000.00	-	-	-	2,228,160.00	-	-	32,971,840.00	32,971,840.00
6. งบสนับสนุนปี 2566	17,600,000.00	-	-	-	1,114,100.00	-	-	16,485,900.00	16,485,900.00
7. งบสนับสนุนปี 2567	12,320,000.00	-	-	-	779,856.00	-	-	11,540,144.00	11,540,144.00
รวม	1,739,520,000.00	1,108,414,701.00	7,125	92,890,028.00	97,317,204.00	1,003,726,764.46	217,045,899.00	514,191,910.54	731,237,809.54

②รายงานสถานะการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม-มิถุนายน 2567 (ไตรมาส 3)

งบดำเนินโครงการใช้งบประมาณคงเหลือมาดำเนินการต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2567 เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 ได้รับอนุมัติงบจัดสรรให้กับชุมชน จำนวน 70 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 12,320,000 บาท หักเป็นงบสำหรับใช้ดำเนินงาน 779,856 บาท คงเหลือใช้สนับสนุน จำนวน 11,540,144 บาท ณ เดือนกรกฎาคม 2567 มีสถานะการดำเนินโครงการ ดังนี้

ตารางสรุปสถานะ ต.ค. 66 – 31 ก.ค. 67

โครงการ	ณ 30 ก.ย. 2566					ดำเนินการปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.-ก.ย.67)							คงเหลือ รอเบิก	คงเหลือ งบบุคลากร	
	งบที่ได้รับจัดสรร		คงเหลือดำเนินการในปี 67	คงเหลือดำเนินการในปี 67		คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.ดี/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติ งบระหว่างปี	คืนงบ ประมาณ	รับโอน เงินคืน	เบิกจ่าย			ร้อยละ
	งบประมาณ	ครั้วเรือน	งบประมาณ	ครั้วเรือน											
1. คลองลาดพร้าว	751,360,000	4,696	299,824,077	24,193,162.00	2,968	19	-	2,987	3,122,000.00	-	-	1,422,646.00	5.88	25,892,516.00	296,702,077.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ค85568	338,112,000	-	144,340,239.00	19,229,897.00	-	-	-	-	1,368,000.00	-	-	958,049.00	-	19,639,848.00	142,972,239.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ค86668	365,841,600	-	155,483,838.00	4,963,265.00	-	-	-	-	1,754,000.00	-	-	464,597.00	-	6,252,668.00	153,729,838.00
2. คลองเปรมประชากร	988,260,000	5,407	231,477,833.54	204,950,423.00	4,068	70	-	4,138	15,921,250.00	128,500.00	4,285,250.00	29,718,290.00	14.44	191,153,383.00	219,770,083.54
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2561-62	199,680,000	927	606,896.54	5,214,394.00	927	-	-	927	548,000.00	-	-	879,394.00	16.86	4,879,000.00	62,896.54
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2563	548,240,000	3,115	7,189,277.00	199,736,029.00	3,115	-	-	3,115	4,912,250.00	128,500.00	4,285,250.00	28,838,896.00	14.44	175,809,383.00	6,562,277.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2564	175,120,000	995	162,683,776.00	-	26	70	-	96	10,465,000.00	-	-	-	-	10,465,000.00	152,218,776.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2565	35,300,000	200	32,971,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,971,840.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2566	17,600,000	100	16,485,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,485,900.00
- งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2567	12,320,000	70	11,540,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,540,144.00
รวม	1,739,620,000	10,103	531,301,910.54	229,143,585.00	7,036	89	-	7,125	19,043,250.00	128,500.00	4,285,250.00	31,140,936.00	14.44	217,045,899.00	516,472,160.54

1. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560-2567

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2566 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 2,968 ครัวเรือน 24,193,162 บาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองลาดพร้าวในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวนเงิน 1,422,646 บาท และได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน 19 ครัวเรือน จำนวนเงิน 3,122,000 บาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ 561 ครัวเรือน จำนวนเงิน 25,892,516 บาท

2. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณปี 2561-2567

2.1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2561-2562 มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 927 ครัวเรือน 5,214,394 บาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบคงเหลือรอเบิกจ่าย 879,394 บาท และได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชนสะสม 544,000 บาท จึงมีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ 4,735,000 บาท

2.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2563 มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 3,115 ครัวเรือน จำนวนเงิน 199,736,029 บาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบคงเหลือรอเบิกจ่าย 28,838,896 บาท และได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชนสะสม 4,912,250 บาท จึงมีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ 175,809,383 บาท

2.3 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2564 มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบสม.จำนวนเงิน 1,351,128 บาท โดยมีงบประมาณดำเนินการสำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 162,683,776 บาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชนสะสม จำนวน 2 องค์กร 70 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,465,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2565-2567 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

③ สถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

1. คลองลาดพร้าว กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ดำเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ 7 เขต คือ พื้นที่ 1 เขตสายไหม 1,454 ครัวเรือน พื้นที่ 2 เขตหลักสี่และดอนเมือง 1,356 ครัวเรือน พื้นที่ 3 เขตบางเขน 1,469 ครัวเรือน พื้นที่ 4 เขตจตุจักร 1,283 ครัวเรือน และพื้นที่ 5 เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 1,507 ครัวเรือน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 35 ชุมชน 3,646 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.73 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,413 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 41 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 203 ครัวเรือน

ความคืบหน้างานก่อสร้าง	ชุมชน	ครัวเรือน	สร้างเสร็จ	กำลังสร้าง	พร้อมสร้าง
สายไหม	10	1,454	1,199	-	-
ดอนเมือง/หลักสี่	6	1,357	778	10	48
บางเขน	8	1,469	664	-	41
จตุจักร	11	1,283	398	31	110
ห้วยขวาง/วังทองหลาง	15	1,506	374	-	4
รวม	50	7,069	3,413	41	203

2. คลองเปรมประชากร กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) เมื่อมิถุนายน 2561 คือ มีผู้รื้อกล้าล้ำน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 20 ชุมชน 1,892 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.63 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,350 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 333 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 209 ครัวเรือน

ตารางแสดงความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2567 (สิ้นเดือนกันยายน 2566 ถึงปัจจุบัน)

(คลองเปรมประชากรสามารถดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม 389 ครัวเรือน)

ผลการดำเนินงาน (ครัวเรือน)	พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2567						
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ	1,034	1,057	1,097	1,117	1,197	1,214	1,257	1,257	1,267	1,277	1,350
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	368	349	410	411	336	393	352	352	352	363	333
- พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	101	274	173	171	166	155	159	159	151	236	209
รวม	1,503	1,680	1,680	1,699	1,699	1,762	1,768	1,768	1,770	1,876	1,892
คิดเป็นร้อยละ	23.54	26.31	26.31	26.61	26.61	27.59	27.69	27.69	27.72	29.38	29.63
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า		177	-	19	-	63	6	-	2	106	16

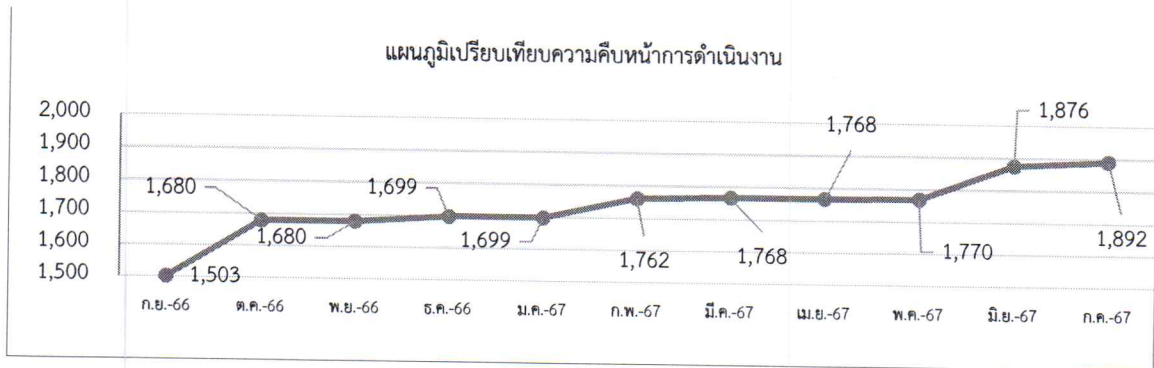

④ สรุปปัญหา/ข้อติดขัดการดำเนินงานโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>1. ผู้ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ</p> <p>ไม่รู้หรือย้ายบ้านเดิม มีกลุ่มแกนนำต่อต้านโครงการให้ข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริง เช่น ที่ดินริมคลองไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ และสามารถออกโฉนดได้ การรื้อย้ายบ้านเดิมจะต้องได้รับความชัดเจนจากภาครัฐ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความลังเลไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการ ซึ่งในบางชุมชนมีการรวมตัวขัดขวางการดำเนินงานในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถชี้แจงสร้างความเข้าใจและก่อสร้างตามแผนงานได้</p>	<p>1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธนารักษ์ชี้แจงเรื่องขอบเขตที่ดินราชพัสดุ กรมที่ดินชี้แจงยืนยันเรื่องการไม่สามารถออกโฉนดพื้นที่ริมคลอง โดยทุกหน่วยงานให้ข้อมูลกับประชาชนตรงกันเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และพิจารณาการใช้กฎหมายเพิ่มเติม</p>
<p>2. ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนงานของชุมชน</p> <p>การดำเนินการของหน่วยงานร่วมบูรณาการล่าช้ากว่าแผนงาน อาทิ การอนุญาตให้เช่าที่ดิน การกำหนดขอบเขตที่ดิน ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน</p>	<p>2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงานและกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบเวลา ซึ่งจะช่วยให้การรื้อย้ายบ้านของประชาชนและการก่อสร้างเชื่อมดำเนินการไปได้ตามแผนงาน</p>
<p>3. บางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดดำเนินการ ไม่ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงการ เนื่องจากขาดความมั่นใจในแผนการก่อสร้างเชื่อมของสำนักการระบายน้ำ กทม.</p>	<p>3. สำนักการระบายน้ำ กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน พร้อมเร่งดำเนินการก่อสร้างเชื่อม</p>
<p>4. บางชุมชนคลองเปรมประชากรพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างบ้านและต้องดำเนินการพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานอื่น เช่น การสร้างถนนของท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา</p>	<p>4. มีกลไกติดตามและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่</p>
