

รายงานสถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2567
เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

๑) งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2567 มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขต (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีภาพรวมงบประมาณดำเนินการ 6,950 ครัวเรือน คงเหลืองบประมาณ รอดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงิน 712,946,911.54 บาท

ตารางภาพรวมการอนุมัติ-เบิกจ่ายสะสม ณ 30 กันยายน 2567

โครงการ	งบที่ได้รับจัดสรร (1)	อนุมัติงบประมาณ+งบบริหารสะสม		รับคืนเงินจากชุมชน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณ		เงินคงเหลือ		รวมคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567
		จำนวนเงิน (2)	ครัวเรือน		ค่าบริหารจัดการ(4)	เงินอุดหนุน(5)	รอเบิกจ่าย	รอจัดสรร	
1.งบสนับสนุนปี 2560	751,360,000.00	454,657,923.00	2,987	89,892,728.00	47,406,400.00	384,219,507.00	23,143,848.00	296,702,077.00	319,845,925.00
	338,112,000.00	195,139,761.00		28,251,810.00	-	176,763,413.00	18,376,348.00	142,972,239.00	161,348,587.00
	365,841,600.00	212,111,762.00		61,640,918.00	-	207,456,094.00	4,655,668.00	153,729,838.00	158,385,506.00
	47,406,400.00	47,406,400.00		-	47,406,400.00	-	-	-	-
2.งบสนับสนุนปี 2561	199,680,000.00	194,864,603.46	905	881,300.00	21,529,434.46	173,335,169.00	-	4,815,396.54	4,815,396.54
		173,335,169.00							
		21,529,434.46							
		-							
3.งบสนับสนุนปี 2563	548,240,000.00	517,293,628.00	2,973	4,357,250.00	34,703,592.00	342,254,678.00	140,335,358.00	30,946,372.00	171,281,730.00
4.งบสนับสนุนปี 2564	175,120,000.00	16,142,224.00	15	-	11,085,096.00	4,261,128.00	796,000.00	158,977,776.00	159,773,776.00
5.งบสนับสนุนปี 2565	35,200,000.00	2,228,160.00	-	-	2,228,160.00	-	-	32,971,840.00	32,971,840.00
6.งบสนับสนุนปี 2566	17,600,000.00	1,114,100.00	-	-	1,114,100.00	-	-	16,485,900.00	16,485,900.00
7.งบสนับสนุนปี 2567	12,320,000.00	11,244,856.00	70	-	779,856.00	3,767,800.00	6,697,200.00	1,075,144.00	7,772,344.00
รวม	1,739,520,000.00	1,197,545,494.46	6,950	95,131,278.00	118,846,638.46	907,838,282.00	170,972,406.00	541,974,505.54	712,946,911.54

๒) รายงานสถานะการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม-กันยายน 2567 (ไตรมาส 4)

งบดำเนินโครงการใช้งบประมาณคงเหลือมาดำเนินการต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2567 เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 ได้รับอนุมัติงบจัดสรรให้กับชุมชน จำนวน 70 ครัวเรือน จำนวนเงิน 12,320,000 บาท หักเป็นงบสำหรับใช้ดำเนินงาน 779,856 บาท คงเหลือใช้สนับสนุน จำนวน 11,540,144 บาท ณ เดือนกันยายน 2567 มีสถานะการดำเนินโครงการ ดังนี้

ตารางสรุปสถานะ ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

โครงการ	ณ 30 ก.ย. 2566					ดำเนินการปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.66 -ก.ย. 67)							คงเหลือ รอเบิก	คงเหลือ งบจัดสรร	
	งบที่ได้รับจัดสรร		คงเหลือดำเนินการในปี 67		คร.อนุมัติ	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติ งบระหว่างปี	คืนงบประมาณ	รับโอน เงินคืน	เบิกจ่าย	รอสะสม			
	งบประมาณ	ครัวเรือน	งบประมาณ	งบประมาณ											ครัวเรือน
1.คลองลาดพร้าว	751,360,000.00	4,696	299,824,077	24,193,162.00	2,968	19	-	2,987	3,122,000.00	-	-	4,171,314.00	17.24	23,143,848.00	296,702,077.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ค86568	338,112,000.00	-	144,340,239.00	19,229,897.00	-	-	-	-	1,368,000.00	-	-	2,221,549.00	-	18,376,348.00	142,972,239.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ค86668	365,841,600.00	-	155,483,838.00	4,963,265.00	-	-	-	-	1,754,000.00	-	-	1,949,765.00	-	4,767,500.00	153,729,838.00
-งบดำเนินงาน	47,406,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.คลองเปรมประชากร	988,160,000.00	5,407	231,477,833.54	204,950,423.00	4,068	85	190	3,963	19,627,250.00	33,421,845.00	4,302,750.00	47,630,020.00	-	147,828,558.00	245,272,428.54
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2561-62	199,680,000.00	927	606,896.54	5,214,394.00	927	-	22	905	544,000.00	4,752,500.00	17,500.00	1,023,394.00	19.63	-	4,815,396.54
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2563	548,240,000.00	3,115	7,189,277.00	199,736,029.00	3,141	-	168	2,973	4,912,250.00	28,669,345.00	4,285,250.00	39,928,826.00	19.99	140,335,358.00	30,946,372.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2564	175,120,000.00	995	162,683,776.00	-	-	15	-	15	3,706,000.00	-	-	2,910,000.00	78.52	796,000.00	158,977,776.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2565	35,200,000.00	200	32,971,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,971,840.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2566	17,600,000.00	100	16,485,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,485,900.00
-งบสนับสนุนชุมชนริมคลอง ปี2567	12,320,000.00	70	11,540,144.00	-	-	70	-	70	10,465,000.00	-	-	3,767,800.00	36.00	6,697,200.00	1,075,144.00
รวม	1,739,520,000.00	10,103	531,301,910.54	229,143,585.00	7,036	104	190	6,950	22,749,250.00	33,421,845.00	4,302,750.00	51,801,334.00	-	170,972,406.00	541,974,505.54

1. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560 - 2567

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2566 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 24,193,162 บาท 2,968 ครัวเรือน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองลาดพร้าวในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวนเงิน 4,171,314 บาท และได้รับอนุมัติงบสนับสนุน 19 ครัวเรือน จำนวนเงิน 3,122,000 บาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงิน 23,143,848 บาท

2. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณปี 2561 - 2567

2.1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2561-2562 มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 927 ครัวเรือน 5,214,394 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2567 มีการเบิกงบคงเหลือรอเบิกจ่าย 1,023,394 บาท และได้รับอนุมัติงบสนับสนุนชุมชนสะสม 544,000 บาท รั้งคืนโครงการและงบประมาณ 22 ครัวเรือน จำนวน 4,770,000 บาท จึงมีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ 47,828,558 บาท

2.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2563 มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 3,141 ครัวเรือน จำนวนเงิน 199,736,029 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2567 มีการเบิกจ่ายงบคงเหลือรอเบิกจ่าย 39,928,826 บาท และได้รับอนุมัติงบสนับสนุนชุมชนสะสม 4,912,250 บาท รั้งคืนโครงการและงบประมาณ 168 ครัวเรือน จำนวน 32,954,595 บาท จึงมีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ 140,335,358 บาท

2.3 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2564 มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบ สผ.จำนวนเงิน 1,351,128 บาท โดยมีงบประมาณดำเนินการสำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 162,683,776 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีการอนุมัติงบสนับสนุนชุมชนสะสม 15 ครัวเรือน จำนวนเงิน 3,706,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 2,910,000 บาท จึงมีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ 796,000 บาท

2.4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2565-2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

2.5 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ได้รับอนุมัติงบสนับสนุนชุมชนสะสม 10,465,000 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณ 3,767,800 บาท จึงมีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ 6,697,200 บาท

③ สถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

1. **คลองลาดพร้าว** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ดำเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ 7 เขต คือ พื้นที่ 1 เขตสายไหม 1,454 ครัวเรือน พื้นที่ 2 เขตหลักสี่และดอนเมือง 1,356 ครัวเรือน พื้นที่ 3 เขตบางเขน 1,469 ครัวเรือน พื้นที่ 4 เขตจตุจักร 1,283 ครัวเรือน และพื้นที่ 5 เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 1,507 ครัวเรือน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 35 ชุมชน 3,706 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 52.43 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,413 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 41 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 252 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน (ครัวเรือน)	พ.ศ. 2566				พ.ศ.2567									
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ก่อสร้างแล้วเสร็จ	3,331	3,339	3,339	3,342	3,368	3,374	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	67	60	60	57	46	78	43	43	43	43	41	41	41	
พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	155	154	154	154	154	194	190	190	190	190	203	203	252	
รวม	3,553	3,553	3,553	3,553	3,568	3,646	3,646	3,646	3,646	3,646	3,657	3,657	3,706	
คิดเป็นร้อยละ	50.26	50.26	50.26	50.26	50.47	51.58	51.58	51.58	51.58	51.58	51.73	51.73	52.43	
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า	-	-	-	-	15	78	-	-	-	-	11	-	49	

2. **คลองเปรมประชากร** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) เมื่อมิถุนายน 2561 คือ มีผู้รुकู้ลำน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 23 ชุมชน 2,092 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.76 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,472 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 380 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 240 ครัวเรือน

ตารางแสดงความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2567 (สิ้นเดือนกันยายน 2566 ถึงปัจจุบัน)

(คลองเปรมประชากรสามารถดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม 389 ครัวเรือน)

ผลการดำเนินงาน (ครัวเรือน)	พ.ศ. 2566				พ.ศ.2567									
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ก่อสร้างแล้วเสร็จ	1,034	1,057	1,097	1,117	1,197	1,214	1,257	1,257	1,267	1,333	1,350	1,464	1,472	
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	368	349	410	411	336	393	352	352	352	307	333	229	380	
พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	101	274	173	171	166	155	159	159	151	236	209	325	240	
รวม	1,503	1,680	1,680	1,699	1,699	1,762	1,768	1,768	1,770	1,876	1,892	2,018	2,092	
คิดเป็นร้อยละ	23.54	26.31	26.31	26.61	26.61	27.59	27.69	27.69	27.72	29.38	29.63	31.55	32.76	
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า	-	177	-	19	-	63	6	-	2	106	16	126	74	

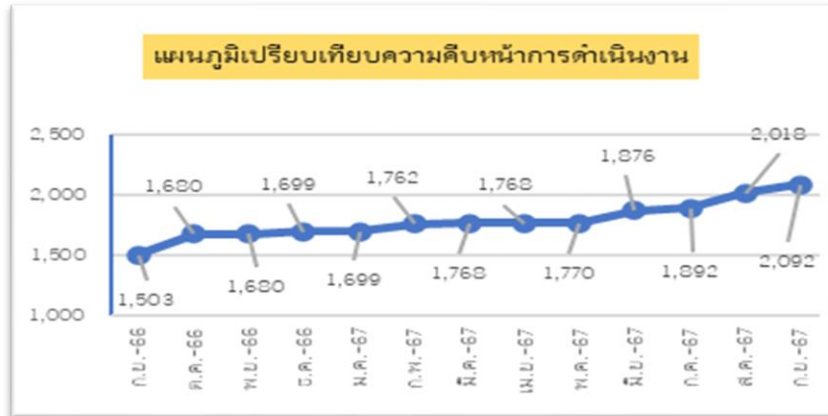

④ สรุปปัญหา/ข้อติดขัดการดำเนินงานโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>1. ผู้ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ ไม่รื้อย้ายบ้านเดิม มีกลุ่มแกนนำต่อต้านโครงการให้ข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริง เช่น ที่ดินริมคลองไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ และสามารถออกโฉนดได้ การรื้อย้ายบ้านเดิมจะต้องได้รับความชัดเจนจากภาครัฐ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความลังเลไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการ ซึ่งในบางชุมชนมีการรวมตัวขัดขวางการดำเนินงานในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถชี้แจงสร้างความเข้าใจและก่อสร้างตามแผนงานได้</p>	<p>1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธนารักษ์ชี้แจงเรื่องขอบเขตที่ดินราชพัสดุ กรมที่ดินชี้แจงยืนยันเรื่องการไม่สามารถออกโฉนดพื้นที่ริมคลอง โดยทุกหน่วยงานให้ข้อมูลกับประชาชนตรงกันเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และพิจารณาการใช้กฎหมายเพิ่มเติม</p>
<p>2. ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนงานของชุมชน การดำเนินการของหน่วยงานร่วมบูรณาการล่าช้ากว่าแผนงาน อาทิ การอนุญาตให้เช่าที่ดิน การกำหนดขอบเขตที่ดิน ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน</p>	<p>2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงานและกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบเวลา ซึ่งจะช่วยให้การรื้อย้ายบ้านของประชาชนและการก่อสร้างเชื่อมดำเนินการไปได้ตามแผนงาน</p>
<p>3. บางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดดำเนินการ ไม่ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงการ เนื่องจากขาดความมั่นใจในแผนการก่อสร้างเชื่อมของสำนักการระบายน้ำ กทม.</p>	<p>3. สำนักการระบายน้ำ กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน พร้อมเร่งดำเนินการก่อสร้างเชื่อม</p>
<p>4. บางชุมชนคลองเปรมประชากรพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างบ้านและต้องดำเนินการพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานอื่น เช่น การสร้างถนนของท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา</p>	<p>4. มีกลไกติดตามและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่</p>
