

**รายงานสถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี ๒๕๖๗**  
**เดือนตุลาคม ๒๕๖๗**

**๑) งบสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง**

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๗ มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม ๗ เขต (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีภาพรวมงบประมาณดำเนินการ ๖,๙๕๐ ล้านบาท ครีวเรือน คงเหลืองบประมาณรอดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๗๑๒,๙๕๖,๙๑๑.๕๔ บาท

ตารางภาพรวมการอนุมัติ-เบิกจ่ายสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ	งบที่ได้รับจัดสรร (๑)	อนุมัติงบประมาณ+บริหารสะสม		รับเงินจากชุมชน (๓)	การเบิกจ่ายงบประมาณ		เงินคงเหลือ		รวมคงเหลือ ยกไปปี ๒๕๖๘
		จำนวนเงิน (๒)	ครีวเรือน		การบริหารจัดการ(๔)	เงินอุดหนุน(๕)	รอเบิกจ่าย	รอจัดสรร	
๑. งบสนับสนุนปี ๒๕๖๐	๗๕๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๖๕๗,๗๒๓.๐๐	๒,๙๕๗	๘๙,๘๖๒,๗๒๘.๐๐	๔๗,๕๐๖,๕๐๐.๐๐	๓๘๕,๒๕๑,๕๐๗.๐๐	๒๓,๑๕๓,๘๘๘.๐๐	๒๓๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐	๓๑๙,๘๔๕,๙๒๕.๐๐
๒. งบสนับสนุนปี ๒๕๖๑	๑๓๙,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙	๒๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๘,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓. งบสนับสนุนปี ๒๕๖๒	๕๕๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๕๗	๘,๓๕๗,๒๕๐.๐๐	๓๕,๗๐๓,๕๕๒.๐๐	๓๕๒,๕๔๖,๒๕๐.๐๐	๑๕๐,๓๓๕,๓๕๕.๐๐	๓๐,๙๕๖,๓๗๒.๐๐	๑๗๑,๖๘๑,๗๒๓.๐๐
๔. งบสนับสนุนปี ๒๕๖๓	๑๗๕,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	-	๑๑,๐๘๕,๐๙๖.๐๐	๑๖๓,๐๓๔,๙๐๔.๐๐	-	๑๑,๐๘๕,๐๙๖.๐๐	๑๕๔,๐๓๔,๙๐๔.๐๐
๕. งบสนับสนุนปี ๒๕๖๔	๓๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-
๖. งบสนับสนุนปี ๒๕๖๕	๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-
๗. งบสนับสนุนปี ๒๕๖๖	๑๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑,๗๖๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๓๗,๕๕๗,๘๙๖.๐๐	๖,๙๕๐	๙๘,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๒๙๖,๐๙๔.๐๐	๙๖๗,๒๕๖,๒๕๖.๐๐	๑๖๖,๖๖๕,๖๐๖.๐๐	๕๕๖,๕๙๐,๕๕๐.๐๐	๗๑๒,๙๕๖,๙๑๑.๕๔

**๒) รายงานสถานะการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑)**

งบดำเนินโครงการใช้งบประมาณคงเหลือมาดำเนินการต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ได้รับอนุมัติงบจัดสรรให้กับชุมชน จำนวน ๗๐ ครีวเรือน จำนวนเงิน ๑๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท ทักเป็นงบสำหรับใช้ดำเนินงาน ๑,๐๘๗,๒๐๐ บาท คงเหลือใช้สนับสนุน จำนวน ๑๑,๒๓๒,๘๐๐ บาท ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ มีสถานะการดำเนินโครงการ ดังนี้

ตารางสรุปสถานะ ค.ค. ๖๗

โครงการ	ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗				ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ค.ค.๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘)							คงเหลือ รอเบิก	คงเหลือ งบจัดสรร	
	งบที่ได้รับจัดสรร	ครีวเรือน	คงเหลืองบจัดสรร	คงเหลือรอเบิกจ่ายในปี ๖๘	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืนยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติ งบระหว่างปี	ทิ้งงบ ประมาณ	รับโอน เงินคืน	เบิกจ่าย			ร้อยละ
๑. คลองลาดพร้าว	๗๕๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๕๗	๒๓๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐	๒๓๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐	-	-	๒,๙๕๗	-	-	-	-	-	๒๓๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐	๒๓๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐
- งบสนับสนุนชุมชนคลอง คค๖๕๖๘	๓๓๘,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐	๑๕๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐	๑๕๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐
- งบสนับสนุนชุมชนคลอง คค๖๕๖๙	๓๖๕,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐	๑๕๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐	๑๕๖,๗๐๒,๐๗๗.๐๐
- งบดำเนินงาน	๕๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. คลองเปรมประชากร	๑,๐๐๐,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๕๗	๒๓๖,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	๑๕๗,๘๘๖,๕๕๖.๐๐	-	-	๑,๕๖๗	๕๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๖๕๖,๗๕๖.๐๐	-	๑๕๖,๕๕๖,๕๕๖.๐๐	๒๓๖,๐๒๐,๒๕๐.๐๐
- งบสนับสนุนชุมชนคลอง ปี๒๕๖๑-๖๒	๑๗๕,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐
- งบสนับสนุนชุมชนคลอง ปี๒๕๖๓	๕๕๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๕๗	๑๑,๐๘๕,๐๙๖.๐๐	๑๑,๐๘๕,๐๙๖.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑,๐๘๕,๐๙๖.๐๐	๑๑,๐๘๕,๐๙๖.๐๐
- งบสนับสนุนชุมชนคลอง ปี๒๕๖๔	๑๗๕,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐
- งบสนับสนุนชุมชนคลอง ปี๒๕๖๕	๑๗๕,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	๑๕,๕๕๖,๒๕๐.๐๐
- งบสนับสนุนชุมชนคลอง ปี๒๕๖๖	๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๖,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๖,๕๕๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๕๕๖,๒๕๐.๐๐
- งบสนับสนุนชุมชนคลอง ปี๒๕๖๗	๑๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๑,๒๓๒,๘๐๐.๐๐	๑๑,๒๓๒,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑,๒๓๒,๘๐๐.๐๐	๑๑,๒๓๒,๘๐๐.๐๐
- งบสนับสนุนชุมชนคลอง ปี๒๕๖๘	๑๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๑,๒๓๒,๘๐๐.๐๐	๑๑,๒๓๒,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑,๒๓๒,๘๐๐.๐๐	๑๑,๒๓๒,๘๐๐.๐๐
รวม	๑,๗๖๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๙๕๐	๕๕๖,๕๙๐,๕๕๐.๐๐	๕๕๖,๕๙๐,๕๕๐.๐๐	-	-	๖,๙๕๐	๕๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๖๕๖,๗๕๖.๐๐	-	๕๕๖,๕๙๐,๕๕๐.๐๐	๕๕๖,๕๙๐,๕๕๐.๐๐

**๑. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองลาดพร้าว งบประมาณปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๗**

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๗ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๓,๑๔๓,๘๔๘ บาท ๒,๙๘๗ ครัวเรือน

ณ วันที่ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

**๒. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗**

**๒.๑ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒** มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙๐๕ ครัวเรือน ๔,๘๑๕,๓๙๖.๕๔ บาท

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

**๒.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี ๒๕๖๓** มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๑๔๑ ครัวเรือน จำนวนเงิน ๔,๘๑๕,๓๙๖.๕๔ บาท

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการเบิกจ่ายงบคงเหลือรอเบิกจ่าย ๖,๕๕๙,๗๒๕ บาท จึงมีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๖๔,๗๒๒,๐๐๗ บาท

**๒.๓ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี ๒๕๖๔** มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ ครัวเรือน จำนวนเงิน ๑๕๙,๗๗๓,๗๗๖ บาท

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

**๒.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖** ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

**๒.๕ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี ๒๕๖๗** มีงบประมาณดำเนินการคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐ ครัวเรือน จำนวนเงิน ๗,๗๗๒,๓๔๔ บาท

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

**๒.๖ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี ๒๕๖๘** ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ


**๓) สถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง**

**๑. คลองลาดพร้าว** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ ๕๐ ชุมชน ๗,๐๖๙ ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ดำเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ ๗ เขต คือ พื้นที่ ๑ เขตสายไหม ๑,๔๕๔ ครัวเรือน พื้นที่ ๒ เขตหลักสี่และดอนเมือง ๑,๓๕๖ ครัวเรือน พื้นที่ ๓ เขตบางเขน ๑,๔๖๙ ครัวเรือน พื้นที่ ๔ เขตจตุจักร ๑,๒๘๓ ครัวเรือน และพื้นที่ ๕ เขตห้วยขวางและวังทองหลาง ๑,๕๐๗ ครัวเรือน

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว ๓๕ ชุมชน ๓,๗๓๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๒ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓,๔๑๑ ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๘๓ ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน ๒๔๐ ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗	
	ก.ย.	ต.ค.
(ครัวเรือน)		
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๓,๔๑๓	๓,๔๑๓
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	๔๑	๘๐
- พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	๒๕๒	๒๓๓
<b>รวม</b>	<b>๓,๗๐๖</b>	<b>๓,๗๓๖</b>
คิดเป็นร้อยละ	๕๒.๔๓	๕๒.๗๗
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า		๒๔

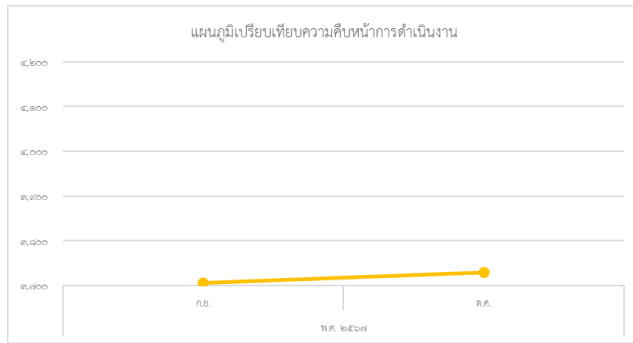


**๒. คลองเปรมประชากร** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) เมื่อมิถุนายน ๒๕๖๑ คือ มีผู้รุกกล้าลักน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น ๓๘ ชุมชน ๖,๓๘๖ ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน ๓๒ ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๖ หมู่บ้าน

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว ๒๓ ชุมชน ๒,๑๘๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๕ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑,๔๗๔ ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕๗๕ ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน ๑๓๒ ครัวเรือน

**ตารางแสดงความคืบหน้าผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
(สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบัน) สามารถดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม ๘๙ ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗	
	ก.ย.	ต.ค.
(ครัวเรือน)		
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑,๔๗๒	๑,๔๗๔
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	๓๘๐	๕๗๕
- พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	๒๔๐	๑๓๒
<b>รวม</b>	<b>๒,๐๙๒</b>	<b>๒,๑๘๑</b>
คิดเป็นร้อยละ	๓๒.๗๖	๓๔.๑๕
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า		๘๙

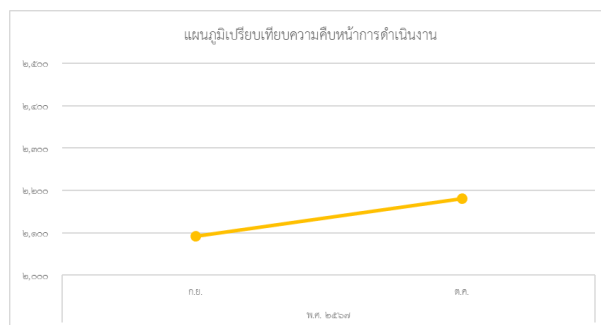

## ๔) สรุปปัญหา/ข้อติดขัดการดำเนินงานโครงการ

### ปัญหา/อุปสรรค

๑. ผู้ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ  
ไม่รู้ย้ายบ้านเดิม มีกลุ่มแกนนำต่อต้านโครงการให้ข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริง เช่น ที่ดินริมคลองไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ และสามารถออกโฉนดได้ การรื้อย้ายบ้านเดิมจะต้องได้รับความชดเชยจากภาครัฐ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความลังเลไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการ ซึ่งในบางชุมชนมีการรวมตัวขัดขวางการดำเนินงานในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถชี้แจงสร้างความเข้าใจและก่อสร้างตามแผนงานได้

### แนวทางการแก้ไข

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธนารักษ์ชี้แจงเรื่องขอบเขตที่ดินราชพัสดุ กรมที่ดินชี้แจงยืนยันเรื่องการไม่สามารถออกโฉนดพื้นที่ริมคลอง โดยทุกหน่วยงานให้ข้อมูลกับประชาชนตรงกันเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนา

## ปัญหา/อุปสรรค

## แนวทางการแก้ไข

คุณภาพชีวิตประชาชน และพิจารณาการใช้กฎหมายเพิ่มเติม

๒. ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนงานของชุมชน  
การดำเนินการของหน่วยงานร่วมบูรณาการล่าช้ากว่าแผนงาน อาทิ การอนุญาตให้เช่าที่ดิน การกำหนดขอบเขตที่ดิน ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน
๓. บางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดดำเนินการ ไม่ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงการ เนื่องจากขาดความมั่นใจในแผนการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ กทม.
๔. บางชุมชนคลองเปรมประชากรพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างบ้าน และต้องดำเนินการพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานอื่น เช่น การสร้างถนนของท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงานและกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบเวลา ซึ่งจะทำให้การรื้อย้ายบ้านของประชาชน และการก่อสร้างเขื่อนดำเนินการไปได้ตามแผนงาน
๓. สำนักการระบายน้ำ กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน พร้อมเร่งดำเนินการการก่อสร้างเขื่อน
๔. มีกลไกติดตามและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
