


รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคง
ปีงบประมาณ 2569 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

1. รายงานการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง ปี 2569

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองและชนบท ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง เกิดการสร้างเครือข่ายเมืองและชนบท การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในปี 2569 มีเป้าหมายดำเนินการ 3,370 ครั้วเรือน วงเงินรวม 302,626,000 บาท แบ่งเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 25,723,210 บาท งบดำเนินการสำหรับชุมชน 276,902,790 บาท

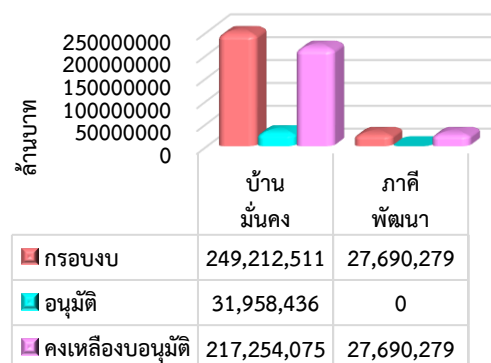

การสนับสนุนงบประมาณปี 2569 มีแผนงานสนับสนุนองค์กรชุมชน 2 ประเภทบ คือ 1) งบสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย วงเงิน 249,212,511 บาท และ 2) งบพัฒนากระบวนเมือง วงเงิน 27,690,279 บาท มีการพิจารณาเห็นชอบในพื้นที่ชนบท 3 จังหวัด 4 โครงการ 818 ครั้วเรือน งบประมาณรวม 31,958,436 บาท

โครงการบ้านมั่นคงปี 2568	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ
		โครงการ	ครั้วเรือน	งบอนุมัติปี 2568	ร้อยละอนุมัติ	
1.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง)	249,212,511	4	818	31,958,436	12.82	217,254,075
2.งบพัฒนากระบวนเมือง (ภาคีพัฒนา)	27,690,279	-	-	-	0.00	27,690,279
รวม	276,902,790	4	818	31,958,436	11.54	244,944,354

2. ภาพรวมงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงรายภาค

ในปีงบประมาณ 2568 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงินรวม 303,285,795 บาท

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ได้มีการพิจารณาและเห็นชอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ยกมาจากงบประมาณปี 2568 และเห็นชอบงบประมาณปี 2569 จำนวน 4 โครงการ 818 ครั้วเรือน งบประมาณที่อนุมัติ 31,958,436 บาท รวมงบอนุมัติสะสม 348,442,231 บาท

ภาค	ยกมาปี 2569	งบอนุมัติปี 2569				รวมงบคงเหลือ+อนุมัติสะสม
	รวมงบคงเหลือ	ครั้วเรือน	งบอุดหนุน60-68	งบอุดหนุนปี 69	รวมอนุมัติในปี 69	
ภาคเหนือ	44,543,418	818	2,800,000	31,958,436	34,758,436	79,301,854
ภาคใต้	58,847,583				-	58,847,583
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	32,018,545				-	32,018,545
ภาคกลางและตะวันตก	20,877,356				-	20,877,356
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล	76,956,516				-	76,956,516
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	69,418,377				-	69,418,377
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมราง	600,000		1,206,000		1,206,000	1,806,000
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง	24,000		9,192,000		9,192,000	9,216,000
รวมงบคงเหลือ	303,285,795	818	13,198,000	31,958,436	45,156,436	348,442,231

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างปรับปรุงงบประมาณที่ขอยกเลิกและเสนอโครงการใหม่

การเบิกจ่าย มีการเบิกจ่ายสะสม 11,628,148 บาท คงเหลืองบรอเบิกจ่าย 327,376,978 บาท จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	รวมงบคงเหลือ+ อนุมัติสะสม	เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่าย สะสม	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมงบ คงเหลือรอเบิก
		เบิกงบ68ยกมา	ร้อยละ			
ภาคเหนือ	79,301,854	1,140,000	2.56	1,140,000	1.44	68,748,749
ภาคใต้	58,847,583	280,000	0.48	280,000	0.48	58,567,583
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	32,018,545	1,083,573	3.38	1,083,573	3.38	30,934,972
ภาคกลางและตะวันตก	20,877,356	-	-	-	-	20,877,356
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล	76,956,516	3,678,287	4.78	3,678,287	4.78	73,278,229
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	69,418,377	5,335,125	7.69	5,335,125	7.69	64,083,252
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมราง	1,806,000	111,163	18.53	111,163	6.16	1,694,837
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง	9,216,000	-	-	-	-	9,192,000
รวมงบคงเหลือ	348,442,231	11,628,148	3.83	11,628,148	3.34	327,376,978


3.การปิดโครงการ บ้านมั่นคง ปี 2560 – 2568 มีจำนวน 423 รอบปิดโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานการดำเนินงานและติดตามกับสำนักงานภาค สนับสนุนการดำเนินการ รายภาคดังนี้

คงเหลือรอบปิดโครงการ บ้านมั่นคง ณ พ.ย.2568								คงเหลือ
เหนือ	อีสาน	ใต้	กลาง/ตก	กทม./ออก	สนง.พัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	ส.ริมราง	ส.ริมคลอง	รอบปิดโครงการ
62	58	84	18	120	76	3	2	423

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2569 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

1. รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ ปี 2569

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ ปี 2569 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 165 ครั้วเรือน งบดำเนินการทั้งสิ้น 4,455,000 บาท

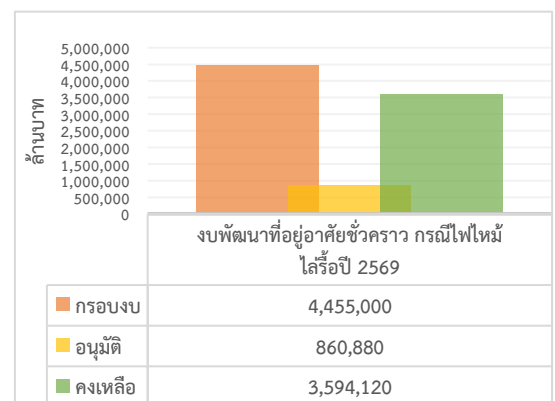

2. ภาพรวมงบประมาณโครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว มีงบคงเหลือปี 2568 มาดำเนินการปี 2569 ดังนี้

ปีงบประมาณ	งบดำเนินการยกมาปี 2569		ผลการอนุมัติโครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราวปี 2569			คงเหลือรอดำเนินการ	
	ครั้วเรือน	กรอบงบ	โครงการ	ครั้วเรือน	งบอนุมัติแล้ว	ครั้วเรือน	งบคงเหลือ
ปีงบประมาณ 2567 (96200)	-	979,155		39	565,350	-	413,805
ปีงบประมาณ 2568 (96300)	-	86,760				-	86,760
ปีงบประมาณ 2569 (96400)	165	4,455,000		34	860,880	131	3,594,120
รวม	165	5,520,915		73	1,426,230	131	4,094,685

สถานะงบประมาณที่อยู่อาศัยชั่วคราว มีงบจัดสรรคงเหลือปี 2567 และปี 2568 ยกมาดำเนินการร่วมกับ งบประมาณปี 2569 วงเงินรวม 5,520,915 บาท มีการพิจารณาสนับสนุนชุมชน 1,426,230 บาท คงเหลืองบสนับสนุนชุมชนรออนุมัติ 4,094,685 บาท ดังนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้เรือ ปี 2569 จำนวน 165 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 4,455,000 บาท มีการพิจารณาอนุมัติในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 34 ครั้วเรือน จำนวนเงินอนุมัติ 860,880 บาท คงเหลืองบสนับสนุนชุมชน 3,594,120 บาท

การเบิกจ่าย ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ภาค	อนุมัติดำเนินการปี 2569				เบิกจ่าย		คงเหลือรอเบิกจ่าย (พ.ย.68)
	งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569		เบิกปี 2569	ร้อยละเบิก	
			ครั้วเรือน	จำนวน			
ภาคเหนือ	-	-	25	675,000	-	-	675,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	565,350	-	3	68,880	-	-	634,230
ภาคใต้	-	-	1	27,000	-	-	27,000
ภาคกลางและตะวันตก	-	-	1	18,000	-	-	18,000
ภาคกทม.ปริมณฑล และตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-
สนง.พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท	-	-	4	72,000	-	-	72,000
สน.พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	-	-	-	-	-	-	-
สน.พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง	-	-	-	-	-	-	-
รวม	565,350	0	34	860,880	0	-	1,426,230
	รวมอนุมัติ			1,426,230	-	-	


3.การปิดโครงการ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว ปี 2563 – 2568 ณ พ.ย.2568 มีโครงการรอปัด 212 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานและติดตามกับสำนักงานภาคดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต.ค.2568	คงเหลือรอปัดโครงการ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว ณ พ.ย.2568							พ.ย.2568	
คงเหลือ	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลาง/ตก	กทม./ออก	สนง.พัฒนา	ส.ริมคลอง	ส.ริมราง	รวมรอปัด
	15	70	25	9	73	12	7	1	212

รายงานสถานะโครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ 2569 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

1. รายงานการดำเนินโครงการบ้านพอเพียง ปี 2569

โครงการบ้านพอเพียง ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้มีรายได้น้อย มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย จำนวน 15,634 ครั้วเรือน วงเงินรวม 625,000,000 บาท แบ่งเป็น งบบริหารจัดการโครงการ 28,125,000 บาท งบดำเนินการ 596,875,000 บาท จำแนกเป็นรายภาค ดังนี้

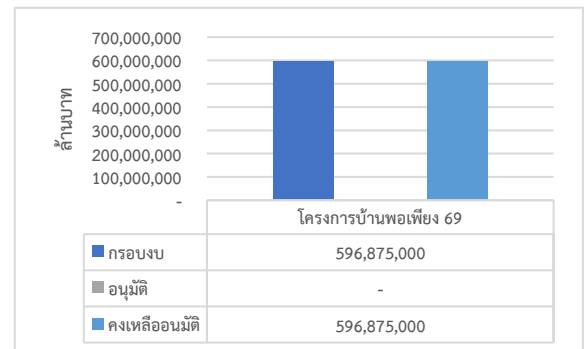

ภาค	เป้าหมายกรอบงบประมาณปี 2569			
	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	กรอบงบประมาณ
เหนือ	17	493	2,972	113,530,400
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	811	5,145	196,539,000
ใต้	14	384	2,723	104,018,600
กลางและตะวันตก	13	378	2,644	101,000,800
กทม. ปริมณฑลและตะวันออก	13	191	1,241	47,406,200
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ			909	34,380,000
รวม	77	2,257	15,634	596,875,000

การอนุมัติ-เบิกจ่าย โครงการบ้านพอเพียงยังไม่มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

2.การปิดโครงการ บ้านพอเพียง ปี 2560 – 2568 ณ พ.ย.2568 มีโครงการรอปิด ลดลงจากเดือนตุลาคม 2568 จำนวน 88 โครงการ (สนง.ภาคกลาง) รวมมีโครงการคงเหลือรอปิด 2,124 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานและติดตามกับสำนักงานภาคดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต.ค.2568	คงเหลือรอปิดโครงการ ณ พ.ย.2568						พ.ย.2568
คงเหลือ	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กลางและตะวันตก	กทม.และตะวันออก	ส.พัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	รวมรอปิด
2,212	430	1,272	144	140	128	10	2,124
