


รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคง

ปีงบประมาณ 2569 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. รายงานการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง ปี 2569

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองและชนบท ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง เกิดการสร้างเครือข่ายเมืองและชนบท การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในปี 2569 มีเป้าหมายดำเนินการ 3,370 ครัวเรือน วงเงินรวม 302,626,000 บาท แบ่งเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 25,723,210 บาท งบดำเนินการสำหรับชุมชน 276,902,790 บาท

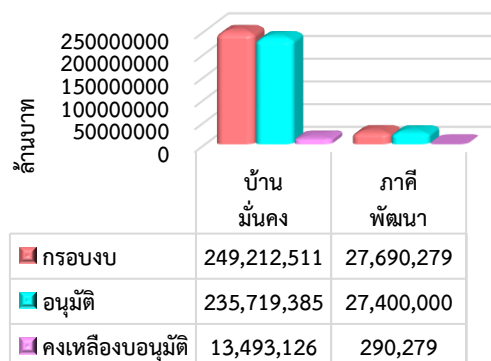

การสนับสนุนงบประมาณปี 2569 มีแผนงานสนับสนุนองค์กรชุมชน 2 ประเภทบ คือ 1) งบสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย และ 2) งบพัฒนากระบวนการเมือง โดยมีผลการพิจารณาเห็นชอบงบสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน 24 จังหวัด 154 ชุมชน 113 โครงการ (บ้านมั่นคง 34 โครงการ/พลังงานทางเลือก 79 โครงการ) 4,241 ครัวเรือน จำแนกเป็นพื้นที่เมือง 6 จังหวัด 12 ชุมชน 12 โครงการ 512 ครัวเรือน พื้นที่ชนบท 18 จังหวัด 142 ชุมชน 22 โครงการ 3,729 ครัวเรือน และงบพัฒนากระบวนการเมือง 21 โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม 263,119,385 บาท

โครงการบ้านมั่นคงปี 2569	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ
		โครงการ	ครัวเรือน	งบอนุมัติปี 2569	ร้อยละอนุมัติ	
1.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง) -งบสนับสนุนพลังงานทางเลือกบ้านมั่นคง	249,212,511	34 79	4,241	205,541,152 30,178,233	94.59	13,493,126
2.งบพัฒนากระบวนการเมือง (ภาษีพัฒนา)	27,690,279	21	-	27,400,000	98.95	290,279
รวม	276,902,790	134	4,241	263,119,385	95.02	13,783,405

*ปรับอนุมัติตามที่เสนอโครงการ

2. ภาพรวมงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงรายภาค

ในปีงบประมาณ 2568 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงินรวม 303,285,795 บาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ได้มีการพิจารณาและเห็นชอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ยกมาจากงบประมาณปี 2568 และเห็นชอบงบประมาณปี 2569 จำนวน 134 โครงการ 4,241 ครัวเรือน งบประมาณที่อนุมัติ 263,119,385 บาท รวมงบอนุมัติสะสม 657,870,877 บาท

ภาค	ยกมาปี 2569	งบอนุมัติปี 2569						รวมงบคงเหลือ+อนุมัติสะสม
	รวมงบคงเหลือ	ครัวเรือน	งบอุดหนุน60-68	งบอุดหนุนปี 69	งบพลังงาน	งบกระบวนการเมือง	รวมอนุมัติในปี 69	
ภาคเหนือ	44,543,418	1,327	21,019,634	56,233,679	4,679,888	4,100,000	86,033,201	130,576,619
ภาคใต้	58,847,583	1,083	11,430,000	56,789,033	4,670,000	300,000	73,189,033	132,036,616
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	32,018,545	660	5,049,451	35,430,700	4,242,696		44,722,847	76,741,392
ภาคกลางและตะวันตก	20,877,356	797	2,473,795	36,852,043	3,365,920	300,000	42,991,758	63,869,114
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล	76,956,516	124	19,782,260	8,170,297	7,261,009	1,300,000	36,513,566	113,470,082
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย/ริมราง	69,418,377	250	9,950,000	12,065,400	5,958,720	21,400,000	49,374,120	118,792,497
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมราง	600,000		5,980,000				5,980,000	6,580,000
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง	24,000		15,780,557				15,780,557	15,804,557
รวมงบคงเหลือ	303,285,795	4,241	91,465,697	205,541,152	30,178,233	27,400,000	354,585,082	657,870,877

การเบิกจ่าย มีการเบิกจ่ายสะสม 203,877,677 บาท คงเหลือบรอเบิกจ่าย 417,414,659 บาท
 จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	รวมงบคงเหลือ+ อนุมัติสะสม	เบิกจ่าย				รวมเบิกจ่าย สะสม	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมงบ คงเหลือรอเบิก
		เบิกงบ68ยกมา	ร้อยละ	เบิกงบอนุมัติ69	ร้อยละ			
ภาคเหนือ	130,576,619	14,406,779	32.34	19,134,050	22.24	33,540,829	25.69	83,862,718
ภาคใต้	132,036,616	29,547,376	50.21	11,394,653	15.57	40,942,029	31.01	91,094,587
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	76,741,392	4,144,858	12.95	340,000	0.76	4,484,858	5.84	72,256,534
ภาคกลางและตะวันตก	63,869,114	7,648,131	36.63	20,910,647	48.64	28,558,778	44.71	31,700,741
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล	113,470,082	29,409,670	38.22	3,743,425	10.25	33,153,095	29.22	60,545,103
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย/ริมราง	118,792,497	25,309,898	36.46	17,768,700	35.99	43,078,598	36.26	75,713,899
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมราง	6,580,000	5,980,000	90.88	-	-	5,980,000	90.88	600,000
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง	15,804,557	14,139,480	89.46	-	-	14,139,480	89.46	1,641,077
รวมงบคงเหลือ	657,870,877	130,586,192	43.06	73,291,475	20.67	203,877,667	30.99	417,414,659

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง โดยมีการประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน ตั้งแต่
 เมษายน - กันยายน 2569 จำแนกเป็นรายภาค/ส่วนงาน (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2569) ดังนี้

แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ		งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คืบจน	คงเหลือ		
ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2569		642,757,775	174,373,738	36,578,551	431,805,486		
250,000,000	ความคืบหน้าจ่ายแล้ว	ความคืบหน้าจ่ายแล้ว	ความคืบหน้าจ่ายแล้ว		224,429,922.5		
200,000,000	31 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	20 ก.ค. 69				
150,000,000	46,782,045	30,722,026	12,891,004				
100,000,000	(46.70%)	(50.63%)	(13.34 %)				
50,000,000	100,150,038	60,601,414	96,613,175	47,100,887			
0				6,694,781			
	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ยกยอดไป 2570	
ส่วนงาน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	จ่าย ก.ค.	สิงหาคม	กันยายน	ยกยอดเบิก 2570
เหนือ	17,339,862	5,177,754	14,073,185	1,647,324	16,417,334	3,984,781	42,751,466
ตะวันออกเฉียงเหนือ	114,000	854,637	4,242,696	245,000	15,155,000	0	49,982,401
ใต้	22,009,606	26,271,601	22,958,671	1,751,750	0	0	34,940,056
กลาง และตะวันตก	22,849,858	12,997,154	16,259,595	6,126,000	0	0	25,505,236
กทม. ปรีฯ ตะวันออก	10,523,950	8,712,974	18,930,453	432,400	11,629,603	2,710,000	29,654,216
สนง.พัฒนาที่อยู่อาศัย	12,635,994	6,587,294	17,595,950	2,688,530	3,898,950	0	17,135,365
สน.ริมราง (รวม ปี 66)	14,676,768		2,552,625			0	24,461,188.50
รวม	100,150,038	60,601,414	96,613,175	12,891,004	47,100,887	6,694,781	224,429,922.50

3.การปิดโครงการ บ้านมั่นคง ปี 2560 - 2568 มีโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดเพิ่มขึ้นเดือนนี้ 4 โครงการ
 จึงคงเหลือรอดปิดโครงการในเดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 440 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานแผนการทำงานและ
 ติดตามกับสำนักงานภาคดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


มิ.ย.2569	คงเหลือรอดปิดโครงการ บ้านมั่นคง ณ ก.ค.2569								ก.ค.2569
คงเหลือ	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลาง/ตท	กทม./ออก	สนง.พัฒนาฯ	ส.ริมคลอง	ส.ริมราง	รวมรอดปิด
434	67	61	80	25	137	67	1	2	440

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไร่รื้อ ภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2569 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

กรณีไฟไหม้ ไร่รื้อ ภัยพิบัติ ปี 2569

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไร่รื้อ ภัยพิบัติ ปี 2569 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 165 ครัวเรือน งบดำเนินการทั้งสิ้น 4,455,000 บาท

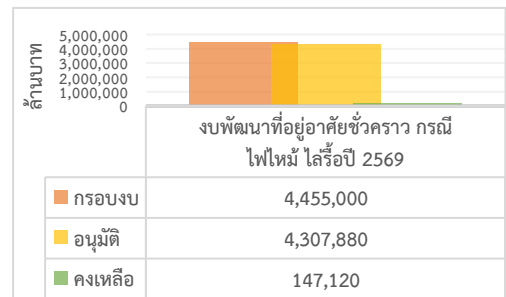

ภาพรวมงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว มีงบดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 3 ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ	งบดำเนินการยกมาปี 2569		ผลการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว ปี 2569			คงเหลือรอดำเนินการ	
	ครัวเรือน	กรอบงบ	โครงการ	ครัวเรือน	งบอนุมัติแล้ว	ครัวเรือน	งบคงเหลือ
ปีงบประมาณ 2567	-	979,155	8	73	971,550	-	7,605
ปีงบประมาณ 2568	-	221,760	3	4	81,000	-	140,760
ปีงบประมาณ 2569	165	4,455,000	38	172	4,307,880	-	147,120
รวม	165	5,655,915	49	249	5,360,430	-	295,485

หมายเหตุ : ราคินงบประมาณปี 2568 จำนวน 135,000 บาท ใช้เป็นงบสนับสนุน 5,760 บาท

สถานะงบประมาณพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว มีงบจัดสรรคงเหลือปี 2567 และปี 2568 ยกมาดำเนินการรวมกับงบประมาณปี 2569 วงเงินรวม 5,655,915 บาท มีการพิจารณาสนับสนุนชุมชน 5,360,430 บาท (คินงบปี 68 135,000 บาท) คงเหลือสนับสนุนชุมชนรออนุมัติ 295,485 บาท

2. ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไร่รื้อ ปี 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไร่รื้อ ปี 2569 จำนวน 165 ครัวเรือน จำนวนเงิน 4,455,000 บาท มีการพิจารณาอนุมัติในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 153 ครัวเรือน จำนวนเงินอนุมัติ 4,307,880 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย 3,537,000 บาท ร้อยละเบิกจ่าย 82.11 มีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายสะสม 770,880 บาท มีภาพรวมจำแนกรายภาค ดังนี้

ภาค	อนุมัติดำเนินการปี 2569				เบิกจ่าย					คงเหลือรอ เบิกจ่าย (กค.69)
	งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569		เบิกปี 2567	เบิกปี 2568	ร้อยละ งบยกมา	เบิกปี 2569	ร้อยละ เบิก	
			ครัวเรือน	จำนวน						
ภาคเหนือ	-	-	56	1,512,000	-	-	-	1,512,000	100	-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	377,550	45,000	41	1,004,880	377,550	45,000	100	594,000	59.11	410,880
ภาคใต้	324,000	-	5	135,000	324,000	-	100	135,000	100	-
ภาคกลางและตะวันตก	18,000	36,000	5	126,000	18,000	36,000	100	126,000	100	-
ภาคกทม.ปริมณฑล และตะวันออก	252,000	-	25	612,000	252,000	-	-	504,000	82.35	108,000
สนง.พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท	-	-	35	783,000	-	-	-	531,000	67.82	252,000
สน.พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สน.พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง	-	-	5	135,000	-	-	-	135,000	-	-
รวม	971,550	81,000	172	4,307,880	971,550	81,000	100	3,537,000	82.11	770,880
	รวมอนุมัติ			5,360,430	รวมเบิกจ่าย			4,589,550	-	

3. การปิดโครงการ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว ปี 2563 - 2568 ณ ก.ค.2569 มีการปิดโครงการ เพิ่มขึ้นในเดือน


กรกฎาคม 2569 จำนวน 3 โครงการ จึงมีโครงการคงเหลือรอปิด 128 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานและติดตามกับสำนักงานภาคดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ม.ย.2569	คงเหลือรอปิดโครงการ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว ณ ก.ค.2569								ก.ค.2569
คงเหลือ	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลาง/ตก	ทวม./ออก	สนง.พัฒนาฯ	ส.ริมคลอง	ส.ริมราง	รวมรอปิด
131	11	32	3	3	71	8	-	-	128

รายงานสถานะโครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ 2569 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. รายงานการดำเนินโครงการบ้านพอเพียง ปี 2569

โครงการบ้านพอเพียง ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้มีรายได้น้อย มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย จำนวน 15,634 ครัวเรือน วงเงินรวม 625,000,000 บาท แบ่งเป็น งบบริหารจัดการโครงการ 28,125,000 บาท งบดำเนินการ 596,875,000 บาท จำแนกเป็นรายภาค ดังนี้

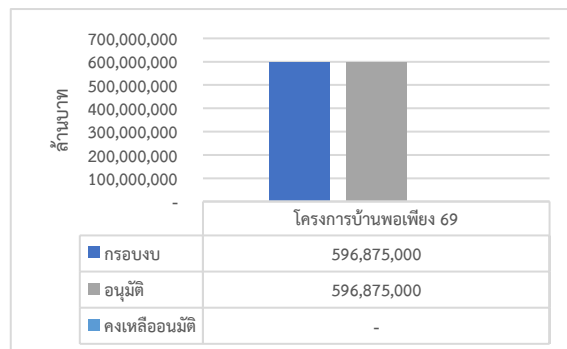

ภาค	เป้าหมายกรอบงบประมาณปี 2569			
	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	กรอบงบประมาณ
เหนือ	17	493	2,972	113,530,400
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	811	5,145	196,539,000
ใต้	14	384	2,723	104,018,600
กลางและตะวันตก	13	378	2,644	101,000,800
กทม. ปริมณฑลและตะวันออก	13	191	1,241	47,406,200
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ/ส่วนกลาง			909	34,380,000
รวม	77	2,257	15,634	596,875,000

2. ภาพรวมการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านพอเพียง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มีการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 1,770 โครงการ 17,166 ครัวเรือน ดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมาย 1,532 ครัวเรือน มีวงเงินอนุมัติ 596,875,000 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณ 570,529,658 บาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 26,345,342 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 95.59 มีผลรายภาคดังนี้

ภาค	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณา					คงเหลือจัดสรร/อนุมัติ		ผลการเบิกจ่าย		
	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	งบอนุมัติ	ครัวเรือน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
เหนือ	371	17	538	4,062	128,990,600	-681	0	126,292,963	97.91	2,697,637
ตะวันออกเฉียงเหนือ	719	20	843	5,642	198,088,800	-456	0	195,708,915	98.80	2,379,885
ใต้	181	14	359	2,787	104,018,600	-64	0	84,688,660	81.42	19,329,940
กลางและตะวันตก	300	13	378	2,868	101,000,800	-224	0	100,970,800	99.97	30,000
กทม.ปริมณฑลและตะวันออก	186	13	193	1,314	49,296,200	-23	0	48,216,140	97.81	1,080,060
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	12	-	11	484	15,139,800	-84	0	14,311,980	94.53	827,820
ส่วนกลาง	1	-	1	9	340,200	0	0	340,200	100	-
รวม	1,770	77	2,323	17,166	596,875,000	-1,532	0	570,529,658	95.59	26,345,342

3.การปิดโครงการ บ้านพอเพียง ปี 2560 – 2568 มีการปิดโครงการ เพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 5 โครงการ จึงมีโครงการคงเหลือรอปิด 258 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานแผนการทำงานและติดตามกับสำนักงานภาคดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ม.ย.2569	คงเหลือรอปิดโครงการ ณ ก.ค.2569						ก.ค.2569
คงเหลือ	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กลางและตะวันตก	กทผ.และตะวันออก	ส.พัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	รวมรอปิด
263	3	246	2	-	4	3	258
