

รายงานผลการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำเดือน ธันวาคม 2562

- ✚ โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท
- ✚ โครงการบ้านพอเพียงชนบท
- ✚ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ
- ✚ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

1) รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย


1. รายงานผลโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2563

ปีงบประมาณ 2563 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 359.83 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2563 ทั้งสิ้น 36.32 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 396.15 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 21.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 ของงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายรวมกับงบอนุมัติใหม่ ดังนั้นในปี 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในปีถัดไป จำนวน 375.10 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


ภาค	คงเหลือรอเบิกยกมา+อนุมัติ63	ภาพรวมเบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิก
ศปก.คลอง	7,633,137.00	-	7,633,137.00
ส่วนกลาง (บ้านมั่นคง)	65,680,723.00	12,885,240.00	52,795,483.00
กทม./ออก	190,367,079.00	2,416,875.00	187,950,204.00
กลาง/ตก	17,387,126.00	-	17,387,126.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	21,914,708.03	140,000.00	21,774,708.03
ใต้	27,832,391.00	110,000.00	27,722,391.00
เหนือ	65,335,006.50	5,492,905.00	59,842,101.50
รวม	396,150,170.53	21,045,020.00	375,105,150.53

กราฟแสดงภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (01 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62)

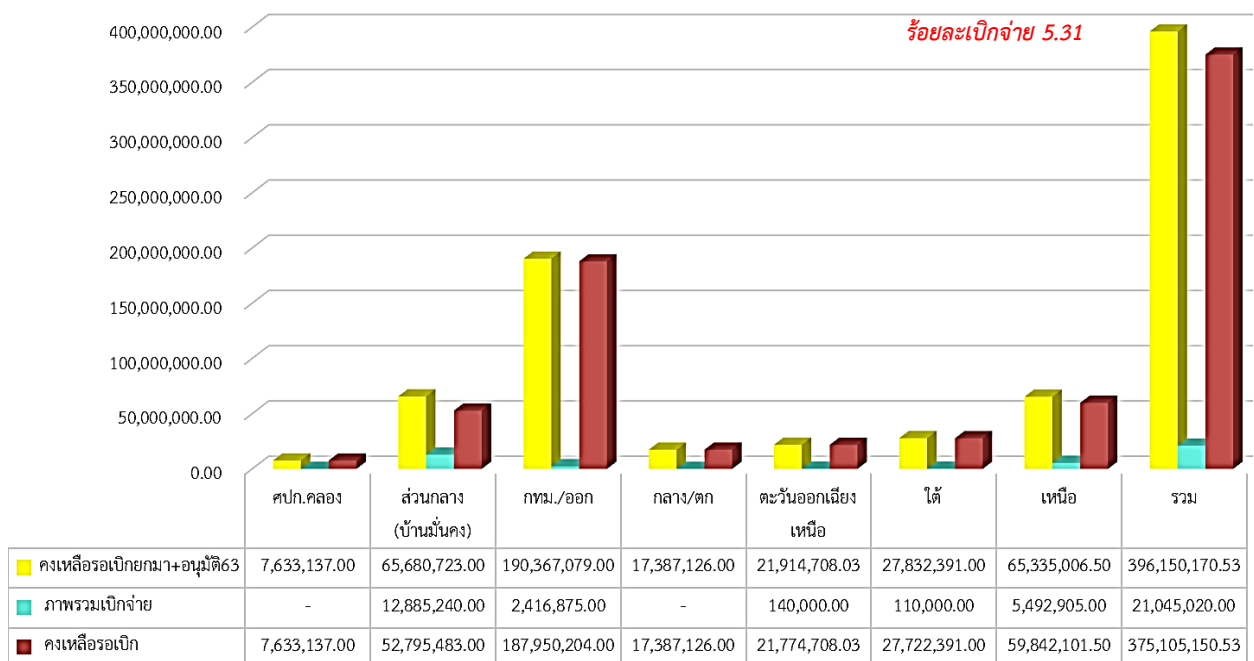


รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 19.11 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 3.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.03 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่าย ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 15.28 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้

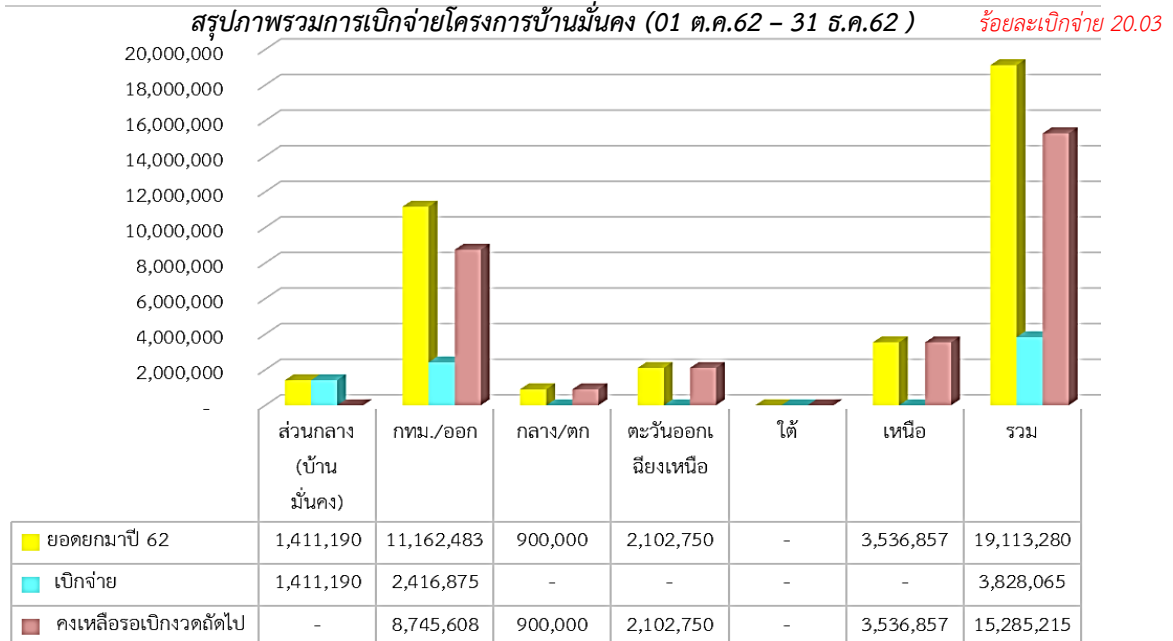


รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 113.54 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.11 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 107.74 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

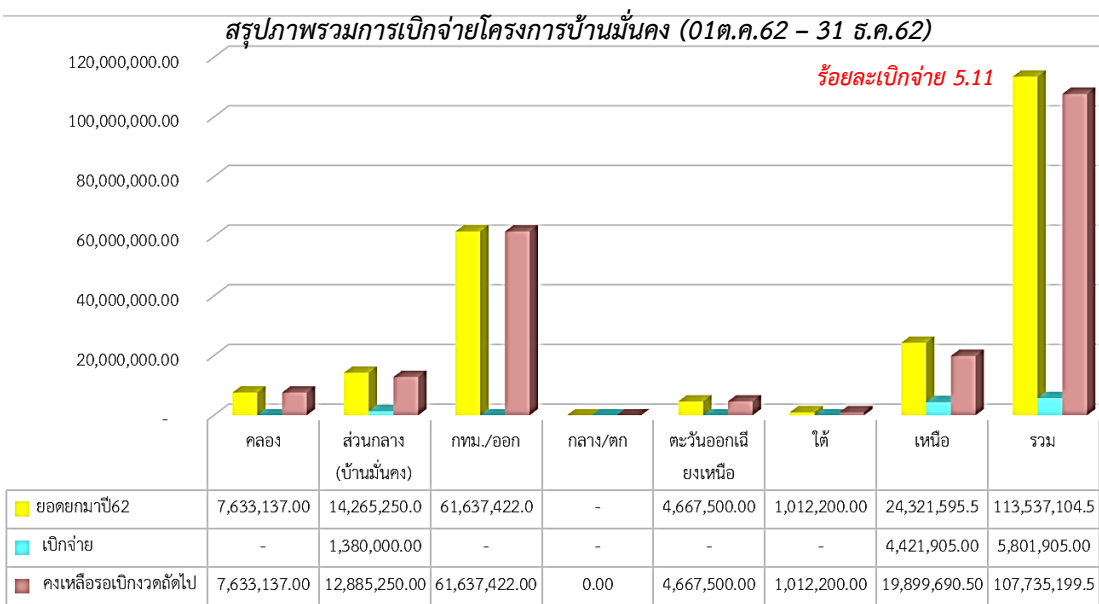

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 227.18 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.02 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 215.76 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

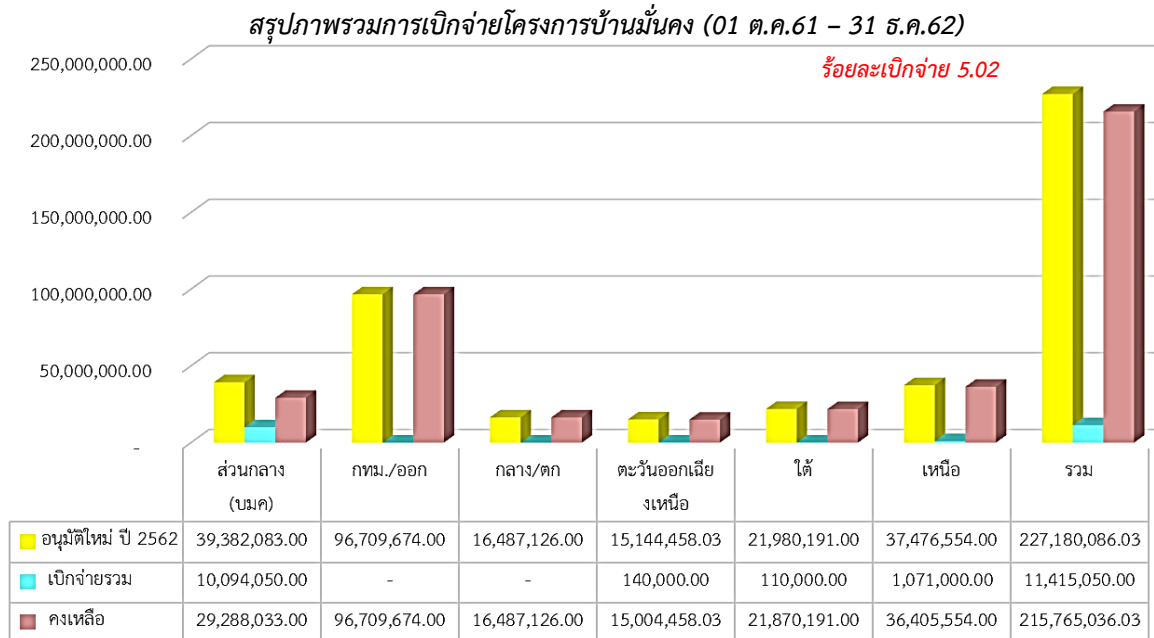

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2563 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 5,500 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และในปี 2563 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 4 โครงการ 3 จังหวัด 475 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 370 ครัวเรือน และโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชนบท จำนวน 105 ครัวเรือน งบประมาณรวม 30.82 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 5.50 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2563 รวมทั้งสิ้น 36.32 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ ปี 2563

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนที่อยู่อาศัย						อนุมัติสุทธิ	ผลการอนุมัติงบประมาณระดับเมือง		รวมอนุมัติทั้งสิ้น	รวมคงเหลือทั้งสิ้น
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครัวเรือน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน อนุมัติ	คงเหลือรอเบิกจ่าย		
เหนือ	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อีสาน	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	1,100	1	1	-	105	105	4,840,000.00	4,840,000.00	-	-	4,840,000.00	4,840,000.00
กทม/ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,100	2	2	270	-	270	20,857,500.00	20,857,500.00	-	-	20,857,500.00	20,857,500.00
กลางและตะวันตก	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ้านมั่นคงและที่ดิน	1,205	1	-	100	-	100	5,125,000.00	5,125,000.00	5,497,200	5,497,200	10,622,200.00	10,622,200.00
รวม	6,705	4	3	370	105	475	30,822,500.00	30,822,500.00	5,497,200	5,497,200	36,319,700.00	36,319,700.00

2. รายงานผลโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์) โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานภาคอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงยังไม่สามารถอนุมัติโครงการได้ ซึ่งแต่ละภาคมีเป้าหมายการดำเนินโครงการ ดังนี้

ภาค	เป้าหมาย (ครัวเรือน)	กรอบงบประมาณ สนับสนุน	ผลการดำเนินการ
ภาคเหนือ	2,200	44,955,000	ยังไม่มีผลการอนุมัติ โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	55,055,000	
ภาคใต้	2,200	44,355,000	
ภาคทวม/ออก	2,200	44,255,000	
ภาคกลาง/ตก	2,200	44,255,000	
รวม	11,500	232,875,000	

3. รายงานผลโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ

เงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ ปี 2559 -2563 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 5,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 98.13 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน 9.81 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงานทั้งสิ้น 88.32 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้รวมทั้งสิ้น 56.42 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินการ วงเงิน 31.90 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกตามปีงบประมาณ ดังตารางต่อไปนี้

ปีที่อนุมัติ	เป้าหมาย (คร.)	งบรับจากรัฐ	งบดำเนินการ	อนุมัติ		อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น	คืนงบประมาณ	งบอนุมัติสุทธิ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย
				คก	คร					
2559	1,170	21,060,000	18,954,000	34	1,581	18,570,447	1,882,000	16,688,447	15,086,447	1,602,000
2560	1,082	19,477,500	17,529,750	37	1,043	17,513,346	-	17,513,346	16,309,629	1,203,717
2561	1,200	21,600,000	19,440,000	15	1,148	19,386,600	-	19,386,600	14,868,000	4,518,600
2562	1,000	18,000,000	16,200,000	1	53	954,000	-	954,000	954,000	-
2563	1,000	18,000,000	16,200,000	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5,452	98,137,500	88,323,750	87	3,825	56,424,393	1,882,000	54,542,393	47,218,076	7,324,318

4. รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร

ผลการอนุมัติงบประมาณสะสม วงเงินรวมทั้งสิ้น 105.84 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 92.91 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 12.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.78 ของงบประมาณอนุมัติสุทธิ

ปีงบประมาณ	งบที่ได้รับอนุมัติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	คงเหลือดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	47,070,000	0.00	100
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	45,841,580	12,928,420	78
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	92,911,580	12,928,420	87.78
