

รายงานผลการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำเดือน มีนาคม 2563

- รายงานกิจกรรมสำคัญประจำเดือน
- โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท
- โครงการบ้านพอเพียงชนบท
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน




1) รายงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำเดือนมีนาคม 2563

ข่าวสารงานนโยบาย

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบริษัทที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563 น.ส.พรรณทิพย์ เพชรมาก รองผอ.พอช. เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายจตุติ ไกรฤกษ์ รมต.ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ พอช. ใน 5 เรื่อง

ข่าวสารการขับเคลื่อนงานพื้นที่

วันที่ 22 ก.พ.63 บ้านพักชั่วคราวชุมชนคลองขวาง เขตยานนาวา กทม.	สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริณชิตและตะวันออก ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลจัดทีมขบวนทำงาน วางแผนบ้านพักชั่วคราว ชุมชนคลองขวาง เขตยานนาวา กทม.
วันที่ 22 ก.พ.63, 5 มี.ค.63 และ 13 มี.ค.63 เตรียม workshop ร่วมกับแกนนำชุมชนเขตราชเทวี กทม.	สำนักงานภาคกรุงเทพฯ จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการสำรวจข้อมูลชุมชนทั้งเมืองราชเทวีให้กับตัวแทนชุมชนทั้ง 14 ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การสำรวจข้อมูลชุมชนให้กับตัวแทนชุมชน และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเครือข่ายชุมชนในลำดับถัดไป เมื่อสำรวจข้อมูลแล้วจะมีการนำข้อมูลที่ได้มาสู่กระบวนการวิเคราะห์ชุมชน สร้างแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกชุมชนในเมืองราชเทวี และนำเสนอกับหน่วยงาน กทม. ผ่านสำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคมต่อไป
วันที่ 24 ก.พ.63 และ วันที่ 7-8 มี.ค.63 เวทีพัฒนาเมืองแม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 3/2563	สนง.ภาคเหนือ สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน ลงปฏิบัติการระดับพื้นที่ จัด Workshop สำรวจเมืองแม่สอด ชุมชนอิสลาม 4 กลุ่ม ประมาณ 1,000 กว่าครัวเรือน เป้าหมายเพื่อสร้างทีมงาน คนในพื้นที่เป็นกลุ่มเชื้อชาติพม่า เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ 2-40 ปี มีบัตรประเภทต่าง ๆ พุด-เขียน พม่า/ไทย ได้ทีมเยาวชนที่พุด/เขียนไทยได้เป็นทีมสำรวจและถาม เก็บข้อมูล GPS ผ่าน app LING และรวมข้อมูลผ่าน Facebook/Messenger เพราะกลุ่มคนอิสลามไม่ใช่ Application line
วันที่ 21-23 ก.พ.63 และ 7 มี.ค.63 จัดเวทีเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนชาวแพสะแกกรัง จ.อุทัยธานี	ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ ลงพื้นที่เตรียมพัฒนาชุมชนชาวแพสะแกกรัง จ.อุทัยธานี จัดเวทีเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนชาวแพสะแกกรัง โดยได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาของชุมชนโดยใช้ GPS สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการของคนในชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโครงการ
วันที่ 4 มี.ค.63 ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและแหล่งท่องเที่ยว	คณะทำงานบ้านมั่นคงชนบทภาคเหนือ ร่วมกับพอช.ภาคเหนือ ลงพื้นที่ ต.เวียงสรวย เดินหน้าจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลเวียงสรวยและออกแบบการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

<p>ชุมชนเมืองเวียงสวาย อ.แม่สวาย จ.เชียงราย</p>	<p>ชีวิตโดยใช้ฝั้งชุมชนเป็นเครื่องมือ โดยประเมินสถานการณ์ต้นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ รวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์</p>
<p>วันที่ 5 มี.ค.63 ความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการปทุมธานีโมเดลของอาคารบ้านมั่นคงแนวสูง 3 ชั้น</p>	<p>ปัจจุบันอาคารตัวอย่างหลังแรกสร้างแล้วเสร็จและมีชาวบ้านเช่าอยู่ ส่วนอาคารหลัง 2-3 อยู่ระหว่างขึ้นโครงหลังคา โดยตัวอาคารด้านล่างถูกออกแบบให้ช่วงฤดูน้ำท่วมสามารถเป็นทางผ่านน้ำ และฤดูแล้งสามารถใช้ประโยชน์ด้านล่างได้</p>
<p>วันที่ 16-18 มี.ค. 63 การประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจากผลกระทบจากน้ำท่วมเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น</p>	<p>ทีมสถาปนิกและวิศวกรบ้านมั่นคงจากทุกภาคส่วนและภาคีสถาบันการศึกษา ร่วมปฏิบัติการเรียนรู้ ณ เมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีการประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจากผลกระทบจากน้ำท่วมเมืองบ้านไผ่ และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทั้งเมือง จัดทำแผนพัฒนาเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ โดยแนวทางจะมีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและการเช่าที่ดินรถไฟ จำนวน 163 ไร่</p>
<p>วันที่ 21 มี.ค.63 ลงพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบทบ้านห้วยม่วง จ.เชียงใหม่</p>	<p>สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายสแกน สำนักงานภาคเหนือ เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชนบทบ้านห้วยม่วง และเกิดการมีส่วนร่วมโดยสถาปนิกร่วมกับชาวชุมชนในการจัดทำแผนที่ทำมือ ออกแบบวางผัง วางระบบสาธารณูปโภคร่วมกันในพื้นที่ชุมชน</p>
	
<p>วันที่ 21 มี.ค.63 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบทชุมชนบะไ้ และบ้านตามุย จ.อุบลราชธานี</p>	<p>สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายฮักน้ำของ เพื่อติดตามหนุนเสริมการทำงานโครงการบ้านมั่นคงชนบท หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านตามุย ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องในการทำโครงการบ้านมั่นคงของเครือข่ายฯ และเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่บ้านมั่นคงฯ ลงไปสร้างความเข้าใจการจัดเก็บเอกสารบัญชี การบริหารจัดการที่ดี และให้แนวทางในการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกมิติ</p>
<p>วันที่ 22 มี.ค.63 ลงพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบทบ้านทุ่งนาเมืองและบ้านห้วยสะคาม จ.อุบลราชธานี</p>	<p>สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายฮักน้ำของ เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชนบทบ้านทุ่งนาเมืองและบ้านห้วยสะคาม โดยเป็นการทำความเข้าใจจากกลุ่มเล็กๆ ที่จะต้องช่วยกันสร้างกระแส ให้ชุมชนลุกขึ้นมาทำงานเป็นแกนหลัก สิ่งสำคัญคือการสำรวจข้อมูลทั้งที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกด้วย ระยต่อไปที่สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น จะมีการชวนทำแผนพัฒนาชุมชนทั้งตำบล</p>

ข่าวสารงานกิจกรรม/ศึกษาดูงาน

วันที่ 29 ก.พ.63 พิธีมอบบ้านภัยพิบัติที่ซ่อมสร้างเสร็จแล้ว จ.ขอนแก่น

นาวาตรี สุธรรม ระหงส์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีมอบบ้านที่ซ่อมสร้างเสร็จแล้ว ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

วันที่ 12 มี.ค.63 พิธีเปิดบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบท จ.สุราษฎร์ธานี

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ นายสุพัชร์พงษ์ วรประดิษฐ์ เป็นประธานเปิด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องผู้รับผลประโยชน์ตามโครงการ ที่ร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย หลังจากนั้นได้รับเกียรติจากท่านกำนัน ณรงค์ ยังชู มาเป็นประธานเปิดบ้านต่อ ณ ตำบลเมืองเวียง และร่วมกันซ่อมแซมบ้านโดยไม่คิดค่าแรง

วันที่ 18 มี.ค.63 ลงพื้นที่ชุมชนตาดปูน ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ การสร้างความเข้าใจ และให้ทิศทางการทำงานแก่ชุมชน เครือข่ายในพื้นที่

คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงฯ พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนตาดปูน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ทิศทางการทำงานแก่ชุมชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานบ้านมั่นคงจากชุมชน เครือข่ายที่มีรูปธรรมความสำเร็จในการพัฒนาโครงการ และสำหรับจังหวัดก้าวต่อไปของชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ คือ การจัดทีมแกนนำในพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น และภาคี จัดทำข้อมูลชุมชน/ตำบล และร่วมกันออกแบบแผนในการพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

วันที่ 20 มี.ค.63 ลงนามความร่วมมือบ้านพอเพียงชนบท จ.บึงกาฬ และภาคี ขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ 173 ครัวเรือน 23 ตำบล เป็นจังหวัดแรกของภาคอีสาน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกต อารังวงศ์สวัสดิ์ ร่วมเปิดงาน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงนามความร่วมมือบ้านพอเพียงชนบท จ.บึงกาฬ และภาคี ขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ 173 ครัวเรือน 23 ตำบล เป็นจังหวัดแรกของภาคอีสาน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกต อารังวงศ์สวัสดิ์ ร่วมเปิดงาน

วันที่ 12-13 มี.ค.63 ลงพื้นที่ อบต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตป่าฯ อุทยาน และจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงชนบท (สัญญา) ครั้งที่ 3/2563



วันที่ 12 มี.ค.63 คณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงชนบท และเจ้าหน้าที่สำนักบ้านมั่นคงฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ อบต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตป่าฯ อุทยาน ถึงแนวทางการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน หลังจากนั้นในช่วงบ่าย คณะทำงานฯ ได้เดินทางไปที่ศาลาวิถหนองฟ้า แล็บ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อฟังบรรยายสรุปสภาพปัญหาพื้นที่ โดย นายประพันธ์ ไซยนอก กำนันตำบลด่านซ้าย และสภาองค์กรชุมชนตำบลด่านซ้าย แลกเปลี่ยนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการทำงานโครงการบ้านมั่นคง และช่วงเย็นคณะทำงานฯ และผู้บริหาร สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพาลงรับประทานอาหารเย็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เพื่อหารือแนวทางใน



การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยจังหวัดเลย และร่วมกันขับเคลื่อนบ้าน
มั่นคงชนบท ให้เกิดพื้นที่รูปธรรม และ

วันที่ 13 มี.ค. 63 การประชุมคณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรอง
โครงการบ้านมั่นคงชนบท ครั้งที่ 3/2563 ณ ฟอรัวฮิลล์ รีสอร์ท
จังหวัดเลย ได้พิจารณาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มจังหวัด
จำนวน 9 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางและตะวันตก 2 กลุ่มจังหวัด ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและ
ตะวันออก 2 กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงาน ที่เกิด
คนทำงาน เกิดฐานระบบข้อมูล เกิดการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่
อาศัย ที่ตรงกับสภาพบริบทพื้นที่และแนวยุทธศาสตร์การทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มจังหวัด สุดท้ายได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อ
รวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนในเขตป่าฯ อุทยาน ที่จะต้องให้แล้วเสร็จ
ภายใน 240 วัน

**วันที่ 20 มี.ค.63 ประชุมวาระพิเศษ
เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็น 240 วัน
สำรวจพื้นที่เขตอุทยานฯ**

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคเหนือ มีการทำงานร่วมกัน
ระหว่าง NGO-คณะที่ดินฯ-สภาองค์กรชุมชน-พอช. ณ ห้องประชุม
พอช.ภาคเหนือ คือ ปักหมุดสภาฯ ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ 133 แห่ง,ปรับ
วิกฤตให้เป็นโอกาส (สถานการณ์ฝุ่นควัน-ไฟป่า-โควิด 19) : ข้อเสนอ
เรื่องความมั่นคงทางอาหาร,กลไกสภาฯที่ทำงานระดับพื้นที่,การ
ตรวจเช็คข้อมูลที่ชัดเจน

กำหนดบทบาท พอช. คือ ทำ MOU กับอุทยานฯ เพื่อเปิดช่องทำงาน
บ้านมั่นคงชนบท แต่ไม่ควรไปตอบสนองต่อกระบวนการสำรวจข้อมูล
หรือผลหลัง 240 วัน/แยกประเด็น งานที่ พอช.ต้องทำ กับ ประเด็น
การเคลื่อนของขบวนที่ดินและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

ข้อเสนอจังหวัดกาว 1) สังเคราะห์เรื่อง พรบ.อุทยานฯใหม่ ,วิเคราะห์
สถานการณ์,ทำสื่อที่เข้าใจง่าย,แนวทางข้อเสนอ 2) เวทีสร้างความ
เข้าใจภาคเหนือ 3) เช็คสภาพพื้นที่,บทบาทสภาฯ,ความสัมพันธ์กับ
อุทยานฯ และวางแนวทางการทำงานร่วม 4) ร่างเนื้อหา MOU และ
ข้อเสนอที่นำไปสู่การปฏิบัติ 5) กลไกเคลื่อน คือ ขบวนที่ดิน กับ สภา
องค์กรชุมชน



2) รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย


1. รายงานผลโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2563

ปีงบประมาณ 2563 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 359.83 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2563 รวม 93.29 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่าย 453.12 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณรวม 49.31 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณ 29.27 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในปีถัดไป จำนวน 374.54 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สำนักงานภาค	คงเหลือรอเบิกยกมา+อนุมัติใหม่63	ภาพรวมการเบิกจ่าย	คืนงบประมาณ	คงเหลือรอเบิกจ่าย
สำนักพัฒนาริมคลองฯ	7,633,137.00	-	-	7,633,137.00
สำนักบ้านมั่นคงฯ	91,529,903.00	23,647,380.00	11,407,450.00	56,475,073.00
กทม.และตะวันออก	210,022,579.00	14,441,219.00	5,972,110.00	189,609,250.00
กลาง และตะวันตก	18,567,126.00	-	-	18,567,126.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	25,414,708.03	1,623,770.00	-	23,790,938.03
ใต้	30,732,391.00	2,567,500.00	-	28,164,891.00
เหนือ	69,227,006.50	7,027,230.00	11,895,901.00	50,303,875.50
รวม	453,126,850.53	49,307,099.00	29,275,461.00	374,544,290.53

กราฟแสดงภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (01 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63)

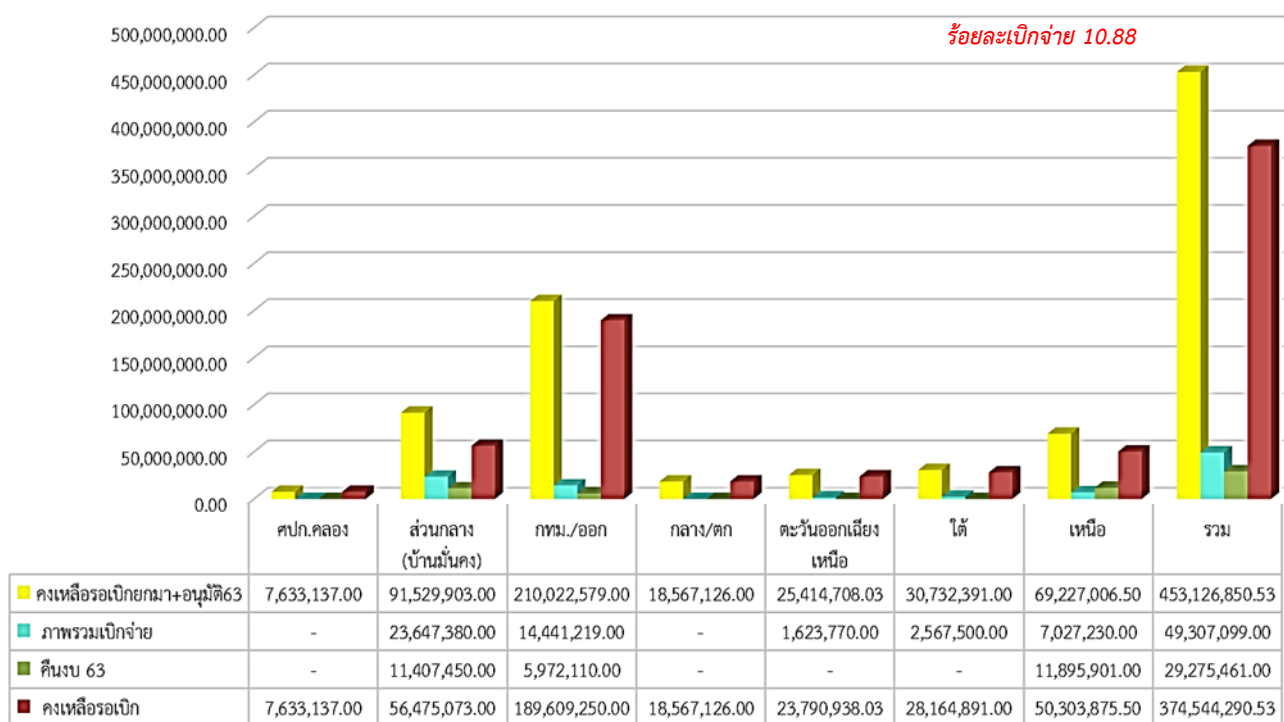


รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายมาจากปี 2562 จำนวน 19.11 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ 5.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.06 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่าย ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณจำนวน 2.77 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 10.98 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้

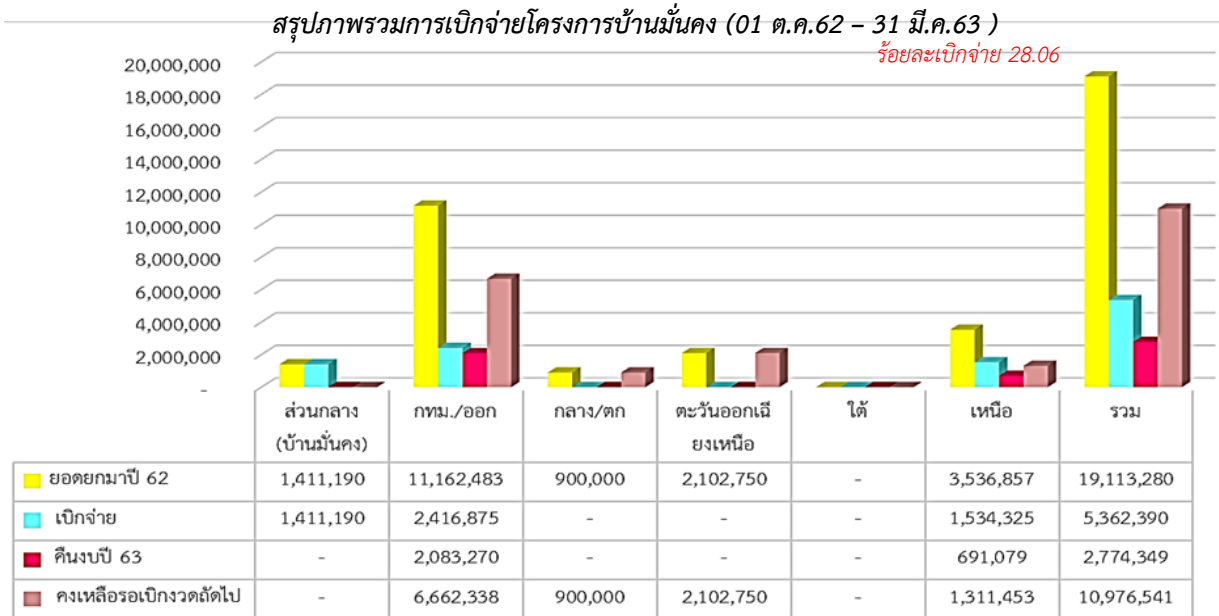


รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายมาจากปี 2562 จำนวน 113.54 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณรวม 8.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.83 ของงบประมาณเบิกจ่าย ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณ 3.89 ล้านบาท จำนวน คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 101.27 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

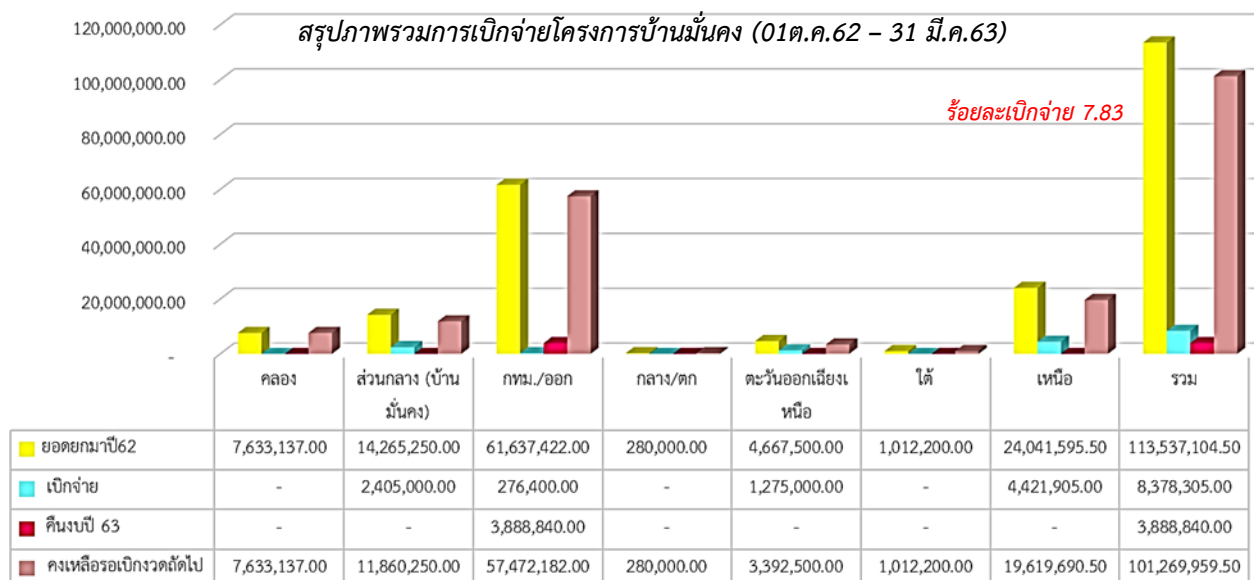

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายจ่ายปี 2562 จำนวน 227.18 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 26.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.41 ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณจำนวน 22.61 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 177.63 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

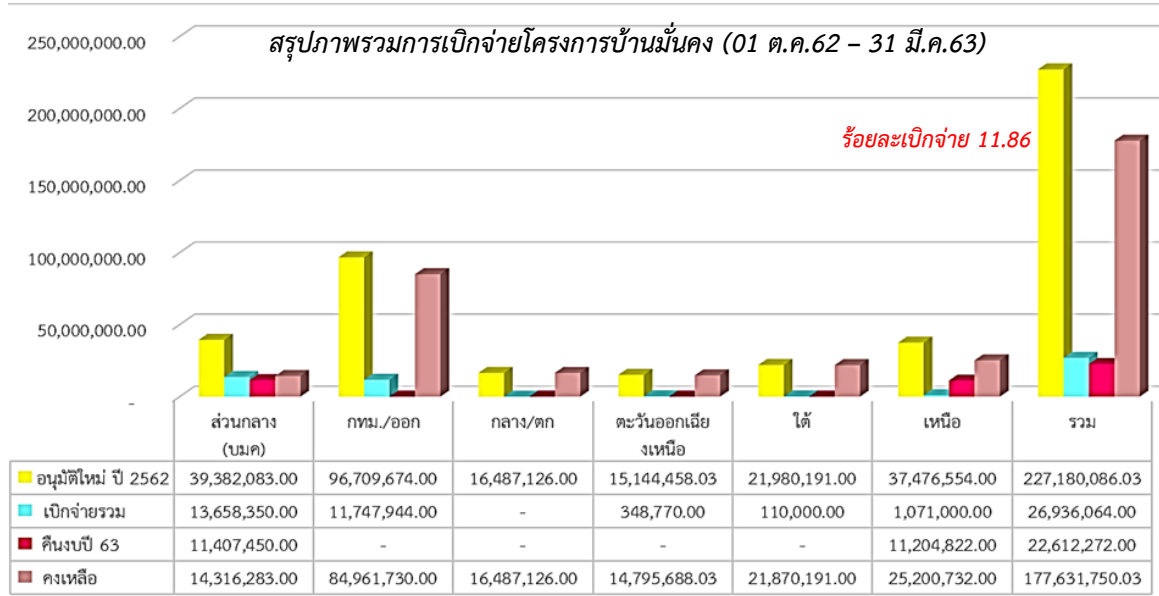

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2563 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 5,500 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และในปี 2563 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 28 โครงการ 7 จังหวัด 475 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 370 ครัวเรือน และโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชนบท จำนวน 105 ครัวเรือน งบประมาณรวม 58.03 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 35.26 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2563 รวม 93.29 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 8.63 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 84.66 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ ปี 2563

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนที่อยู่อาศัย						เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ผลการอนุมัติงบประมาณพัฒนาชุมชนเมือง				อนุมัติรวม	คงเหลือ
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม (คร)	จำนวนเงิน			กรอบงบ	จำนวนเงินอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย		
เหนือ	1,100	5	-	-	-	-	2,172,000	0.00	2,172,000.00	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	4,172,000	4,172,000
อีสาน	1,100	5	-	-	-	-	1,500,000	0.00	1,500,000.00	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	3,500,000	3,500,000
ใต้	1,100	4	1	-	105	105	5,740,000	2,457,500.00	3,282,500.00	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	7,740,000	5,282,500
กทม/ตะวันออก	1,100	9	5	270	-	270	40,513,000	0.00	40,513,000.00	2,000,000	-	0	-	40,513,000	40,513,000
กลางและตะวันตก	1,100	3	-	-	-	-	900,000	0.00	900,000.00	2,000,000	-	0	-	900,000	900,000
บ้านมั่นคงและที่ดิน	1,205	2	1	100	-	100	7,206,180	0.00	7,206,180.00	56,485,195	29,265,200	6,172,840	23,092,360	36,471,380	30,298,540
รวม	6,705	28	7	370	105	475	58,031,180	2,457,500.00	55,573,680.00	66,485,195	35,265,200	6,172,840	29,092,360	93,296,380	84,666,040

2. รายงานผลโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวน 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนองค์กรชุมชนได้ 68 จังหวัด 1,203 ตำบล 1,378 โครงการ 10,840 ครัวเรือน วงเงินรวม 205.42 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 104.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.68 ของงบประมาณอนุมัติ คงเหลือรอเบิกจ่าย 101.31 ล้านบาท รายละเอียดแยกภาคได้ตามตาราง ดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติ					เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน			
กทม./ตะวันออก	2,200	44,255,000	184	14	178	2,293	44,255,000	31,644,859	12,610,141	71.51
กลาง/ตะวันตก	2,200	44,255,000	246	13	233	2,421	44,255,000	35,292,406	8,962,594	79.75
ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	55,055,000	430	12	313	1,604	31,832,294	-	31,832,294	-
ใต้	2,200	44,355,000	151	14	133	2,221	44,355,000	28,916,883	15,438,117	65.19
เหนือ	2,200	44,955,000	367	15	346	2,301	40,720,000	8,243,300	32,476,700	20.24
รวม	11,500	232,875,000	1,378	68	1,203	10,840	205,417,294	104,097,448	101,319,846	50.68

3. รายงานผลโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ

เงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ ปี 2559 -2563 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวม 5,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 98.13 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน 9.81 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงาน 88.32 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้รวม 63.42 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงาน วงเงิน 24.89 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณวงเงิน 2.51 ล้านบาท และคืนครัวเรือนจำนวน 149 ครัวเรือน คงเหลืองบประมาณอนุมัติสุทธิ 60.91 ล้านบาท ครัวเรือนดำเนินการจริง 4,065 ครัวเรือน เบิกจ่ายรวม 53.89 ล้านบาท และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 7.01 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกตาม ปีงบประมาณ ดังตารางต่อไปนี้

ปีที่อนุมัติ	เป้าหมาย (คร.)	งบรับจากรัฐ	งบดำเนินการ	อนุมัติ		อนุมัติงบประมาณ	คืนงบประมาณ	งบอนุมัติสุทธิ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย
				กก	คร					
2559	1,170	21,060,000	18,954,000	34	1,581	18,570,447	1,882,000	16,346,447	16,346,447	-
2560	1,082	19,477,500	17,529,750	37	1,043	17,513,346	-	17,513,346	16,363,629	1,149,717
2561	1,200	21,600,000	19,440,000	15	1,148	19,386,600	876	19,386,600	19,043,724	324,000
2562	1,000	18,000,000	16,200,000	11	442	7,956,000	288,000	2,502,000	2,142,000	5,526,000
2563	1,000	18,000,000	16,200,000	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5,452	98,137,500	88,323,750	97	4,214	63,426,393	2,512,876	56,090,393	53,895,800	7,017,717

4. รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร

ผลการอนุมัติงบประมาณสะสม วงเงินรวมทั้งสิ้น 105.84 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 96.86 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 8.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.52 ของงบประมาณอนุมัติสุทธิ

ปีที่อนุมัติ	งบรับจากรัฐ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	งบดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	47,070,000	-	100
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	49,795,790	8,974,210	84.73
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	96,865,790	8,974,210	91.52

.....

.....

.....
