

**รายงานสถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  
เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566**

**① งบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง**

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2566 มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขต (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 7,271 ครัวเรือน จำนวนเงิน 273,252,318 บาท ซึ่งการดำเนินงานในปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณระหว่างปี จำนวน 131 ครัวเรือน จำนวนเงิน 17,907,664 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 366 ครัวเรือน 54,877,950 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 45,080,055 บาท ส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2566 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 229,143,585 บาท รายละเอียดภาพรวมโครงการและสถานะโครงการ ดังนี้

ตารางภาพรวมการอนุมัติ-เบิกจ่าย

โครงการ/พื้นที่	ณ 30 ก.ย.2565		ดำเนินการปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66)							คงเหลือ ณ 30 ก.ย.2566
	งบประมาณ คงเหลือรอเบิกจ่าย	ครัวเรือน	คร. อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณ ระหว่างปี	คืนงบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1.คลองลาดพร้าว	39,706,858.00	3,300	31	363	2,968	1,422,646.00	54,364,950.00	-	-	24,193,162.00
2.คลองเปรม	233,545,460.00	3,971	100	3	4,068	16,485,018.00	513,000.00	45,080,055.00	-	204,950,423.00
<b>รวม</b>	<b>273,252,318.00</b>	<b>7,271</b>	<b>131</b>	<b>366</b>	<b>7,036</b>	<b>17,907,664.00</b>	<b>54,877,950.00</b>	<b>45,080,055.00</b>	<b>15.51</b>	<b>229,143,585.00</b>

**② รายงานสถานะการอนุมัติและเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566**

**1. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560-2566**

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2566 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 3,300 ครัวเรือน 39,706,858 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 การดำเนินงานชุมชนริมคลองลาดพร้าวในปี 2566 มีการคืนโครงการ/ยกเลิกครัวเรือน 363 ครัวเรือน และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 31 ครัวเรือน รวมดำเนินการ 2,968 ครัวเรือน จำนวนเงินคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 24,192,462 บาท ดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.2565		คลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566							คงเหลือ ณ 30 ก.ย.2566	
	งบประมาณ คงเหลือ	ครัวเรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติ ระหว่างปี	คืนง/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย		ร้อยละ
เขตสายไหม	-	905			905			700	-	-	-
เขตดอนเมือง	-	-			-				-	-	-
เขตหลักสี่	-	533			533				-	-	-
เขตบางเขน	5,082,417	469		63	406		9,683,800	5,126,800	-	-	525,417
เขตจตุจักร	18,190,264	736	31		767	1,422,646			-	-	19,612,910
เขตห้วยขวาง/วังทองหลาง	16,434,177	657		300	357		44,681,150	32,301,108	-	-	4,054,135
<b>รวม</b>	<b>39,706,858</b>	<b>3,300</b>	<b>31</b>	<b>363</b>	<b>2,968</b>	<b>1,422,646</b>	<b>54,364,950</b>	<b>37,428,608</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,192,462</b>

หมายเหตุ คืนง 700 บาท เข้าเป็นงบจัดสรรคงเหลือ จึงคงเหลือรอเบิกจ่าย 24,192,462 บาท

สรุปโครงการคลองลาดพร้าวที่ดำเนินการปี 2566 โดยมีโครงการ/ชุมชน/งบประมาณคงเหลือจำนวน 10 โครงการ 10 องค์กร 596 ครัวเรือน มีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวนเงิน 24,192,462 บาท

## 2. สถานะงบประมาณชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณปี 2561-2566

2.1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2561-2562 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 927 ครัวเรือน 4,735,000 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2566 มีการคืนโครงการ/ยกเลิก ครัวเรือน 3 ครัวเรือน และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 3 ครัวเรือน จำนวนเงิน 479,394 บาท รวมดำเนินการ 927 ครัวเรือน จำนวนเงินรวม 5,214,394 บาท ดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.2565		งบประมาณปี 2561-2562 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ ณ 30 ก.ย.2566
	งบประมาณ คงเหลือ	ครัวเรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบ ระหว่างปี	คืนงบ/ ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
จังหวัดปทุมธานี	4,735,000	344	-	-	344	-	-	-	-	-	4,735,000
เขตจตุจักร	-	583	3	3	583	479,394	441,000	441,000	-	-	479,394
รวม	4,735,000	927	3	3	927	479,394	441,000	441,000	-	-	5,214,394

สรุปโครงการคลองเปรมประชากรใช้งบประมาณปี 2561 โดยมีโครงการ/ชุมชน/งบประมาณคงเหลือ จำนวน 2 โครงการ 2 องค์กร 100 ครัวเรือน คงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวนเงิน 5,214,394 บาท

2.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563-2566 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 3,044 ครัวเรือน จำนวนเงิน 228,810,460 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 การดำเนินงานในปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 97 ครัวเรือน รวมดำเนินการ 3,141 ครัวเรือน จำนวนเงิน 245,295,018 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 45,080,055 บาท มีงบคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 200,215,423 บาท ดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.2565		งบประมาณปี 2563 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ ณ 30 ก.ย.2566
	งบประมาณ คงเหลือ	ครัวเรือน	คร. อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบ ระหว่างปี	คืนงบ/ ยกเลิก	รับโอน เงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตดอนเมือง	103,779,720	1,311	55	-	1,366	8,222,500	-	-	15,283,302		96,718,918
เขตหลักสี่	94,559,655	1,246	42	-	1,288	6,431,996	-	-	26,484,375		74,507,276
เขตจตุจักร	3,750	27	-	-	27	-	513,000	513,000	3,750		-
จังหวัดปทุมธานี	30,467,335	460	-	-	460	1,351,128	-	-	3,308,628		28,509,835
รวม	228,810,460	3,044	97	-	3,141	16,005,624	513,000	513,000	45,080,055	18.41	199,736,029

สรุปโครงการคลองเปรมประชากรใช้งบประมาณปี 2563 โดยมีโครงการ/ชุมชน/งบประมาณคงเหลือ จำนวน 20 โครงการ 20 องค์กร 3,141 ครัวเรือน มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวนเงิน 199,736,029 บาท

2.3 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2564 มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน 1,351,128 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดแล้ว ดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.2565		งบประมาณปี 2564 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ ณ 30 ก.ย.2566	
	งบประมาณ คงเหลือ	ครัวเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
จังหวัดปทุมธานี	-	-	-	-	-	1,351,128	-	-	-	1,351,128	100	-
รวม	-	-	-	-	-	1,351,128	-	-	-	1,351,128		-

สรุปโครงการคลองเปรมประชากรใช้งบประมาณปี 2564 โดยมีโครงการ/ชุมชน/งบประมาณคงเหลือ จำนวน 1 โครงการ 1 องค์กร - ครัวเรือน มีการเบิกจ่ายงบ สผ.จำนวนเงิน 1,351,128 บาท


2.4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรปี 2565-2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ยังไม่มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ

### ③ ผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

1. **คลองลาดพร้าว** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ดำเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ 7 เขต คือ พื้นที่ 1 เขตสายไหม 1,454 ครัวเรือน พื้นที่ 2 เขตหลักสี่และดอนเมือง 1,356 ครัวเรือน พื้นที่ 3 เขตบางเขน 1,469 ครัวเรือน พื้นที่ 4 เขตจตุจักร 1,283 ครัวเรือน และพื้นที่ 5 เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 1,507 ครัวเรือน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 35 ชุมชน 3,553 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.26 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น


- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,331 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 67 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 155 ครัวเรือน

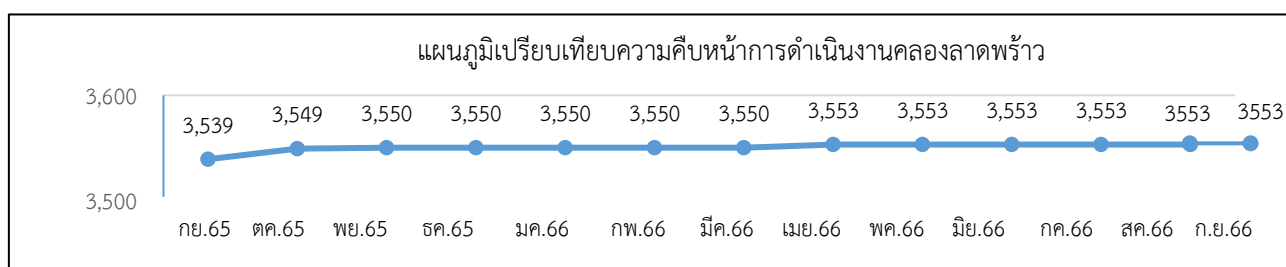

2. **คลองเปรมประชากร** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) เมื่อมิถุนายน 2561 คือ มีผู้รुकู้ลำน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 16 ชุมชน 1,503 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.54 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,034 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 368 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 101 ครัวเรือน

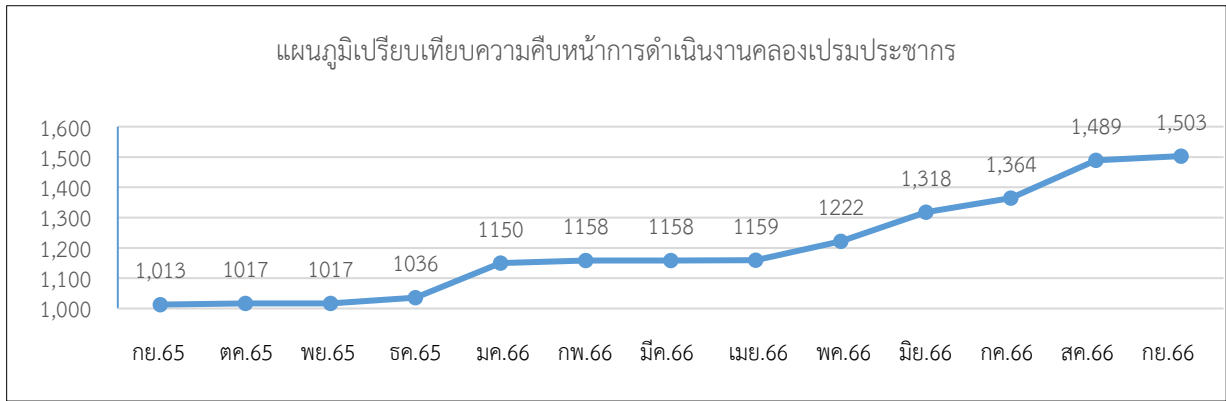

**การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร**

**คลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อ**  
7,069 ครัวเรือน  
50 ชุมชน 7 พื้นที่

- สายไหม : 10 ชุมชน 1,454 ครัวเรือน
- ดอนเมือง : 1 ชุมชน 370 ครัวเรือน
- หลักสี่ : 5 ชุมชน 987 ครัวเรือน
- บางเขน : 8 ชุมชน 1,469 ครัวเรือน
- จตุจักร : 11 ชุมชน 1,283 ครัวเรือน
- ห้วยขวาง : 14 ชุมชน 1,453 ครัวเรือน
- วังทองหลาง : 1 ชุมชน 53 ครัวเรือน

**คลองเปรมประชากร**  
6,386 ครัวเรือน  
38 ชุมชน 4 พื้นที่

- จตุจักร : 5 ชุมชน 621 ครัวเรือน
  - หลักสี่ : 13 ชุมชน 2,248 ครัวเรือน
  - ดอนเมือง : 14 ชุมชน 2,542 ครัวเรือน
  - ต.หลักหก จ.ปทุมธานี : 6 หมู่ 929 ครัวเรือน
- \*\* ยังรับรองสิทธิไม่ครบทุกชุมชน \*\*



**④ สรุปปัญหา/ข้อติดขัดการดำเนินงานโครงการ**

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1. ผู้ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ ไม่รื้อย้ายบ้านเดิม มีกลุ่มแกนนำต่อต้านโครงการให้ข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริง เช่น ที่ดินริมคลองไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ และสามารถออกโฉนดได้ การรื้อย้ายบ้านเดิมจะต้องได้รับความชัดเจนจากภาครัฐ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความลังเลไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการ ซึ่งในบางชุมชนมีการรวมตัวปิดล้อมพื้นที่งานก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถชี้แจงสร้างความเข้าใจและก่อสร้างตามแผนงานได้	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธนารักษ์ชี้แจงเรื่องขอบเขตที่ดินราชพัสดุ กรมที่ดินชี้แจงยืนยันเรื่องการไม่สามารถออกโฉนดพื้นที่ริมคลอง โดยทุกหน่วยงานให้ข้อมูลกับประชาชนตรงกัน เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และพิจารณาการใช้กฎหมายเพิ่มเติม

## ปัญหา/อุปสรรค

## แนวทางการแก้ไข

2. ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนงานของชุมชน

การดำเนินการของหน่วยงานร่วมบูรณาการล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดร่วมกัน อาทิ การอนุญาตให้เช่าที่ดิน และก่อสร้างบ้านของกรมธนารักษ์ การลงพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ และการอนุญาตก่อสร้างเรือนโดยกรมชลประทาน ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน

3. บางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดดำเนินการ ไม่ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงการ เนื่องจากขาดความมั่นใจในแผนการก่อสร้างเรือนของสำนักการระบายน้ำ กทม.

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงาน และกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบเวลา ซึ่งจะทำให้การรื้อย้ายบ้านของประชาชนและการก่อสร้างเรือนดำเนินการไปได้ตามแผนงาน

3. สำนักการระบายน้ำ กทม. ดำเนินการก่อสร้างเรือน และชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
