



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
COMMUNITY ORGANIZATIONS
DEVELOPMENT INSTITUTE

รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 - 1.1 ความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด
 - 1.2 การประชุมเพื่อบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่าง 9 หน่วยงาน
 - 1.3 ความคืบหน้าการสร้างบ้านผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม บ้านห้วยขาบ จังหวัดน่าน
 - 1.4 ประสานความร่วมมือภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบท จ.นครราชสีมา
 - 1.5 ประชุมหารือแนวทางการศึกษาผลการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นระบบทั้งเมืองและการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ของโครงการบ้านมั่นคง
2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัย
 - 2.1 โครงการบ้านมั่นคง
 - 2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
 - 2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไส้ร้อย ภัยพิบัติ
 - 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตามทิศทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ทั้งเมืองและชนบท ด้วยการดำเนินแก้ไขที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักงานมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

1.1 ความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน มีการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด โดยมีมติให้คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด โดยมีความคืบหน้าจากสำนักงานภาค 5 ภาค ดังนี้

ภาค	จังหวัดที่จัดส่งแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ กยผ.แล้ว	รับรองแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ	ร่างแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วเตรียมเสนอรับรอง	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
1. เหนือ 15 จังหวัด	5 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก ลำพูน	4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน น่าน	5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย	1 จังหวัด ได้แก่ พะเยา
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด	8 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา	3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, นครพนม เลย	4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ยโสธร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด	5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ อำนาจเจริญ, บุรีรัมย์ หนองคาย หนองบัวลำภู
3. กลางและตะวันตก 16 จังหวัด	13 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท อุดรธานี นครปฐม นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี		2 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี	1 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี
4. กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก 12 จังหวัด	8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ปทุมธานี	1 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี	2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ตราด	1 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
5. ใต้ 14 จังหวัด	7 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี	5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ยะลา พังงา นราธิวาส ตรัง	2 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี กระบี่	
รวมทั้งสิ้น	41 จังหวัด	13 จังหวัด	15 จังหวัด	8 จังหวัด

1.2 การประชุมเพื่อบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่าง 9 หน่วยงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการพรหมทิพย์ เพชรมาก พร้อมด้วยผู้แทนสำนักบ้านมั่นคง และผู้แทนจากสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค เข้าร่วมการประชุมระหว่างหน่วยงาน หลังจากได้บันทึกความร่วมมือ “การบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่าง 9 หน่วยงาน” ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ และแก้ไขข้อติดขัดของการพัฒนาที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

(1) การหารือเพื่อคลี่คลายปัญหาข้อติดขัด จากการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปี 2561 จำนวน 16 พื้นที่ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาการติดตั้งไฟฟ้า ประปา การปรับพื้นที่ ล่าช้า รวมถึงปัญหาข้อติดขัดในการย้ายเข้าอยู่อาศัยของกลุ่มเกษตรกรบางราย โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อจากนี้ หลังจากหน่วยงานได้รับทราบแล้ว จะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

(2) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปี 2562 จะเน้นเรื่องความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน จนไปถึงการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติ

(3) แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยใช้โครงการบ้านมั่นคงชนบทเป็นเครื่องมือ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เบื้องต้นจำนวน 15 พื้นที่ 9 จังหวัด

(4) รูปแบบกลไกของการทำงานร่วมระหว่าง 9 หน่วยงาน จะมีรูปแบบการทำงานแบบทวิ และมีกลไกการประชุม รายงานผลให้รับทราบร่วมกันในทุก 3 เดือน

(5) ประเด็นการแลกเปลี่ยนพิจารณาอื่นๆ อาทิ การจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ การให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่มากขึ้น การตั้งกลไกระดับจังหวัด เพื่อประสานการทำงานในระดับพื้นที่ต่อไป และการนำเสนอแผนเรื่องการจัดการน้ำโดยกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินของสถาบันน้ำนิเทศศาสตร์คุณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



1.3 ความคืบหน้าการสร้างบ้านผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม บ้านห้วยขาบ จังหวัดน่าน

ความคืบหน้าในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ อำเภอป่าเกอ๋อ จังหวัดน่าน หลังจากมีการลงเสาเอกไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 แล้วนั้นได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรายละเอียดดังนี้

- 1) การพัฒนาระบบประปาชั่วคราวดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
- 2) การดำเนินงานเรื่องของการปรับถนนจุดที่มีความลาดชันขณะนี้ได้ทำการปรับตัดหน้าดินและวางท่อในการยกระดับถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3) การทำถนนคอนกรีต คสล.เข้าพื้นที่ตั้งชุมชนใหม่จะเริ่มดำเนินการเทคอนกรีต ในวันที่ 7 - 20 มีนาคม 2562 ในระหว่างนี้ชุมชนได้ดำเนินการปรับพื้นที่สนามกีฬาของหมู่บ้าน และเตรียมแผนการก่อสร้างห้องน้ำ



1.4 ประสานความร่วมมือภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบท จ.นครราชสีมา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประทีป อัจฉรา ตั้งมติธรรม ณ โครงการบ้านมั่นคงชนบทในแปลงที่ดิน ส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา (ตำบลครบุรีและตำบลปากช่อง)



โดยวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อจะดูการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบท และความพร้อมและความต้องการของพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พื้นที่ปากช่อง (จำนวน 85 ครัวเรือน) เยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจาก ส.ป.ก. บ้านที่สร้างแล้วเสร็จด้วยงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก พอช. แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ช่องทางการจำหน่ายและรายได้ จนไปถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องการรดน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ

พื้นที่ครบุรี (จำนวน 90 ครัวเรือน) ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขาดน้ำ ทั้งน้ำดื่ม น้ำใช้ในครัวเรือน และใช้เพื่อเกษตรกรรม จึงส่งผลต่อการทำการเกษตร และรายได้ของแต่ละครัวเรือน

เบื้องต้นแนวทางการสนับสนุนของมูลนิธิประทีป อัจฉราตั้งมติธรรม ได้แก่ การให้เครื่องผลิตอิฐบล็อกแก่ชุมชน การสนับสนุนงบประมาณสำหรับครอบครัวที่แก่ชรา หรือมีเด็ก ซึ่งมีงบประมาณในการสร้างบ้านไม่เพียงพอ และจะให้สถาปนิกจากมูลนิธิมาช่วยออกแบบระบบน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน และเพื่อการเกษตร

1.5 ประชุมหารือแนวทางการศึกษาผลการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นระบบทั้งเมืองและการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ของโครงการบ้านมั่นคง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 303 พอช.



สำนักบ้านมั่นคง ได้จัดประชุมแนวทางการศึกษาผลการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นระบบทั้งเมือง และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ของโครงการบ้านมั่นคง ได้วางแผนการศึกษาในปีนี้ร่วมกับ ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบุลย์ และคณะผู้วิจัย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมคนรุ่นใหม่ บ้านมั่นคง เพื่อแลกเปลี่ยนกรอบเนื้อหา วิธีการศึกษา และเครื่องมือในการศึกษาผลการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นระบบทั้งเมือง และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการบ้านมั่นคง โดยมีแผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562

2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาคูหาที่อยู่อาศัย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เมืองและชนบท) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จำนวน 4 โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีผลการดำเนินการดังนี้

2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงปี 2562

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 17 โครงการ 9 จังหวัด 1,272 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาคูหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 787 ครัวเรือน โครงการการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยชนบท 485 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 69.49 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 2.8 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 72.29 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2562


ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ						ผลการอนุมัติงบประมาณรายเมือง				
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครัวเรือน	จำนวนเงิน	กรอบงบ	โครงการ	จำนวนเงิน อนุมัติ	คงเหลือ งบดำเนินการ	รวมอนุมัติทั้งสิ้น
เหนือ	1,100	1	1	-	60	60	1,320,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	1,320,000.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,154	-	-	-	-	-	0.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00
ใต้	1,149	5	2	267	23	290	13,529,821.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	13,529,821.00
กทม/ตะวันออก	1,800	3	2	498		498	35,980,500.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	35,980,500.00
กลางและตะวันตก	1,100	1	1	22		22	1,590,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	1,590,000.00
บ้านมั่นคง	1,500	7	3	-	402	402	17,069,567.00	34,000,000.00	3	2,800,000.00	31,200,000.00	19,869,567.00
รวม	7,803	17	9	787	485	1,272	69,489,888.00	44,000,000.00	3	2,800,000.00	41,200,000.00	72,289,888.00

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายยกมา จากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2562

ปีงบประมาณ 2562 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 506.70 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2562 ทั้งสิ้น 72.29 ล้าน

บาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 578.99 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 20.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.47 ของงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ม.ค.62)

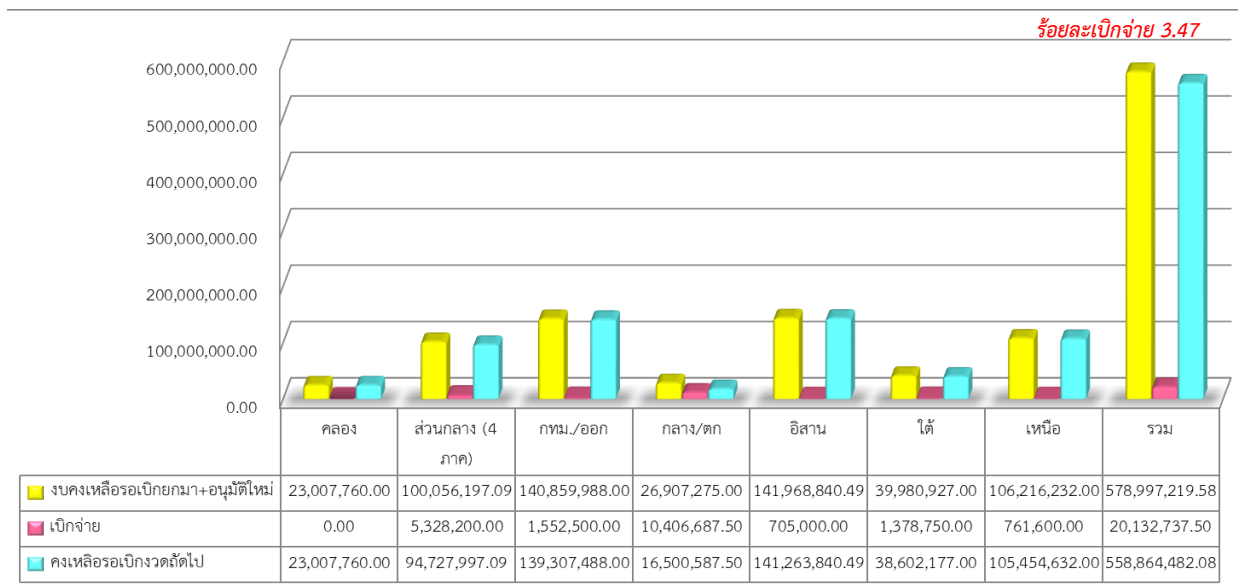

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการเดิม 2556-2559) (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ) มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2561 จำนวน 134.80 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายแล้ว 0.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย ระหว่างดำเนินโครงการมีการคืนงบประมาณ จำนวน 77.95 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 56.08 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 28 ก.พ.62)

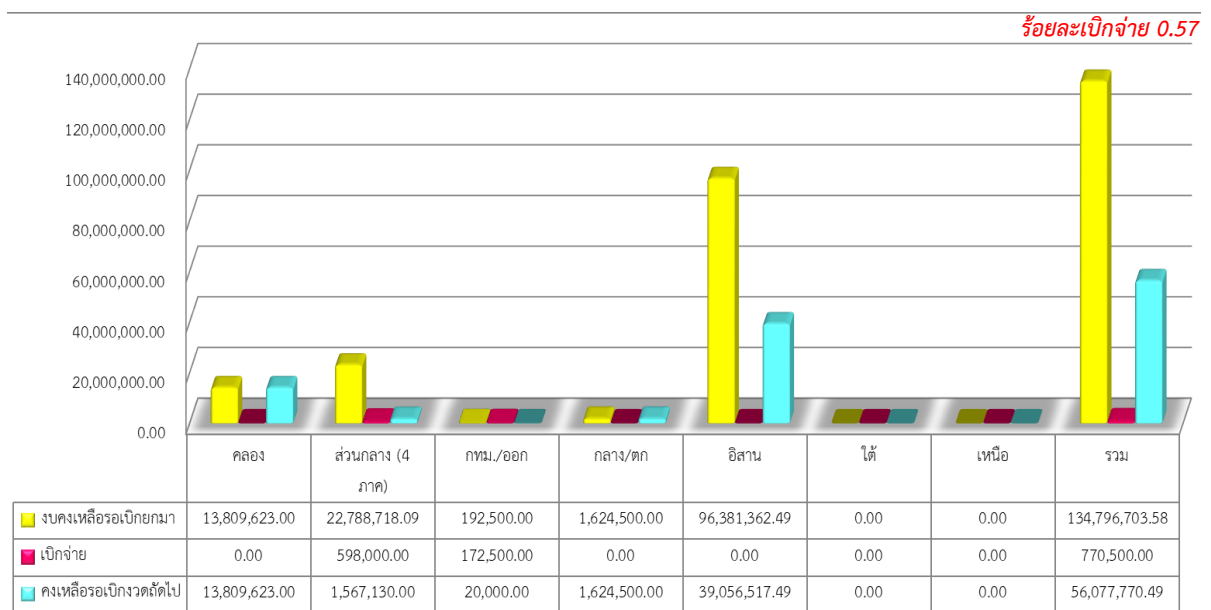

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 60.52 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 2.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.87 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่ายคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 57.36 ล้านบาท ระหว่างปีมีการค้ำงบประมาณจำนวน 0.81 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 28 ก.พ.62)

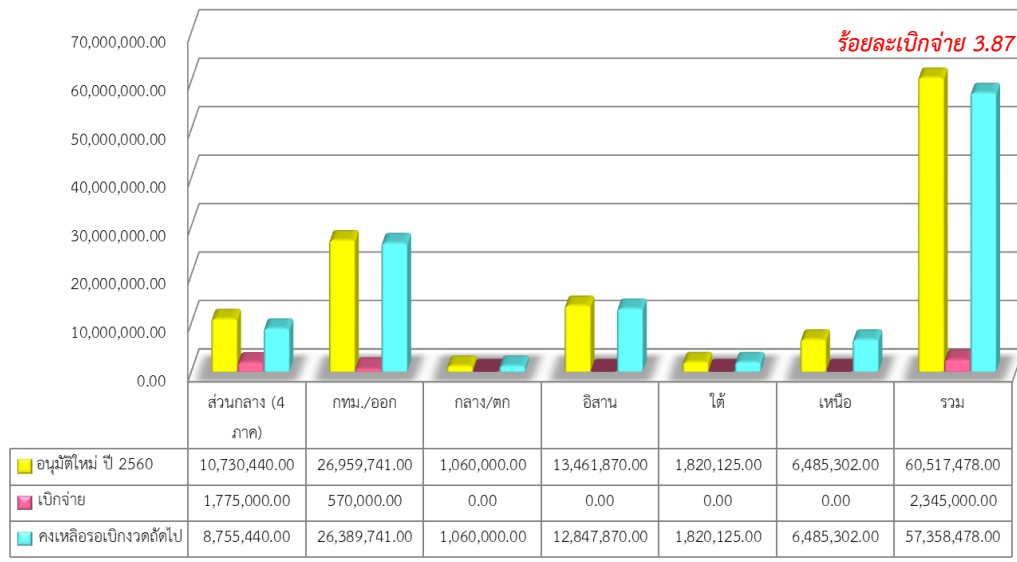

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 311.39 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.91 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 286.75 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 28 ก.พ.62)

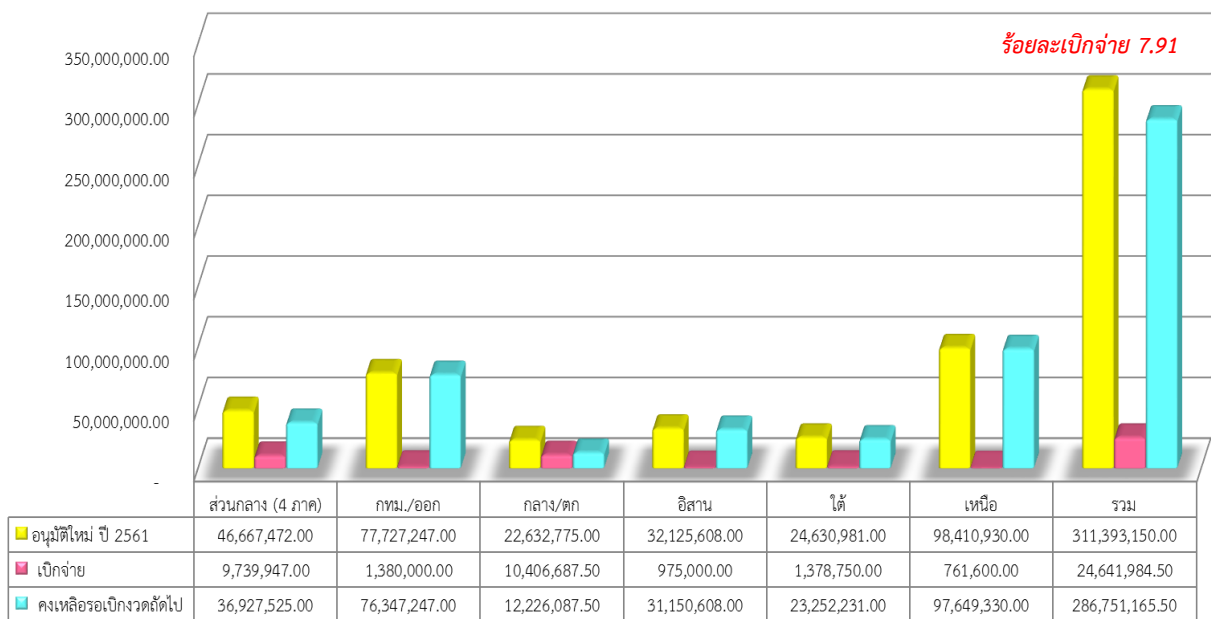

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

เป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,193 ครั้วเรือน ทั่วประเทศ ในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย และสนับสนุนภาคีพัฒนา อนุมัติงบประมาณรวม 72.28 ล้านบาท แต่ละภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น 0.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 71.38 ล้านบาท แยกรายภาคได้ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 28 ก.พ.62)

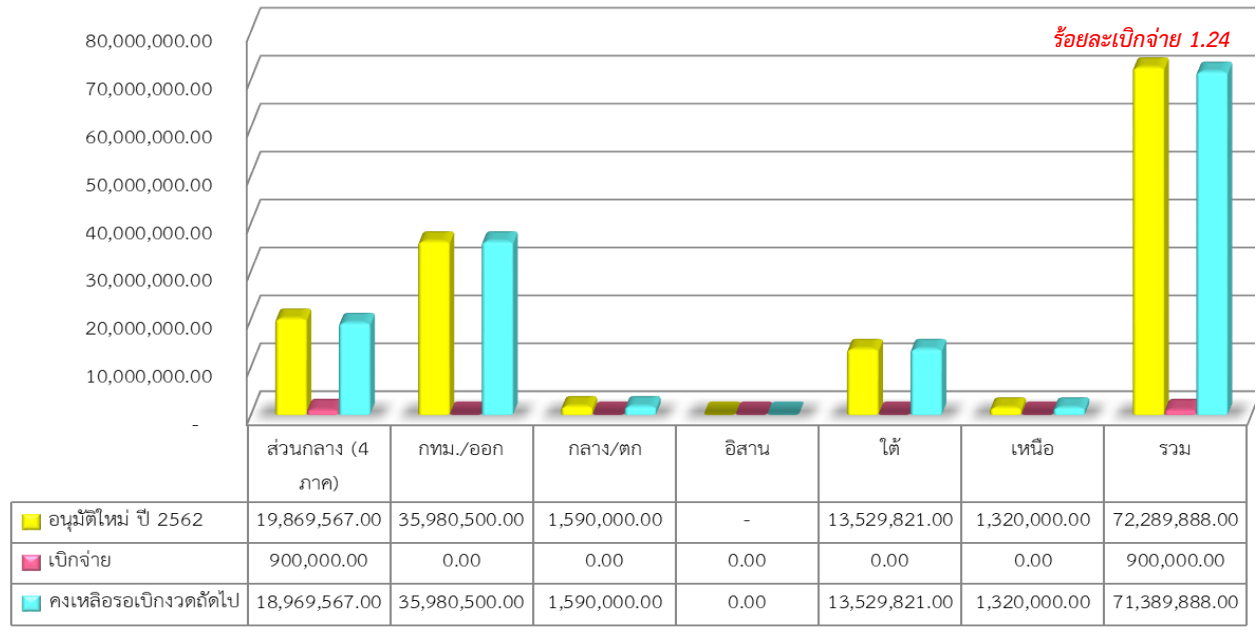

2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2562

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครั้วเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,394 โครงการ 12,543 ครั้วเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 226.20 ล้านบาท ในพื้นที่ 71 จังหวัด 1,168 ตำบล พร้อมทั้งผลการบันทึกข้อมูลในระบบ จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรม				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครั้วเรือน	จำนวนเงิน	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครั้วเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	2,200	43,800,000	458	15	442	2,454	43,800,000.00	378	13	378	2,442	38,010,936.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	53,800,000	432	20	412	2,826	51,300,000.00	432	20	412	2,826	51,300,000.00
ภาคกลาง/ตล	2,200	43,900,000	199	13	186	2,584	43,900,000.00	227	13	89	89	14,512,500.00
ภาคกทม./ออก	2,200	43,500,000	180	11	167	2,382	43,500,000.00	180	11	167	2,382	43,500,000.00
ภาคใต้	2,200	43,700,000	125	14	122	2,297	43,700,000.00	125	14	122	2,297	43,700,000.00
รวม	11,500	228,700,000	1,394	73	1,329	12,543	226,200,000.00	1,342	71	1,168	10,036	191,023,436.00

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรม จำนวน 226.20 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 71.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.46 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติ จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	จำนวนโครงการ	จำนวนครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ภาคเหนือ	2,200	458	2,425	43,800,000.00	5,874,811.00	37,925,189.00	13.41
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	432	2,826	51,300,000.00	9,324,599.00	41,975,401.00	18.18
ภาคใต้	2,200	125	2,297	43,700,000.00	26,292,300.00	17,407,700.00	60.17
ภาคทวม/ออก	2,200	180	2,382	43,500,000.00	28,560,291.00	14,939,709.00	65.66
ภาคกลาง/ตก	2,200	199	2,584	43,900,000.00	1,117,000.00	42,783,000.00	2.54
รวม	11,500	1,394	12,514	226,200,000.00	71,169,001.00	155,030,999.00	31.46

2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559 - 2562 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 4,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 80.14 ล้านบาท หักเป็นงบดำเนินงาน 8.01 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงานทั้งสิ้น 72.13 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 2,684 ครัวเรือน 64 โครงการ วงเงินอนุมัติรวม 39.02 ล้านบาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,768 ครัวเรือน มีงบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 33.10 ล้านบาท แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รับเงินงบประมาณจากรัฐ

ปีที่อนุมัติ	รหัส	ครัวเรือน	งบดำเนินการ	ผลการอนุมัติ ปี 2562		คงเหลือรออนุมัติ
				งบดำเนินงาน พอช	สนับสนุนองค์กรชุมชน	
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000.00	2,106,000.00	18,570,447.00	383,553.00
ปี 2560	84500	1,082	19,477,500.00	1,947,750.00	15,144,000.00	2,385,750.00
ปี 2561	84800	1,200	21,600,000.00	2,160,000.00	5,310,000	14,130,000.00
ปี 2562	84900	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	-	16,200,000.00
รวม		4,452	80,137,500.00	8,013,750.00	39,024,447.00	33,099,303.00

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2562

ปีที่อนุมัติ	ครัวเรือน	โครงการ	ภาพรวมการอนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
ปี 2559	1,489	34	18,570,447.00	15,086,447.00	3,484,000.00	81.24
ปี 2560	900	28	15,144,000.00	13,758,000.00	1,386,000.00	90.85
ปี 2561	295	2	5,310,000.00	5,166,000.00	144,000.00	97.29
ปี 2562	-	-	-	-	-	-
รวม	2,684	64	39,024,447.00	34,010,447.00	5,014,000.00	87.15

รายงานสรุปผลการอนุมัติโครงการปี 2562

ผลการอนุมัติงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 สามารถสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไถ่เรือ ได้ทั้งสิ้น 12 โครงการ 473 ครั้วเรือน งบประมาณ 8,482,000 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 7,276,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.78 และคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวน 1,206,000 บาท รายละเอียดแยกกราฟิกดังตารางต่อไปนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

ภาค	โครงการ	ครั้วเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ใต้	5	397	7,146,000.00	6,984,000.00	162,000.00
เหนือ	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง(สำนักบ้านมั่นคง)	5	43	774,000.00	-	774,000.00
กรุงเทพปรีทล และตะวันออก	-	15	270,000.00	-	270,000.00
กลางและตะวันตก	1	-	-	-	-
ศปก.คลอง	1	18	292,000.00	292,000.00	-
รวม	12	473	8,482,000.00	7,276,000.00	1,206,000.00

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครั้วเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- **ปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.23 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47.07 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดขอนแก่น และซื้อที่ดินสำหรับชุมชนใหม่คนไร้บ้าน (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 47.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของงบประมาณอนุมัติ คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป 4.17 ล้านบาท

- **ปีงบประมาณ 2561** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6.53 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58.77 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.กรุงเทพฯ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน อาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน งบประมาณอนุมัติรวม 58.77 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 29.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.50 ของงบประมาณอนุมัติ แสดงรายละเอียดแยกกราฟิกปี ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบประมาณ	งบที่ได้รับอนุมัติ	หักดำเนินการ	คงเหลือดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	42,900,000	4,170,000	91.14
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	29,089,909	29,680,091	49.50
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	71,989,909	33,850,091	68.01

