



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
COMMUNITY ORGANIZATIONS  
DEVELOPMENT INSTITUTE

## รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย ณ เดือนธันวาคม 2561

### 1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนธันวาคม 2561

- 1.1 ผลการมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2562 “มอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคน มั่นคง เข้มแข็ง”
- 1.2 ความสำเร็จหน้าการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

### 2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

- 2.1 โครงการบ้านมั่นคง
- 2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
- 2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ
- 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

# 1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนธันวาคม 2561

ตามทิศทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ด้วยการดำเนินแก้ไขที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดินได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

## 1.1 ของขวัญปีใหม่ ปี 2562 “มอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคน มั่นคง เข้มแข็ง” (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ตามที่สถาบันจัดงานมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ภายใต้คำขวัญ “มอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคน มั่นคง เข้มแข็ง” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และมอบบ้านที่สร้างแล้วเสร็จจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย บ้านมั่นคง บ้านพอเพียงชนบท และบ้านริมคลอง จำนวน 2,562 หลังคาเรือน และมีการสนับสนุนการสร้างบ้านให้ผู้เดือดร้อน กรณีบ้านห้วยขาบ อำเภอปอแก้ว จังหวัดน่าน ร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งผลการจัดงานมอบของขวัญเกิดการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสู่สาธารณะ สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการมอบบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยแล้ว 1,894 หลังคาเรือน คงเหลือ 668 หลังคาเรือน โดยมีแผนมอบบ้านแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 และมีแผนการยกเสาเอกบ้านห้วยขาบ จังหวัดน่าน ในวันที่ 31 มกราคม 2562

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี - หนองคาย พร้อมมอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 150 หลังคาเรือน 33 ตำบล ณ จังหวัดหนองคาย และแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย พมจ. หนองคาย และมีกิจกรรม “มอบบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียงชนบท ของขวัญ ปีใหม่ 2562” ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย นางสาวรัชณี ตรียตริงศ์โกศล พมจ.สุโขทัย ซึ่งประกอบด้วย บ้านมั่นคงเมือง 486 หลังคาเรือน และบ้านพอเพียงชนบท 221 หลังคาเรือน



วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีกิจกรรม “มอบบ้านมั่นคงชุมชนศิริธรรม ปีใหม่ 2562” ณ ชุมชนศิริธรรม ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี



วันที่ 21 ธันวาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “การจัดการที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านมดตะนอย” (โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง) พร้อมมอบบ้านพอเพียงที่ได้รับการสนับสนุนจังหวัดตรัง จำนวน 322 หลัง มอบบ้านมั่นคงบ้านมดตะนอย จำนวน 180 หลัง พร้อมเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างและเยี่ยมชมกิจกรรมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรื่องการทำธนาคารปูม้า การจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการขยะ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน (เชิงอนุรักษ์)



วันที่ 26 ธ.ค. 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานร่วมในการ มอบของขวัญปีใหม่ 2562 “ประชารัฐร่วมใจ มอบที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ และนายสมชาติ ภาரசสุวรรณ ผอ.พอช. ร่วมในงานดังกล่าว ณ ชุมชนตลาดบ่อบัว เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ภายในงานมีการมอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนสำหรับ 99 คริวเรือน โดยมีการมอบสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยให้กับ พอช. และชุมชน บนพื้นที่ 6 ไร่เศษ ระยะเวลา 30 ปี ตลอดจนพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 5 หน่วยงาน ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขบวนการองค์กรชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา เครือข่ายสลัม 4 ภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป



## 1.2 ความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน มีการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด โดยมีมติให้คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด โดยมีความคืบหน้าจากสำนักงานภาค 5 ภาค ดังนี้

สำนักงานภาค	จำนวนจังหวัด	รับรองแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ	ร่างแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ เตรียมเสนอรับรอง/อยู่ระหว่างปรับแก้	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
1. เหนือ	15	2 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง, อุตรดิตถ์,	10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, กำแพงเพชร, น่าน, ลำพูน, ตาก, เพชรบูรณ์, พิจิตร, แม่ฮ่องสอน, สุโขทัย	3 จังหวัด ได้แก่ แพร่, พิชณุโลก, พะเยา
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	9 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, นครพนม, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, เลย, บึงกาฬ, สกลนคร, อุตรธานี, อุบลราชธานี	5 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ยโสธร, ชัยภูมิ, ร้อยเอ็ด	6 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู, หนองคาย, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, อำนาจเจริญ, สุรินทร์
3. กลางและตะวันตก	16	11 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, สระบุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, ออยุธยา, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี	4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี	1 จังหวัด คือ ลพบุรี
4. กรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก	12	8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว, ระยอง, จันทบุรี	3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, ชลบุรี, ตราด	1 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ
5. ใต้	14	4 จังหวัด ได้แก่ สตูล, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี	9 จังหวัด ได้แก่ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, กระบี่, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, พัทลุง	1 จังหวัด คือ พังงา

## 2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ณ เดือนธันวาคม 2561

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เมืองและชนบท) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

1) โครงการบ้านมั่นคง มีเป้าหมายดำเนินการ 5,500 ครัวเรือน ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 1,005 ครัวเรือน 25 ชุมชน ๑๓ โครงการ ใน 8 จังหวัด แล้ว

๒) โครงการบ้านพอเพียงชนบท มีเป้าหมายดำเนินการ 11,500 ครัวเรือน ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 9,272 ครัวเรือน ใน 986 ตำบล 62 จังหวัด

๓) โครงการศูนย์คนไร้บ้าน ดำเนินการก่อสร้างศูนย์คนไร้บ้านต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างฐานรากและเทคนอาคารชั้นหนึ่ง และศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างการออกแบบการก่อสร้างที่พักชั่วคราว และปรับแบบก่อสร้างทั้งบริเวณให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้าน และงบประมาณ

๔) โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญห จำนวน 73 ครัวเรือน ใน 4 ชุมชน 3 จังหวัด

ซึ่งสำนักบ้านมั่นคงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยผลการอนุมัติ และเบิกจ่ายงบประมาณรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงปี 2562 (ณ 31 ธันวาคม 2561)

#### รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 13 โครงการ 8 จังหวัด 1,005 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 520 ครัวเรือน โครงการการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยชนบท 485 ครัวเรือน งบประมาณรวม 58,500,067 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และสนับสนุนภาคีพัฒนา งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ดังนั้น อนุมัติงบประมาณรวมทั้งสิ้น 59,800,067 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหกสิบล้านบาทถ้วน) จำแนกรายภาคได้ดังนี้


#### สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2562

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ						ผลการอนุมัติงบประมาณกระทรวงเมือง				
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครัวเรือน	จำนวนเงิน	กรอบงบ	โครงการ	จำนวนเงิน	คงเหลือ งบดำเนินการ	รวมอนุมัติทั้งสิ้น
เหนือ	1,100	1	1	-	60	60	1,320,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	1,320,000.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,154	-	-	-	-	-	0.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00
ใต้	1,149	1	1		23	23	2,540,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	2,540,000.00
กทม/ตะวันออก	1,800	3	2	498		498	35,980,500.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	35,980,500.00
กลางและตะวันตก	1,100	1	1	22		22	1,590,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	1,590,000.00
บ้านมั่นคง	1,500	7	3	-	402	402	17,069,567.00	34,000,000.00	2	1,300,000.00	32,700,000.00	18,369,567.00
รวม	7,803	13	8	520	485	1,005	58,500,067.00	44,000,000.00	2	1,300,000.00	42,700,000.00	59,800,067.00

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนร่วมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2562

ปีงบประมาณ 2562 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 506.70 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2562 ทั้งสิ้น 59.80 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 566.50 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 15.247 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61)

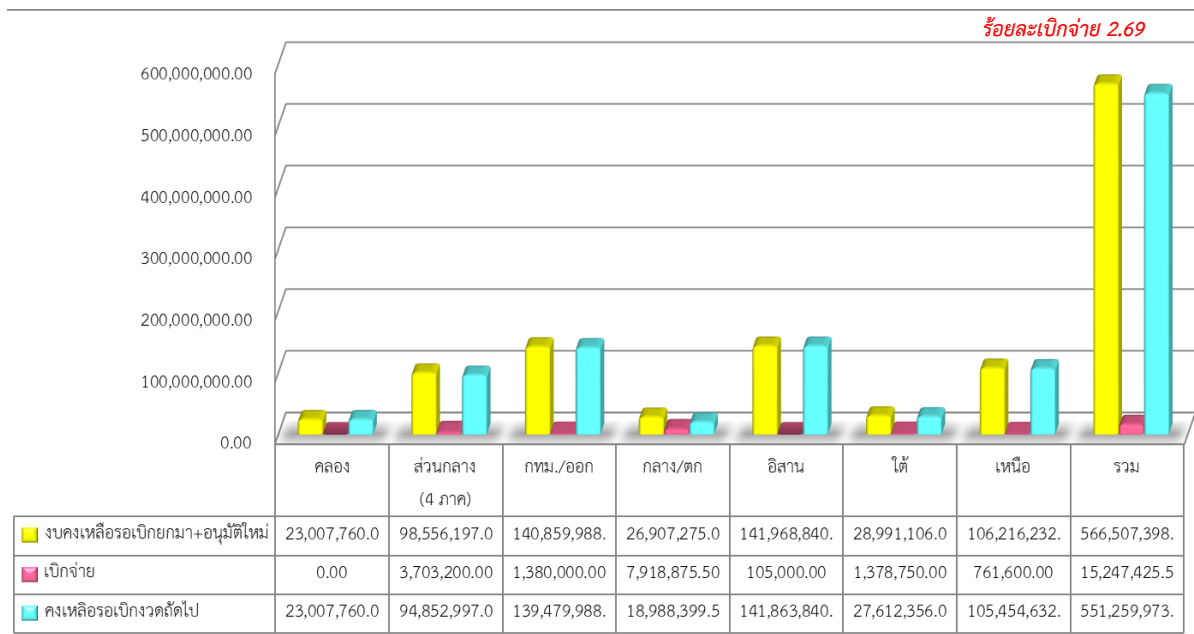

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการเดิม 2556-2559) (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ) มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 134.79 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายแล้ว 598,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 114.50 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

### สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.)

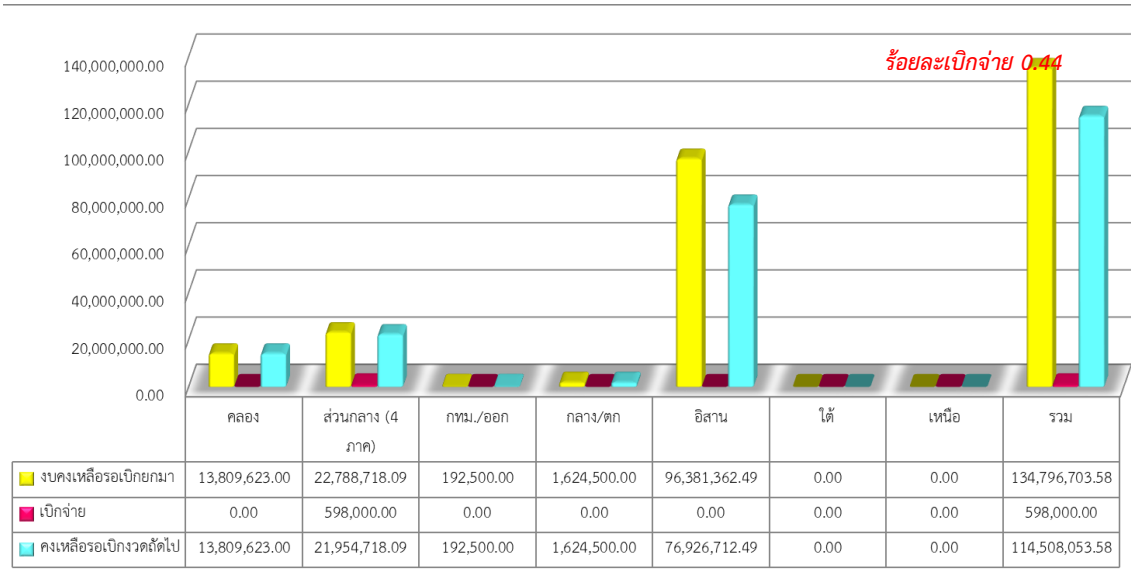


**หมายเหตุ** ช่วงไตรมาสที่ 1 มีการคืนงบประมาณจำนวน 19,690,650 บาท แยกรายภาคดังนี้

- 1) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงิน 19,454,650 บาท
- 2) สำนักบ้านมั่นคง วงเงิน 236,000 บาท

### รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 60.51 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 2.345 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.87 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 59.60 สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

### สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31

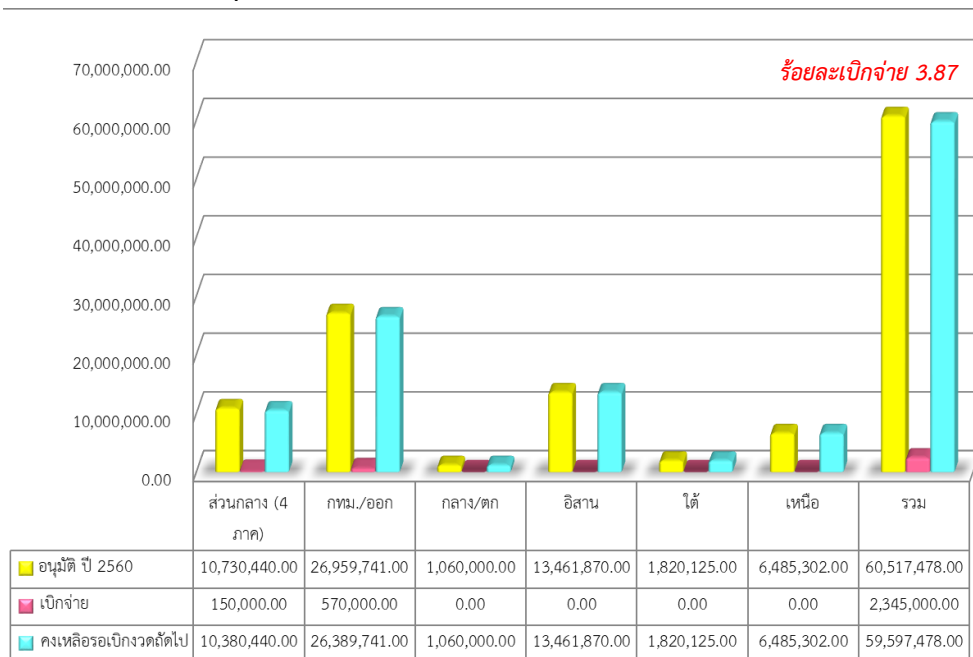


**หมายเหตุ** ช่วงไตรมาสที่ 1 สำนักบ้านมั่นคง มีการคืนงบประมาณจำนวน 200,000 บาท

## รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 311.39 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13.029 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.18 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 298.36 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


### สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61)

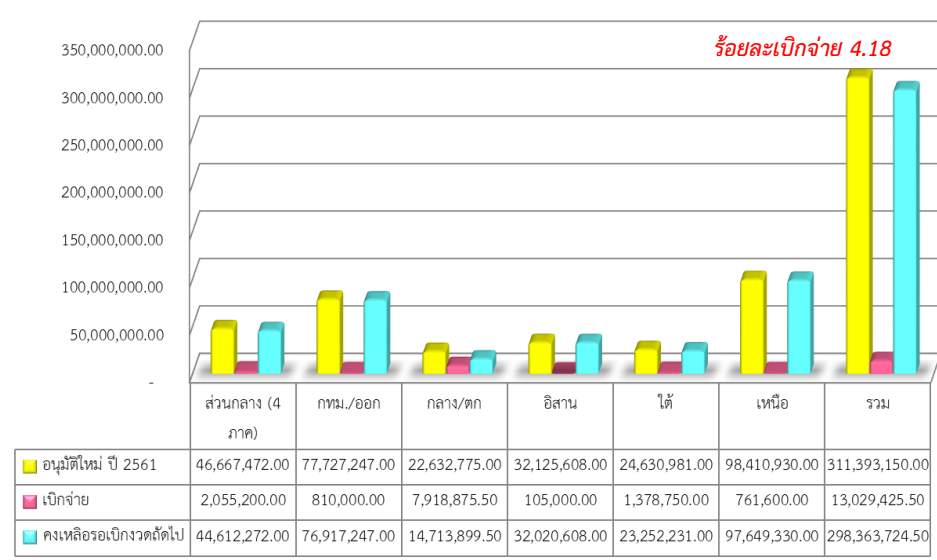

## รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

เป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,193 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย และสนับสนุนภาคีพัฒนา อนุมัติงบประมาณรวม 59.80 บาท แต่ละภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น 900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนั้นคงเหลืองบประมาณเบิกจ่าย จำนวน 58.90 บาท แยกรายภาคได้ดังนี้

### สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61)

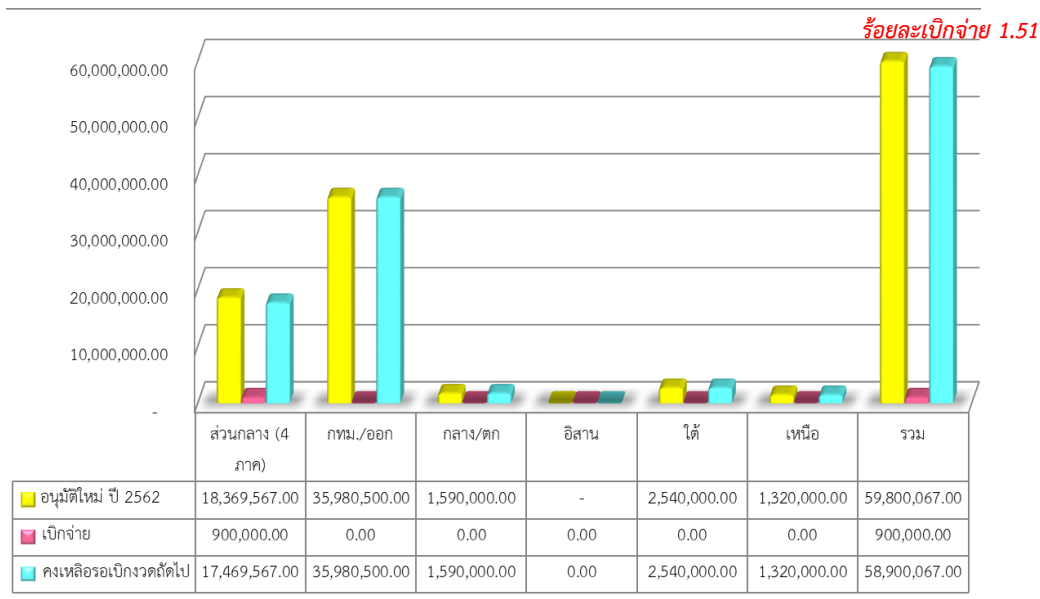

## 2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2562 (ณ 31 ธันวาคม 2561)

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท จัดสรรกรอบงบประมาณสนับสนุนระดับพื้นที่ จำนวน 228,700,000 บาท

### รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,029 โครงการ 8,468 ครัวเรือน 151,859,244 บาท ในพื้นที่ 61 จังหวัด 987 ตำบล วงเงินอนุมัติจำนวน 151,859,244 บาท จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรม				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	2,200	43,800,000	175	8	175	1,072	18,247,744.00	104	6	104	692	12,168,782.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	53,800,000	432	20	412	2,826	51,300,000.00	1	1			500,000.00
ภาคกลาง/ตก	2,200	43,900,000	199	13	186	1,459	25,212,500.00					
ภาคทม/ออก	2,200	43,500,000	121	9	112	1,274	23,925,000.00	112	8	110	1,235	22,405,000.00
ภาคใต้	2,200	43,700,000	102	11	102	1,837	33,174,000.00	1	1			1,400,000.00
<b>รวม</b>	<b>11,500</b>	<b>228,700,000</b>	<b>1,029</b>	<b>61</b>	<b>987</b>	<b>8,468</b>	<b>151,859,244</b>	<b>218</b>	<b>16</b>	<b>214</b>	<b>1,927</b>	<b>36,473,782.00</b>

### รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรม จำนวน 151,859,244 บาท เบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,690,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติ จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	จำนวนโครงการ	จำนวนครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ภาคเหนือ	2,200	175	1,072	18,247,744.00	2,800,000.00	15,447,744.00	15.34
ภาคอีสาน	2,700	432	2,826	51,300,000.00	350,000.00	50,950,000.00	0.68
ภาคใต้	2,200	102	1,837	33,174,000.00	1,400,000.00	31,774,000.00	4.22
ภาคทม/ออก	2,200	121	1,274	23,925,000.00	140,000.00	23,785,000.00	0.59
ภาคกลาง/ตก	2,200	199	1,459	25,212,500.00	0.00	25,212,500.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>11,500</b>	<b>1,029</b>	<b>8,468</b>	<b>151,859,244.00</b>	<b>4,690,000.00</b>	<b>147,169,244.00</b>	<b>3.09</b>

## 2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ (ณ 31 ธันวาคม 2561)

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2562 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 4,450 ครัวเรือน วงเงินรวม 80,137,500 บาท ในปีที่ผ่านมาเกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 2,376 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 31,853,447 บาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 2,074 ครัวเรือน มีงบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 40,270,303 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

## รับเงินงบประมาณจากรัฐ

ปีที่อนุมัติ	รหัส	ครัวเรือน	งบดำเนินการ	ผลการอนุมัติ ปี 2562		คงเหลือรออนุมัติ
				งบดำเนินงาน พอช	สนับสนุนองค์กรชุมชน	
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000.00	2,106,000.00	18,570,447.00	383,553.00
ปี 2560	84500	1,080	19,477,500.00	1,947,750.00	13,283,000.00	4,246,750.00
ปี 2561	84800	1,200	21,600,000.00	2,160,000.00	-	19,440,000.00
ปี 2562	84900	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	-	16,200,000.00
รวม		4,450	80,137,500.00	8,013,750.00	31,853,447.00	40,270,303.00

### สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2561

จากผลการอนุมัติรวมปี 2559- 2560 จำนวน 56 โครงการ 2,376 ครัวเรือน เป็นงบประมาณ 31,853,447 บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ปี 2559- 2561 ได้จำนวน 27,220,447 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.46 คงเหลือ 4,633,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ปีที่อนุมัติ	ครัวเรือนดำเนินการ	ภาพรวมการอนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
ปี 2559	34 โครงการ 1,581 ครัวเรือน	18,570,447.00	15,086,447.00	3,484,000.00	81.24
ปี 2560	22 โครงการ 795 ครัวเรือน	13,283,000.00	12,134,000.00	1,149,000.00	91.35
ปี 2561		-	-	-	
ปี 2562					
รวม	56 โครงการ 2,376 ครัวเรือน	31,853,447.00	27,220,447.00	4,633,000.00	85.46

### 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน (ณ 31 ธันวาคม 2561)

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117,600,000.00 บาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- **ปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,230,000 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47,070,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น และซื้อที่ดินสำหรับชุมชนใหม่คนไร้บ้าน (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 47,070,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของงบประมาณอนุมัติ คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป 4,170,000 บาท ดังตารางต่อไปนี้

ภาค	ศูนย์	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
ภาคเหนือ (ศูนย์พักคนไร้บ้านเชียงใหม่)	1	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	100
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์พักคนไร้บ้านขอนแก่น)	1	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	100
ภาคกรุงเทพมหานครและ ตะวันออก (ซื้อที่ดินชุมชนใหม่คน ไร้บ้าน: เพิ่มเติม)		4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>47,070,000.00</b>	<b>42,900,000.00</b>	<b>4,170,000.00</b>	<b>91</b>

- **ปีงบประมาณ 2561** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,530,000 บาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58,770,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.กรุงเทพฯ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน อาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัย และจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน งบประมาณอนุมัติรวม 58,770,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 29,089,909 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.50 ของงบประมาณอนุมัติ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน เป้าหมายงบประมาณปี 2562 ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างฐานรากและเทคานอาคารชั้นหนึ่ง และ 2) ศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างการออกแบบการก่อสร้างที่พักชั่วคราว และปรับแบบก่อสร้างทั้งบริเวณให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้าน และงบประมาณ
