



รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย ณ เดือนเมษายน 2562

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนเมษายน 2562
2. รายงานสถานการณ์งบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
 - 2.1 โครงการบ้านมั่นคง
 - 2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
 - 2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไส้ร้อย ภัยพิบัติ
 - 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนเมษายน 2562

ตามทิศทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ด้วยการดำเนินแก้ไขที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการบ้านมั่นคง และการจัดการที่ดินได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

1.1 ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร

วันที่ 30 –31 มีนาคม 2562 เปิดเวทีทำความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เทศบาลตำบลหลักหก จ.ปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ท.ธรรมนุญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธาน



วันที่ 6 เมษายน 2562 มีการจัดประชุมชาวชุมชนในเขตดอนเมือง ณ วัดสีกัน จำนวน 14 ชุมชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ริมคลองเปรมประชากร เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมชี้แจง ได้แก่ สำนักงานเขตดอนเมือง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 1 กรมธนารักษ์ สำนักการระบายน้ำ กทม. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบัน เป็นประธานชี้แจง



1.2 การลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง 9 หน่วยงาน เพื่อสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมคนไร้บ้าน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัม 4 ภาค และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำคัญในการลงนามครั้งนี้ คือ 1) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ

ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มประชากรคนไร้บ้านทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายสำรวจในพื้นที่เขตเทศบาล จำนวน 70 เทศบาล 44 จังหวัด 2) เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลประชากรคนไร้บ้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่และระดับประเทศ และ 3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรคนไร้บ้านให้ครอบคลุมและยั่งยืน มีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน โดยทั้ง 9 หน่วยงานจะบูรณาการการทำงานและสำรวจข้อมูลร่วมกันตั้งแต่เดือนเมษายน โดยมีเป้าหมายจะสำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม



1.3 ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสร้างบ้านถาวรบ้านห้วยขาบ ต.ตงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ดังนี้

วันที่ 5 เมษายน 2562 พอช.ภาคเหนือ และทีมวิศวกร บริษัทไทยเบฟฯ ร่วมกันหารือร่วมกับ อบต. บ่อเกลือเหนือและผู้รับเหมา 2 ราย ที่จะก่อสร้างบ้าน จำนวน 60 หลัง ร่วมกับชาวบ้านเข้าดูพื้นที่ และจัดปรับผังเพื่อการก่อสร้างบ้านโดยทางไทยเบฟฯ ได้ทำสัญญาระยะเวลา 120 วัน และในวันที่ 20 เม.ย.62 มีแผนเข้าพื้นที่ติดตามผู้รับเหมา 2 ราย ที่จะดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังแรกจำนวน 2 หลังเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้าน ทำการพิจารณาและทำความเข้าใจร่วมกัน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน (4 เดือน) คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จ ภายในไม่เกินเดือนสิงหาคม 2562 นี้ทั้ง 60 หลัง

วันที่ 7 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสร้างบ้านถาวรบ้านห้วยขาบ ที่ อ.บ.ต.ตงพญา โดยหารือเรื่องแผนการก่อสร้างบ้านของแต่ละหน่วยงาน และการจัดสรรแปลงที่ดินเพื่อการเยียวยาเจ้าของที่ดินเดิมจำนวน 4 ราย โดยมีข้อสรุปดังนี้ 1) ให้กรมป่าไม้ ชี้แนวเขตแปลงว่างที่ไม่มีเจ้าของจำนวน 67 ไร่เพื่อการปรับพื้นที่และรางวัลเพื่อเยียวยาให้แก่เจ้าของที่ดินเดิม 4 ราย จำนวน 31 ไร่ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นผู้เข้าพื้นที่ในการปรับและใช้งบประมาณค่าน้ำมันจากทางอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2) การปรับพื้นที่รอบข้างของพื้นที่ของจำนวน 176 ไร่ ให้ดำเนินการปรับให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 และให้กรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ำ 3) การพัฒนาด้านอาชีพ ให้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้ดำเนินการตามแผนงานของแต่ละหน่วยที่ได้วางไว้ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับทางบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ในส่วนของการพัฒนาและยกระดับอาชีพต่อไป

2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ณ 30 เมษายน 2562

2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการ สร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครัวเรือน ทั่วประเทศและในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 34 โครงการ 16 จังหวัด 3,335 ครัวเรือน จำแนกเป็นโครงการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 1,013 ครัวเรือน โครงการการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยชนบท 2,322 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 149.60 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 19.25 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 168.85 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2562


ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ						ผลการอนุมัติงบประมาณระดับเมือง				
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครัวเรือน	จำนวนเงิน	กรอบงบ	โครงการ	จำนวนเงินอนุมัติ	คงเหลือ งบดำเนินการ	รวมอนุมัติทั้งสิ้น
เหนือ	1,100	1	1	-	60	60	1,320,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	1,320,000.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,154	5	2	60	304	364	23,491,441.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	25,491,441.00
ใต้	1,149	8	3	413	454	867	33,067,321.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	35,067,321.00
กทม/ตะวันออก	1,800	7	3	498	908	1,406	57,060,500.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	59,060,500.00
กลางและตะวันตก	1,100	6	4	42	194	236	17,583,000.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	19,583,000.00
บ้านมั่นคง	1,500	7	3	-	402	402	17,069,567.00	34,000,000.00	5	11,254,000.00	22,746,000.00	28,323,567.00
รวม	7,803	34	16	1,013	2,322	3,335	149,591,829.00	44,000,000.00	9	19,254,000.00	24,746,000.00	168,845,829.00

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือรอเบิกจ่าย ยกมาจากปีก่อนร่วมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2562

ปีงบประมาณ 2562 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 506.70 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2562 ทั้งสิ้น 168.85 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 675.55 ล้านบาท สามารถเบิกจ่าย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 40.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.97 ของงบประมาณรอเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ มีการคืนกรอบงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 89.48 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 545.71 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 30 เม.ย.62)


ร้อยละเบิกจ่าย 5.97

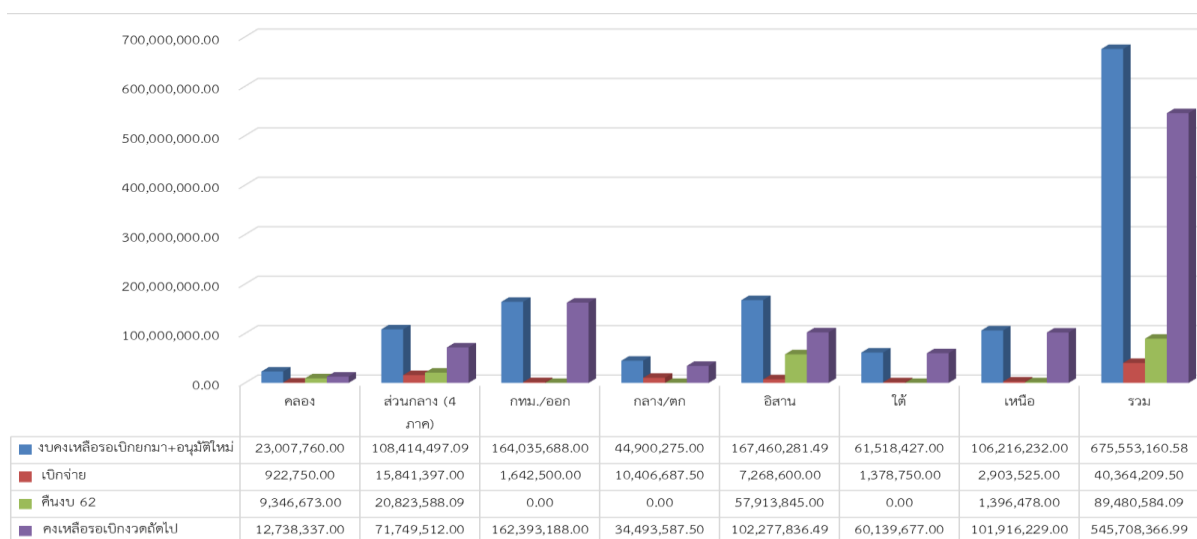

**รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการเดิม 2557-2559)
(งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)**

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจกปี 2561 จำนวน 134.80 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายแล้ว 4.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 ของงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย ระหว่างดำเนินโครงการมีการคืนงบประมาณ จำนวน 87.27 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 43.20 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 30 เม.ย.62)

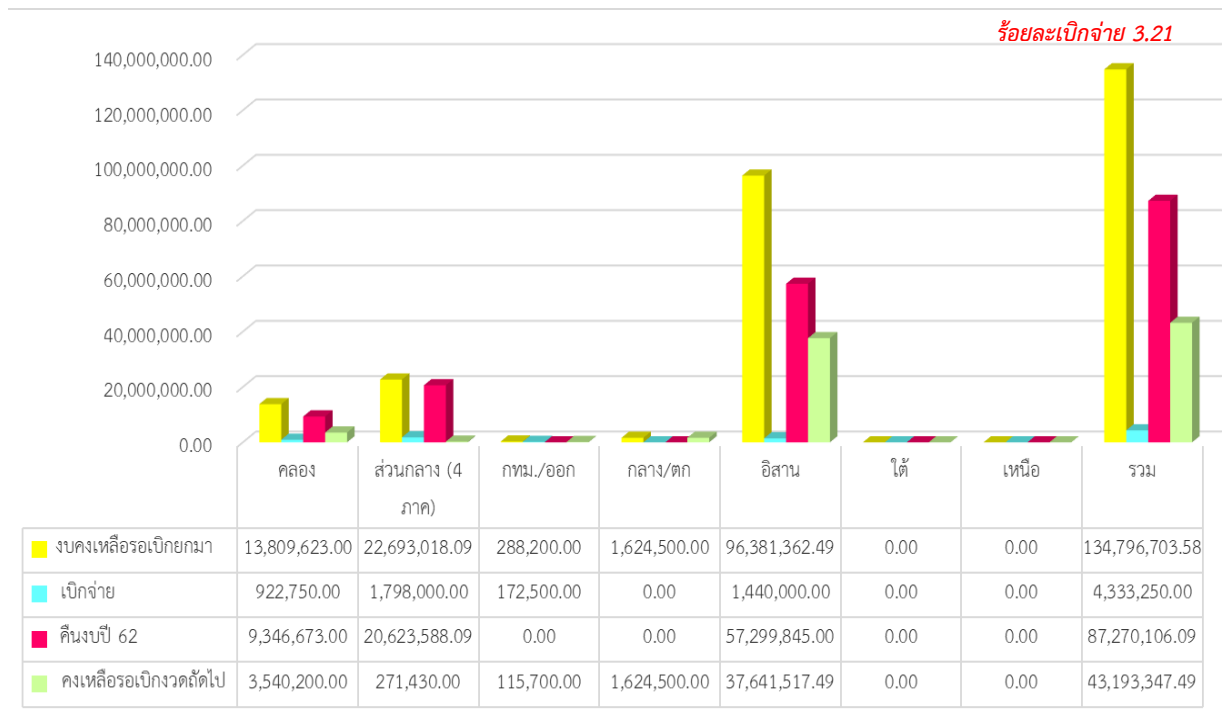

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจกปี 2561 จำนวน 60.52 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 4.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่าย ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณจำนวน 1.87 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 54.47 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 30 เม.ย.62)

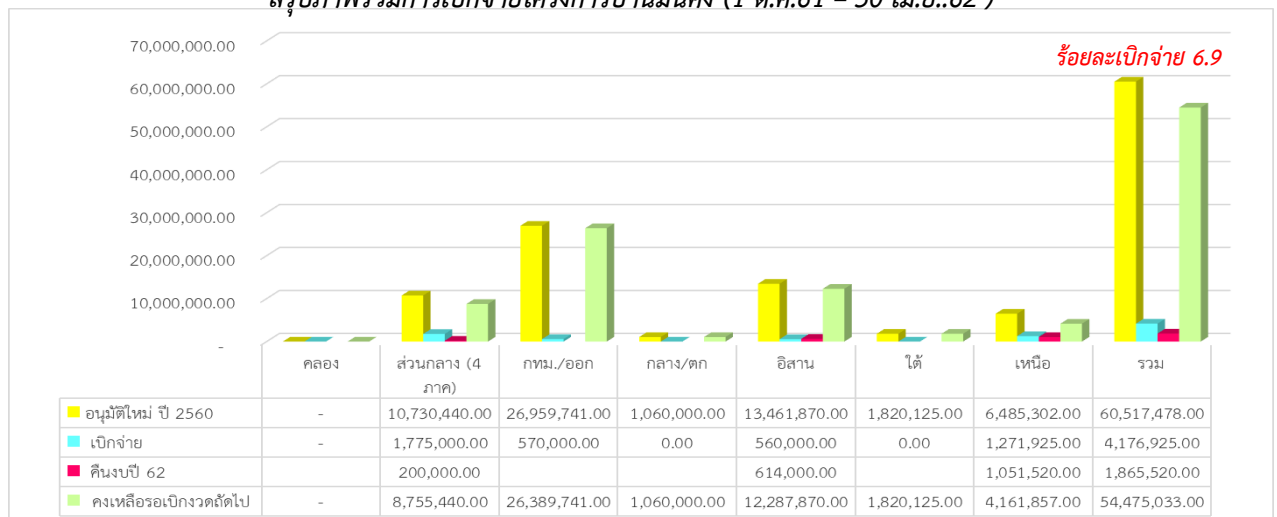

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2561 จำนวน 311.39 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.24 ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณจำนวน 0.34 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 282.29 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 30 เม.ย.62)

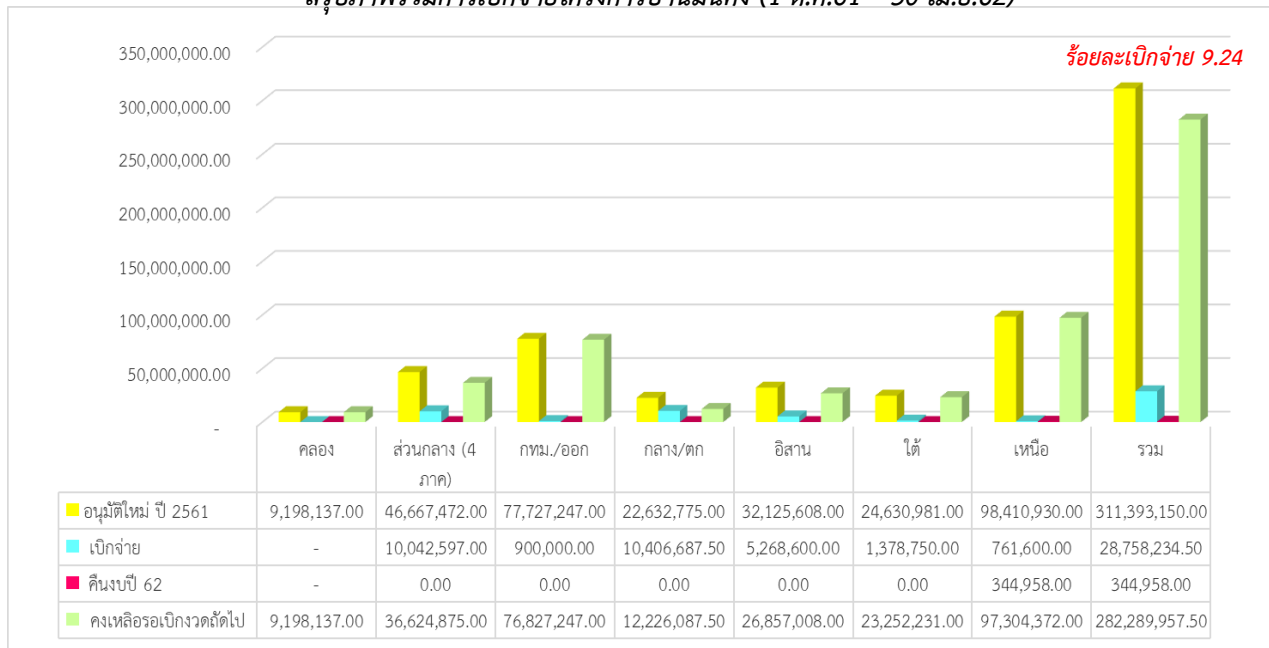

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

เป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,193 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย และสนับสนุนภาคีพัฒนา อนุมัติงบประมาณรวม 168.85 ล้านบาท แต่ละภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น 3.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.83 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 165.75 ล้านบาท แยกรายภาคได้ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 30 เม.ย.62)

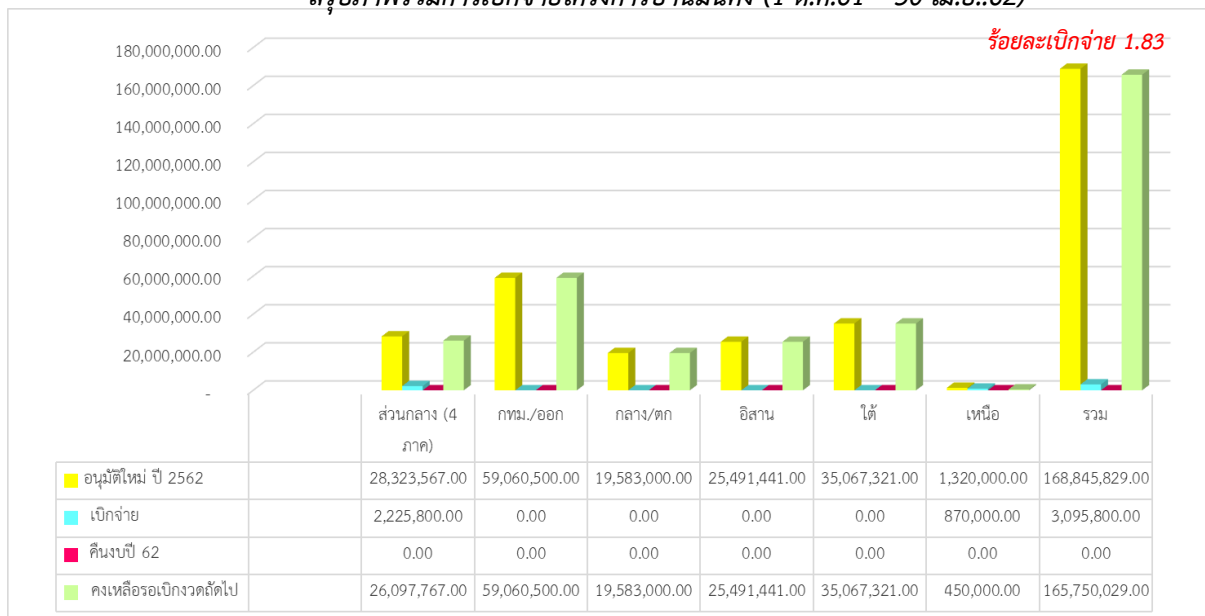

2.2 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,523 โครงการ 12,543 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 226.20 ล้านบาท ในพื้นที่ 77 จังหวัด 1,454 ตำบล พร้อมทั้งผลการบันทึกข้อมูลในฐานระบบจำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรม				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	2,200	43,800,000	458	15	442	2,454	43,800,000.00	458	15	442	2,454	43,800,000.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	53,800,000	432	20	412	2,826	51,300,000.00	432	20	412	2,826	51,300,000.00
ภาคกลาง/ตก	2,200	43,900,000	328	16	311	2,584	43,900,000.00	328	16	311	2,584	43,900,000.00
ภาคทม/ออก	2,200	43,500,000	180	12	167	2,382	43,500,000.00	180	12	167	2,382	43,500,000.00
ภาคใต้	2,200	43,700,000	125	14	122	2,297	43,700,000.00	125	14	122	2,297	43,700,000.00
รวม	11,500	228,700,000	1,523	77	1,454	12,543	226,200,000.00	1,523	77	1,454	12,543	226,200,000.00

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรม จำนวน 226.20 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 155.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.59 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติ และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 71.05 ล้านบาท จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	จำนวนโครงการ	จำนวนครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ภาคเหนือ	2,200	458	2,454	43,800,000.00	17,756,099.00	26,043,901.00	40.54
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	432	2,826	51,300,000.00	38,428,966.00	12,871,034.00	74.91
ภาคใต้	2,200	125	2,297	43,700,000.00	31,965,300.00	11,734,700.00	73.15
ภาคทม/ออก	2,200	180	2,382	43,500,000.00	33,306,115.00	10,193,885.00	76.57
ภาคกลาง/ตก	2,200	328	2,584	43,900,000.00	33,689,365.00	10,210,635.00	76.74
รวม	11,500	1,523	12,543	226,200,000.00	155,145,845.00	71,054,155.00	68.59

สัดส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2562



2.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2562 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 4,450 ครัวเรือน วงเงินรวม 80.14 ล้านบาท หักเป็นงบดำเนินงาน 8.01 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงานทั้งสิ้น 72.13 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนการองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 2,684 ครัวเรือน 64 โครงการ วงเงินอนุมัติรวม 39.02 ล้านบาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,768 ครัวเรือน มีงบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 33.09 ล้านบาท แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รับเงินงบประมาณจากรัฐ

ปีที่อนุมัติ	รหัส	ครัวเรือน	งบดำเนินการ	ผลการอนุมัติ ปี 2562		คงเหลือรออนุมัติ
				งบดำเนินงาน พอช	สนับสนุนองค์กรชุมชน	
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000.00	2,106,000.00	18,570,447.00	383,553.00
ปี 2560	84500	1,082	19,477,500.00	1,947,750.00	15,144,000.00	2,385,750.00
ปี 2561	84800	1,200	21,600,000.00	2,160,000.00	5,310,000	14,130,000.00
ปี 2562	84900	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	-	16,200,000.00
รวม		4,452	80,137,500.00	8,013,750.00	39,024,447.00	33,099,303.00

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2562

ปีที่อนุมัติ	โครงการ	ครัวเรือน	ภาพรวมการอนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย
ปี 2559	34	1489	18,570,447.00	15,086,447.00	3,484,000.00
ปี 2560	28	900	15,144,000.00	13,776,000.00	1,368,000.00
ปี 2561	2	295	5,310,000.00	5,310,000.00	0.00
ปี 2562	-	-	-	-	-
รวม	64	2,684	39,024,447.00	34,172,447.00	4,852,000.00

รายงานสรุปผลการอนุมัติโครงการปี 2562

ผลการอนุมัติงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 สามารถสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล้รื้อ ได้ทั้งสิ้น 12 โครงการ 473 ครัวเรือน งบประมาณ 8,482,000 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 7,708,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.87 และคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวน 774,000.00 บาท รายละเอียดแยกภาคดังตารางต่อไปนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	ผลอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ใต้	5	397	7,146,000.00	7,146,000.00	-	100
เหนือ	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง(สำนักบ้านมั่นคง)	5	43	774,000.00	270,000.00	504,000.00	34.88
กรุงเทพปริมณฑล และ ตะวันออก	-	15	270,000.00	-	270,000.00	-
กลางและตะวันตก	1	-	-	-	-	-
ศปก.คลอง	1	18	292,000.00	292,000.00	-	100
รวม	12	473	8,482,000.00	7,708,000.00	774,000.00	90.87

2.4 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- **ปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.23 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47.07 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น และซื้อที่ดินสำหรับชุมชนใหม่คนไร้บ้าน (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 47.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของงบประมาณอนุมัติ คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป 4.17 ล้านบาท

- **ปีงบประมาณ 2561** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6.53 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58.77 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน กรุงเทพฯ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน อาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน งบประมาณอนุมัติรวม 58.77 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 37.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.12 ของงบประมาณอนุมัติ และปี 2561 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวน 21.08 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายปี ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบประมาณ	งบที่ได้รับอนุมัติ	ค่าบริหารจัดการ	คงเหลือดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	42,900,000	4,170,000	91.14
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	37,685,855	21,084,145	64.12
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	80,585,800	25,254,145	76.14
