

รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย

ณ เดือนกรกฎาคม 2562

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
 - 2.1 โครงการบ้านมั่นคง
 - 2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
 - 2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ
 - 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน
-
-

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2562

ตามทิศทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ด้วยการดำเนินแก้ไขที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักงานมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดินได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

1.1 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2562

ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พมจ. ปลัดอบต. ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดสกลนคร ณ ตำบลศรีวิชัย ตำบลหนองหัวช้าง ตำบลบึงโขงหลง ตำบลเซกา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ เยี่ยมเยียนถามข่าวผู้รับผลประโยชน์ และส่งมอบบ้านให้กับผู้เดือดร้อน



1.2 ลงพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบทในพื้นที่ภูมินิเวศน์อ่าว ก.ไก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คปอ.ปข.) ลงพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบท หลังได้รับการอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในบริเวณที่ดินป่าชายเลนและกรมเจ้าท่า ภูมินิเวศน์ อ่าว ก.ไก่ โดยใช้บ้านหนองเสม็ด (29 ครัวเรือน) เป็นพื้นที่นำร่อง 1 ใน 10 ชุมชน ก่อนขยายทิศการทำที่อยู่อาศัยทั้งเมืองร่วมกับคนในพื้นที่ท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการสร้างความเข้าใจระดับชุมชน สร้างคน สร้างกลุ่ม สร้างกองทุน และระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยชุมชนได้เรียนรู้จากกระบวนการ Workshop ออกแบบบ้าน วางระบบสาธารณูปโภคของชุมชนด้วยตนเอง

1.3 พอช. ร่วมจัดงาน Thailand Social Expo 2019



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “บ้านมั่นคงของมนุษย์ ชูชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว, การยกระดับบ้านที่มากกว่า บ้าน จากผลการทำงานโครงการพื้นที่สีเขียว, และการนำไปสู่เรื่องชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 5 ตำบล ซึ่งภายในโซนนิทรรศการยังมีการจำลองพื้นที่จริงของการทำพื้นที่สีเขียวแนวตั้ง มีวิทยากรให้ความรู้และการสาธิตในด้านต่างๆของพี่น้องขบวน

องค์กรชุมชน ซึ่งนำไปสู่เนื้อหาในห้องวิชาการทั้ง 3 วันที่ได้นำเสนอเรื่อง (1) ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (2) บ้านมั่นคง รากฐานของการพัฒนาที่อยู่อาศัย และ (3) เมืองสีเขียว โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังไม่น้อยกว่า 100 คน ต่อเวทีห้องวิชาการ



1.4 การจัดทำแผนการทำงานกองทุนรักษาดินรักษากันทั่วประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานกองทุนรักษาดินรักษากันลงพื้นที่จัดทำแผนกองทุนรักษาดินรักษากัน ทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 28 มิ.ย. 62 ที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว วันที่ 10 ก.ค. 62 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 ก.ค. 62 ที่เครือข่ายสลัมสี่ภาค วันที่ 13 ก.ค. 62 ที่ภาคเหนือ วันที่ 14 ก.ค. 62 ที่ภาคกลางและตะวันตก วันที่ 16 ก.ค. 62 ที่ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก และวันที่ 18 ก.ค. 62 ที่ภาคใต้ โดยคณะทำงานกองทุนรักษาดินรักษากันได้ลงพื้นที่ครบทุกภูมิภาคเพื่อกำหนดทิศทาง แผนการทำงาน โดยมีเป้าหมายในการสรุปและติดตามสถานะกองทุนเมือง แลกเปลี่ยนระบบการทำงานในภาค และติดตามสรุปประมวลผลการดำเนินงานกองทุน



1.5 เครือข่ายบ้านมั่นคงตำบลเกาะสุกรลงพื้นที่ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนพื้นที่รูปธรรมตำบลเขาแก้ว

ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายบ้านมั่นคงชนบทตำบลเกาะสุกร ผู้แทน อบต. สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการตำบล จากตำบลเกาะสุกร จังหวัดตรัง จำนวน 49 คน ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนพื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งจัดการตนเอง ที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป้าหมายของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็เพื่อให้ตำบลเกาะสุกรนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปพัฒนาเกาะสุกรให้เข้มแข็ง โดยใช้ธนาคารตำบลเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทุกมิติ ทั้งเรื่องทรัพยากร อาชีพ ที่ดิน และคนทำงานต่อไป ทั้งนี้แผนงานต่อไป ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน เพื่อร่วมออกแบบ พัฒนาระบบการเงิน และยกระดับสู่ธนาคารตำบลเกาะสุกรต่อไป



1.6 เวทีติดตามหนุนเสริมเพื่อการพัฒนาเครือข่ายบ้านมั่นคงภาคใต้

ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 สำนักงานภาคใต้ จัดเวทีติดตามหนุนเสริมเพื่อการพัฒนาเครือข่ายบ้านมั่นคง โดยมีผู้แทนจากภาคประชาสังคม ผู้แทนงานที่ดิน นักวิชาการ และผู้แทนเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองและชนบท จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมพีท บุติค จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งภายในงานได้เรียนเชิญ

นางสาวสมสุข บุญยะปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน มาร่วมเติมเต็มหลักคิด กระบวนการพัฒนาทุกมิติจากงานบ้านมั่นคง และร่วมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยภาคใต้ (ระยะ 3 เดือน 1 ปี และ 3 ปี) โดยจะเน้นน้ำหนักในเรื่องของการมีส่วนร่วม พื้นชุมชน พื้นเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพคนทำงาน จากการ Workshop ทำกิจกรรมร่วมกัน



1.7 กิจกรรม Workshop พื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลร่วมกับทุกส่วน/หน่วย จัดกิจกรรม Workshop เมืองยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อสำรวจข้อมูลและออกแบบชุมชนร่วมกับชุมชนทั้งเมือง จัดตั้งพื้นที่คณะทำงานในระดับเมือง สร้างการทำงานร่วมใน 18 ชุมชน โดยมีหน่วยงานภาคี สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่คอยหนุนเสริม นอกจากนี้ยังรวมทั้งการบรรลุเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพทีมงานบ้านมั่นคง ระหว่างขบวนองค์กรชุมชนและเจ้าหน้าที่ทั้ง 5 ภาค อีกด้วย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมถึง 160 คน



2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

2.1 รายงานสถานะของโครงการบ้านมั่นคง (ณ 31 กรกฎาคม 2562)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 90 โครงการ 31 จังหวัด 7,002 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 2,490 ครัวเรือน โครงการการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยชนบท 4,512 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 347.12 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 25.43 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2562 รวมทั้งสิ้น 372.56 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2562

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนที่อยู่อาศัย						ผลการอนุมัติงบประมาณระดมเงิน				รวมอนุมัติทั้งสิ้น
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครัวเรือน	จำนวนเงิน	กรอบงบ	โครงการ	จำนวนเงิน อนุมัติ	คงเหลือ งบดำเนินการ	
เหนือ	1,100	26	3	-	1,182	1,182	41,020,493.00	2,000,000		1,530,000	470,000	42,550,493.00
อีสาน	1,154	8	4	60	546	606	29,377,941.00	2,000,000	1	2,000,000	0	31,377,941.00
ใต้	1,149	18	6	823	534	1,357	54,945,721.00	2,000,000	4	2,000,000	0	56,945,721.00
กทม/ตะวันออก	1,800	11	5	1,061	927	1,988	129,444,865.00	2,000,000	1	2,000,000	0	131,444,865.00
กลางและตะวันตก	1,100	15	7	546	667	1,213	63,123,808.00	2,000,000	1	2,000,000	0	65,123,808.00
บ้านมั่นคง	1,500	12	6	-	656	656	29,216,420.00	34,000,000	6	15,904,000	18,096,000	45,120,420.00
รวม	7,803	90	31	2,490	4,512	7,002	347,129,248.00	44,000,000	13	25,434,000	18,566,000	372,563,248.00

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2562

ปีงบประมาณ 2562 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายกมาจากปี 2561 จำนวน 506.70 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2562 ทั้งสิ้น 372.56 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 879.26 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 104.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของงบประมาณเบิกจ่าย ระหว่างปีงบประมาณมีการคืนกรอบงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 197.47 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 577.62 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62)

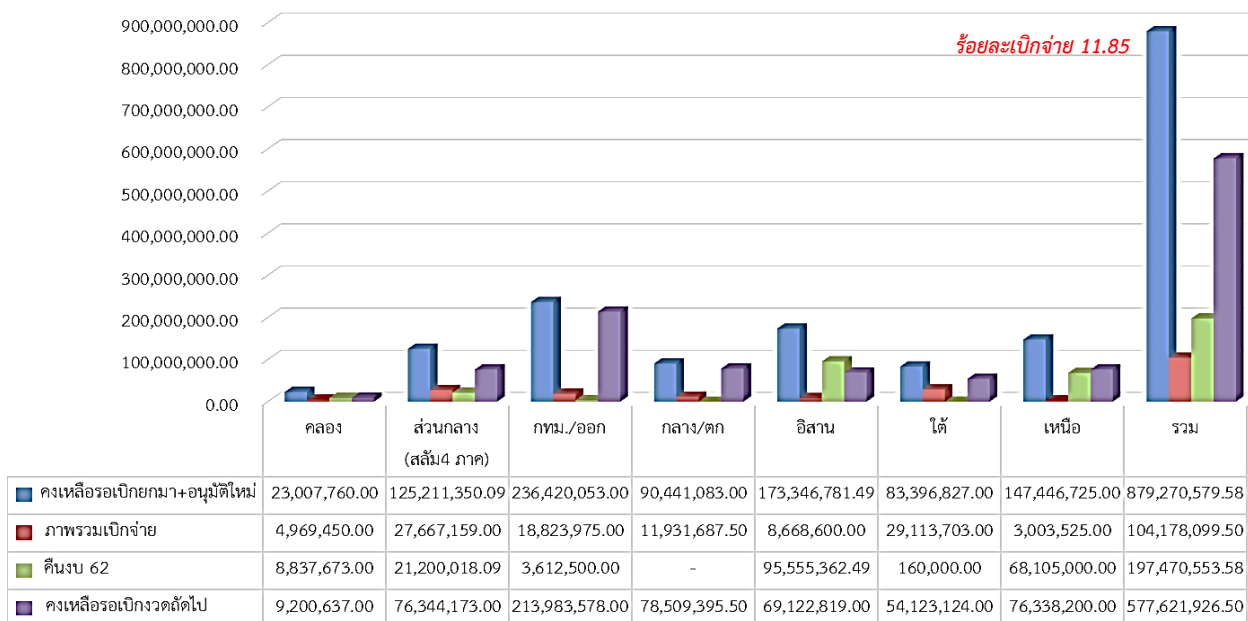

**รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการเดิม 2557-2559)
(งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)**

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ) มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 134.80 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายแล้ว 8.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของงบประมาณเบิกจ่าย ระหว่างดำเนินโครงการมีการคิ่งบประมาณ จำนวน 124.67 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 1.74 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62)

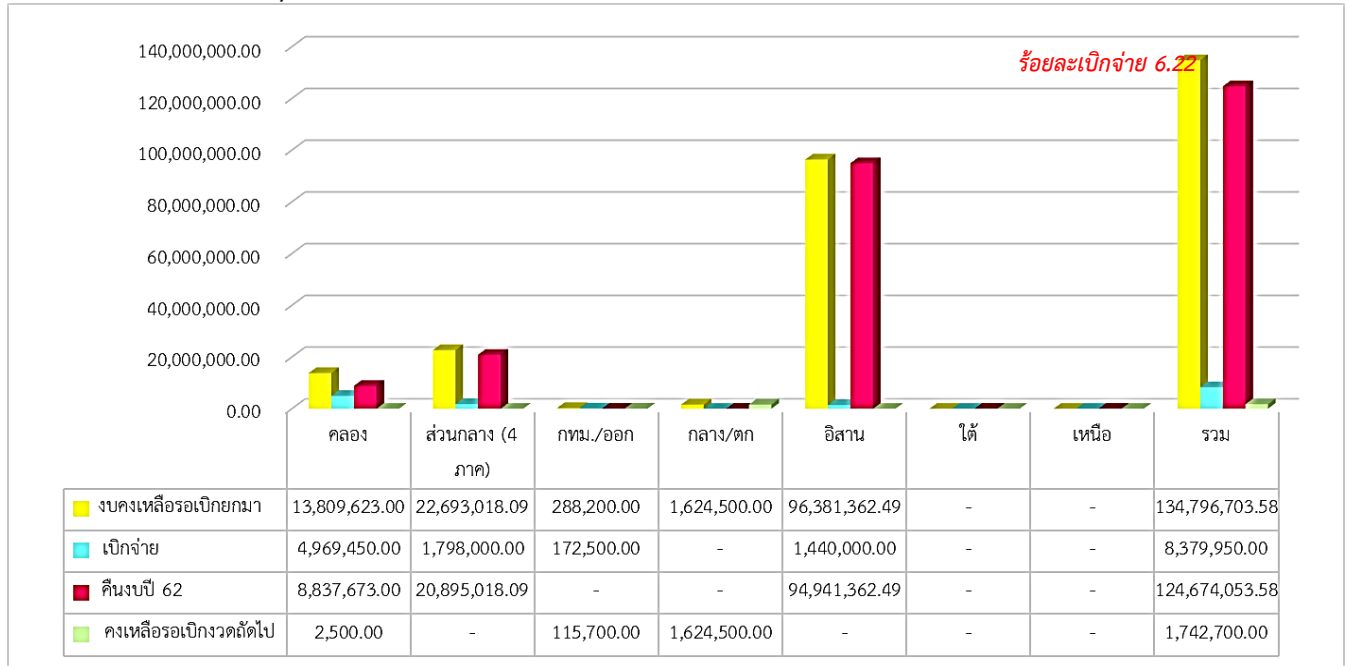

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 60.52 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 4.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 55.28 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคิ่งบประมาณจำนวน 874,000 บาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62)

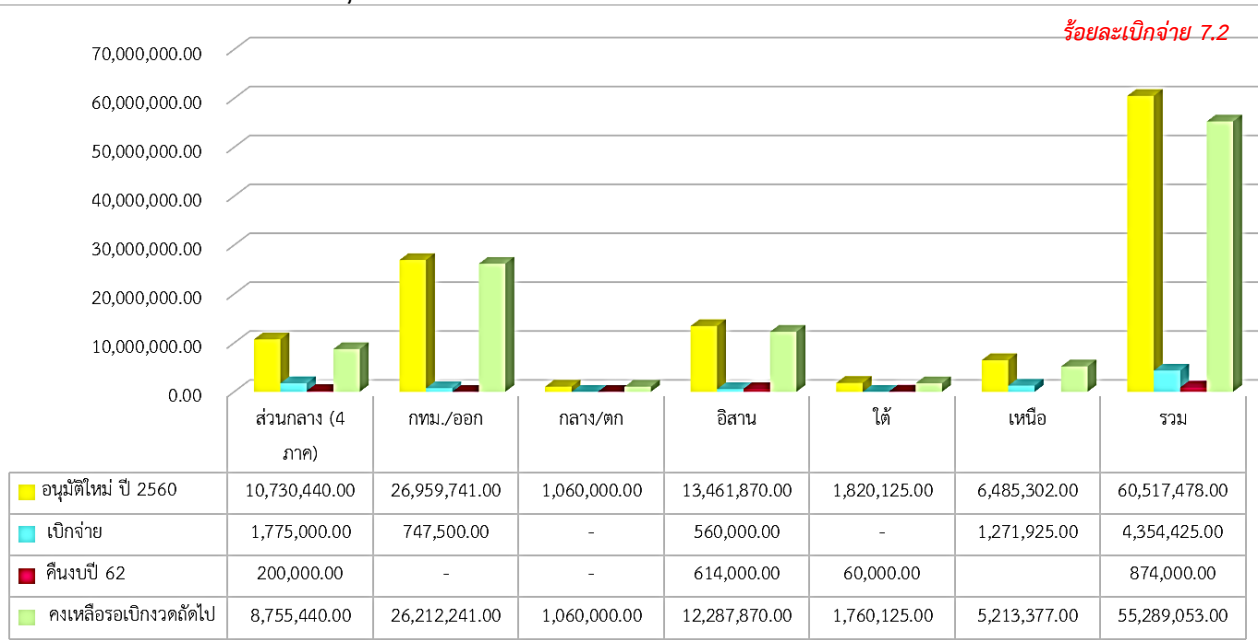

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2561 จำนวน 311.39 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.09 ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณจำนวน 71.92 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 192.48 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62)

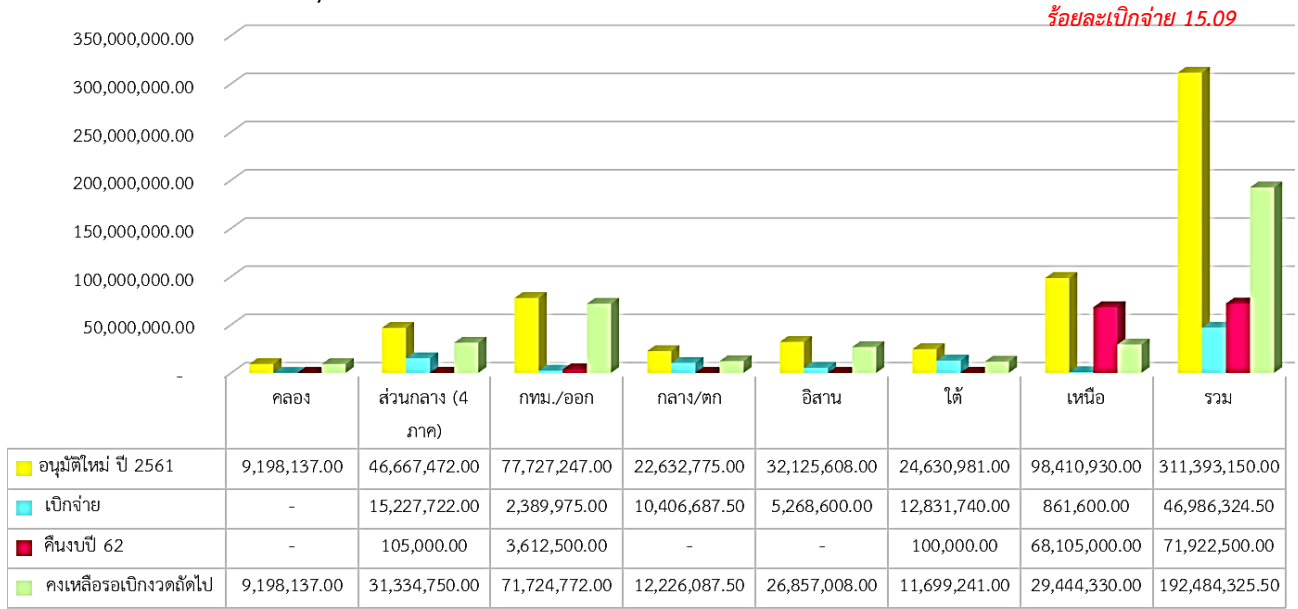

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

เป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครัวเรือนทั่วประเทศ ในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย และสนับสนุนภาคีพัฒนา อนุมัติงบประมาณรวม 372.56 ล้านบาท แต่ละภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น 44.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.93 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนั้น คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 328.11 ล้านบาท แยกรายภาคได้ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62)

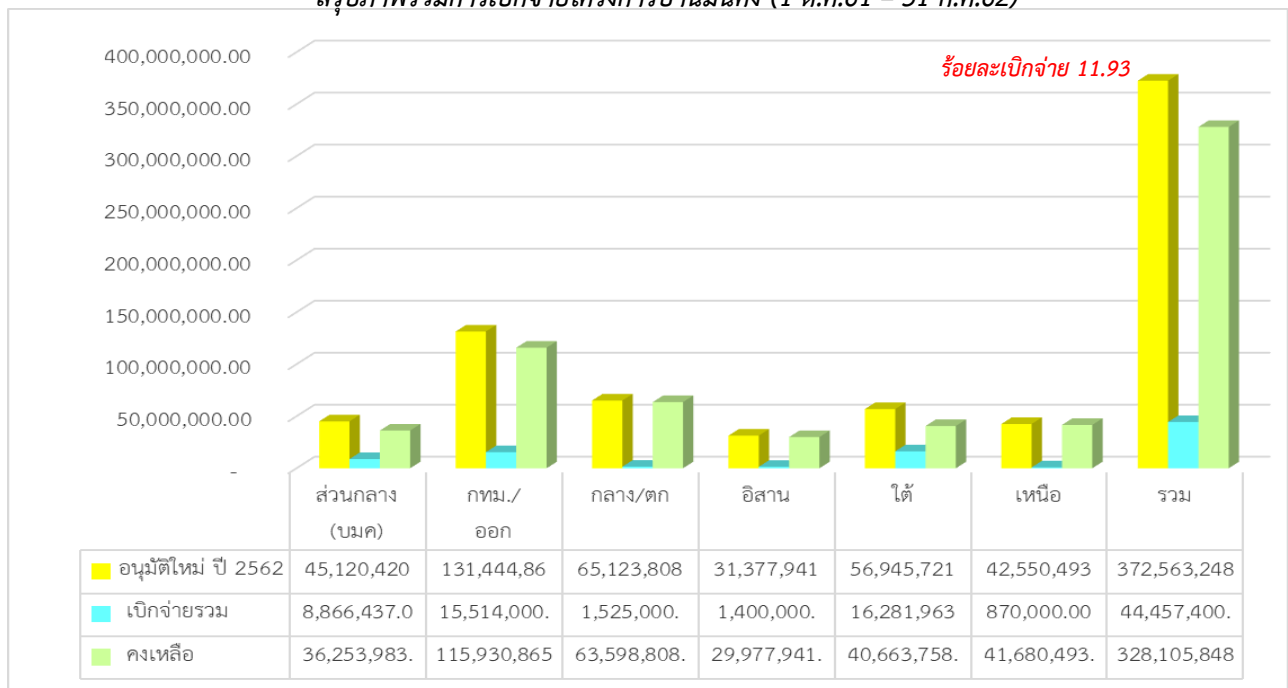

2.2 รายงานสถานะโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2562 (ณ 31 กรกฎาคม 2562)

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)


โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,524 โครงการ 12,550 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 228.70 ล้านบาท ในพื้นที่ 77 จังหวัด 1,455 ตำบล พร้อมทั้งผลการบันทึกข้อมูลในฐานระบบจำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรม				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	2,200	43,800,000	458	15	442	2,454	43,800,000.00	458	15	442	2,454	43,800,000.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	53,800,000	433	20	413	2,826	53,800,000.00	433	20	413	2,826	53,800,000.00
ภาคกลาง/ตก	2,200	43,900,000	328	16	311	2,584	43,900,000.00	328	16	311	2,584	43,900,000.00
ภาคทม/ออก	2,200	43,500,000	180	12	167	2,383	43,500,000.00	180	12	167	2,383	43,500,000.00
ภาคใต้	2,200	43,700,000	125	14	122	2,303	43,700,000.00	125	14	122	2,303	43,700,000.00
รวม	11,500	228,700,000	1,524	77	1,455	12,550	228,700,000.00	1,524	77	1,455	12,550	228,700,000.00

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรม จำนวน 228.70 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 200.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.68 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติ และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 28.17 ล้านบาท จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	จำนวนโครงการ	จำนวนครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ภาคเหนือ	2,200	458	2,454	43,800,000.00	42,348,629.00	1,451,371.00	96.69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	432	2,826	53,800,000.00	47,317,166.00	6,482,834.00	87.95
ภาคใต้	2,200	125	2,303	43,700,000.00	33,854,300.00	9,845,700.00	77.47
ภาคทม/ออก	2,200	180	2,383	43,500,000.00	37,616,816.00	5,883,184.00	86.48
ภาคกลาง/ตก	2,200	328	2,584	43,900,000.00	39,391,256.00	4,508,744.00	89.73
รวม	11,500	1,523	12,550	228,700,000.00	200,528,167.00	28,171,833.00	87.68

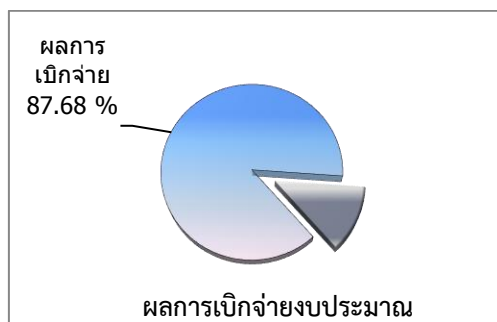

2.3 รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ณ 31 กรกฎาคม 2562

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2562กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 4,452 ครั้วเรือน วงเงินรวม 80.13 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน 8.01 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงานทั้งสิ้น 72.12 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้รวมทั้งสิ้น 42.90 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินการ วงเงิน 29.21 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกตามปีงบประมาณ ดังตารางต่อไปนี้

รับเงินงบประมาณจากรัฐ

ปีที่อนุมัติ	รหัส	เป้าหมาย ครั้วเรือน	งบรับจากรัฐ	บริหารจัดการ 10%	งบดำเนินการ	คก.	ครั้วเรือน	อนุมัติทั้งสิ้น	คงเหลือ ดำเนินการ
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000	2,106,000	18,954,000	34	1,581	18,570,447	383,553
ปี 2560	84500	1,082	19,477,500	1,947,750	17,529,750	36	1,040	17,459,346	70,404
ปี 2561	84800	1,200	21,600,000	2,160,000	19,440,000	7	382	6,876,000	12,564,000
ปี 2562	84900	1,000	18,000,000	1,800,000	16,200,000		-	-	16,200,000
รวม		4,452	80,137,500	8,013,750	72,123,750	77	3,003	42,905,793	29,217,957

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2562

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนองค์กรชุมชนได้จำนวน 3,003 ครั้วเรือน 77 โครงการ วงเงินอนุมัติรวม 42.90 ล้านบาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,449 ครั้วเรือน เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 35.36 ล้านบาท และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 7.31 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณวงเงิน 226,000 บาท และคืนครั้วเรือนจำนวน 21 ครั้วเรือน แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ปีที่อนุมัติ	เป้าหมาย ครั้วเรือน	ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมการ อนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คืนงบประมาณ	คงเหลือรอ เบิกจ่าย
		โครงการ	ครั้วเรือน				
ปี 2559	1,170	34	1,560	18,570,447.00	15,086,447	226,000	3,258,000
ปี 2560	1,082	36	1,040	17,459,346.00	14,946,000	-	2,513,346
ปี 2561	1,200	7	382	6,876,000.00	5,328,000	-	1,548,000
ปี 2562	1,000	0	-	-	-	-	-
รวม	4,452	77	2,982	42,905,793.00	35,360,447	226,000	7,319,346

รายงานสรุปผลการอนุมัติโครงการปี 2562

ผลการอนุมัติงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 สามารถสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล้รื้อ ได้ทั้งสิ้น 25 โครงการ 700 ครั้วเรือน งบประมาณอนุมัติ 12.36 ล้านบาท เบิกจ่าย 8.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.95 และคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวน 3.46 ล้านบาท รายละเอียดแยกรายภาคดังตารางต่อไปนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

ภาค	โครงการ	ครั้วเรือน	ผลอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
ใต้	5	397	7,146,000.	7,146,000	-	100
กลางและตะวันตก	1	19	342,000	-	342,000	-
ส่วนกลาง(สำนักบ้านมั่นคง)	7	102	1,836,000	774,000	1,062,000	42.16
กรุงเทพปริมณฑล และ ตะวันออก	4	41	726,810	684,000	42,810	94.10
ตะวันออกเฉียงเหนือ	7	123	2,020,536	-	2,020,536	-
ศปก.คลอง	1	18	292,000	292,000	-	100
รวม	25	700	12,363,345	8,896,000	3,467,346	71.95

2.4 รายงานสถานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ณ 31 กรกฎาคม 2562

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- **ปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.23 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47.07 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น และซื้อที่ดินสำหรับชุมชนใหม่คนไร้บ้าน (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 47.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของงบประมาณอนุมัติ คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป 4.17 ล้านบาท

- **ปีงบประมาณ 2561** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6.53 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58.77 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.กรุงเทพฯ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน อาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน งบประมาณอนุมัติรวม 58.77 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 38.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.85 ของงบประมาณอนุมัติ และปี 2561 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวน 20.07 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยก รายปี ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบประมาณ	งบที่ได้รับอนุมัติ	ค่าบริหารจัดการ	คงเหลือดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	42,900,000	4,170,000	91.14
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	38,698,080	20,071,920	65.85
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	81,598,000	24,241,920	77.10
