

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

บันทึกข้อความ

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

จาก บริหารงานทั่วไป

☎ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ โทร. 0-2378-8300 ต่อ 8628

ถึง ผอ./รอง ผอ.

เรื่อง รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ที่ ทค68/3074

ชุมชนริมคลอง ประจำปีเดือนธันวาคม 2564


วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ

ตามที่ สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายเลขานุการทุกโครงการ รับผิดชอบ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานสถานะโครงการรายเดือนและรายไตรมาส ทั้งส่วนของการ เบิกจ่ายงบประมาณ และความคืบหน้าผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ และรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) นั้น


ในการนี้ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการ ได้จัดทำรายงาน สถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ซึ่งใช้งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ 2560-2564 ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565 และรายงานความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร ประจำปีเดือนธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพัชรินทร์ จริงสุระ)
บริหารงานทั่วไป

เรียน รองผู้อำนวยการ
โปรดเสนอผู้อำนวยการ

เรียน ผู้อำนวยการ
เพื่อโปรดทราบ


(นายสุริยะบุรุษ สดแสงจันทร์)
หัวหน้างานฯ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง


(นายธวัช นฤพรพงศ์)
รองผู้อำนวยการ


(นายปฏิภาณ จุมผา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการ

- 6 ม.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2564 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขตพื้นที่ปฏิบัติการ (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองกลาง) และจังหวัดปทุมธานี โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 7,602 ครั้วเรือน 400,816,009.10 บาท

การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ..ครั้วเรือน...บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน...ครั้วเรือน...บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน...บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20,256,830.10 บาท ส่งผลให้ ณ 30 ธันวาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 380,559,179 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบประมาณ	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
คลองลาดพร้าว											
เขตสายไหม/ดอนเมือง หลักสี่/บางเขน	13,617,067.00	2,064	-	-	2,064	-	-	-	-		13,617,067.00
เขตจตุจักร/ห้วยขวาง วังทองกลาง	69,392,779.00	1,813	-	-	1,813	-	-	-	-		69,392,779.00
คลองเปรมประชากร											
เขตดอนเมือง	135,159,725.00	1,113	-	-	1,113	-	-	-	16,207,250.00		118,952,475.00
เขตหลักสี่/จตุจักร	153,288,353.10	1,828	-	-	1,828	-	-	-	4,049,580.10		149,238,773.00
จังหวัดปทุมธานี	29,358,085.00	784	-	-	784	-	-	-	-		29,358,085.00
รวม	400,816,009.10	7,602	-	-	7,602	-	-	-	20,256,830.10	5.05	380,559,179.00

การดำเนินงานของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

① โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ปี 2560

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2564 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 3,877 ครั้วเรือน 83,009,846 บาท

การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน...บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน...บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน...บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน...บาท ส่งผลให้ ณ 30 ธันวาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 83,009,846 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณ คงเหลือ	ครุวีเรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบ ระหว่างปี	คืนงบ/ ยกเลิก	รับโอน เงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตสายไหม/ดอนเมือง หลักสี่/บางเขน	13,617,067	2,064	-	-	2,064	-	-	-	-	-	13,617,067
เขตจตุจักร/ห้วยขวาง วังทองหลาง	69,392,779	1,813	-	-	1,813	-	-	-	-	-	69,392,779
รวม	83,009,846	3,877	-	-	3,877	-	-	-	-	-	83,009,846

- 1) โครงการ/ชุมชน/ครุวีเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว
 - จำนวน 24 โครงการ 2,060 ครุวีเรือน รวมทั้งสิ้น 261,540,450 บาท
- 2) โครงการ/ชุมชน/ครุวีเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
 - จำนวน 20 โครงการ 1,817 ครุวีเรือน เบิกจ่าย 197,060,746 บาท คงเหลือ 83,009,846 บาท

๒) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ปี 2562-2564

2.1 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 927 ครุวีเรือน 42,476,310 บาท

การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน.....ครุวีเรือน จำนวนเงิน.....บาท มีการคืน/ยกเลิกครุวีเรือน จำนวน....ครุวีเรือน จำนวนเงิน.....บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน.....บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน...บาท ส่งผลให้ ณ 30 ธันวาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 5,873,250 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณ คงเหลือ	ครุวีเรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบ ระหว่างปี	คืนงบ/ ยกเลิก	รับโอน เงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตจตุจักร	4,735,000	583	-	-	583	-	-	-	-	-	4,735,000
จังหวัดปทุมธานี	1,138,250	344	-	-	344	-	-	-	-	-	1,138,250
รวม	5,873,250	927	-	-	927	-	-	-	-	-	5,873,250

- 2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครุวีเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว
 - จำนวน 2 โครงการ 486 ครุวีเรือน รวมทั้งสิ้น 75,999,000 บาท
- 2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครุวีเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
 - จำนวน 2 โครงการ 441 ครุวีเรือน เบิกจ่าย 63,412,110 บาท คงเหลือ 5,873,250 บาท

2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563-2564 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 2,798 ครั้วเรือน 311,932,913.10 บาท

การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน...บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน.....ครั้วเรือน จำนวนเงิน.....บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวนบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน 20,256,830.10 บาท ส่งผลให้ ณ 30 ธันวาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 291,676,083...บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตดอนเมือง	135,159,725.00	1,113	-	-	1,113	-	-	-	16,207,250.00		118,952,475.00
เขตหลักสี่/จตุจักร	148,553,353.10	1,245	-	-	1,245	-	-	-	4,049,580.10		144,503,773.00
จังหวัดปทุมธานี	28,219,835.00	440	-	-	440	-	-	-	-		28,219,835.00
รวม	311,932,913.10	2,798	-	-	2,798	-	-	-	20,256,830.10	6.49	291,676,083.00

2.3.1 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

- จำนวน 11 โครงการ 1,457 ครั้วเรือน เบิกจ่าย 149,448,252 บาท คงเหลือ 84,786,338 บาท

2.3.2 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

- จำนวน 10 โครงการ 1,341 ครั้วเรือน คงเหลือ 206,889,745 บาท

❖ ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ ซึ่งองค์กรชุมชนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงาน เกิดความล่าช้าหรือมีข้อติดขัดเรื่องการก่อสร้างบ้านใหม่และระบบสาธารณูปโภค โดยมีสาเหตุจาก

1. มีบางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดหรือชะลอการดำเนินการตามแผนงาน เนื่องจากขาดความมั่นใจในความชัดเจนของแผนการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งหยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562

2. มีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน ทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งชุมชนตามแผนงาน หรือต้องแบ่งการก่อสร้างเป็นเฟส ๆ ตามพื้นที่รื้อย้ายได้จริง รวมถึงมีนักกฎหมายนอกพื้นที่หรือในบางกรณีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นให้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือชักจูงให้ประชาชนคัดค้านโครงการ

3. การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ไม่ยอมรื้อบ้านใช้ระยะเวลานาน ไม่สามารถใช้ผลทางคดีไปเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการได้ หรือใช้บังคับให้กลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมสามารถรื้อย้ายบ้านเพื่อเปิดพื้นที่การก่อสร้างได้

❖ ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินได้ตามแผนงาน โดยมีผลกระทบดังนี้

1. ชุมชนริมคลองเปรมประชากรมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายโดยระบบสหกรณ์เพื่อให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยโควิด-19 ส่งผลให้ชุมชนไม่สามารถนัดหมายการประชุมและรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนได้ ทำให้ไม่สามารถประชุมจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ตามระเบียบสหกรณ์

2. ในบางชุมชนมีคณะกรรมการหรือสมาชิกชุมชนติดเชื้อโควิด-19 หรือเสียชีวิต ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงบัญชีในการเบิกจ่าย จึงต้องนัดหมายประชุมเพื่อจัดทำมติชุมชนและดำเนินการตามขั้นตอนทางธนาคาร

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีแนวทางการดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. ติดตามการประกาศของทางภาครัฐ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนให้มีความเหมาะสมกับปัญหาความเดือดร้อน อาทิ การปรับเปลี่ยนผู้ทรงบัญชี

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ เพื่อหารือการปรับรูปแบบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยการใช้ระบบออนไลน์ในการประชุม เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการงานต่อไปได้

3. กรณีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ จะได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เสนอต่อคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะของคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะ (รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ /ประธานคณะกรรมการฯ) ดังนี้

3.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครและรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม

3.2 คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

3.3 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง โดยมีอัยการสูงสุดเป็นประธาน และมีรองผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

3.4 คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

รายงานความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑. ความคืบหน้าการดำเนินงาน

๑.๑ คลองลาดพร้าว


กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ ๕๐ ชุมชน ๗,๐๖๙ ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ดำเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็น ๕ พื้นที่ ๗ เขต คือ พื้นที่ ๑ เขตสายไหม ๑,๔๕๔ ครัวเรือน พื้นที่ ๒ เขตหลักสี่และดอนเมือง ๑,๓๕๖ ครัวเรือน พื้นที่ ๓ เขตบางเขน ๑,๔๖๙ ครัวเรือน พื้นที่ ๔ เขตจตุจักร ๑,๒๘๓ ครัวเรือน และพื้นที่ ๕ เขตห้วยขวางและวังทองหลาง ๑,๕๐๗ ครัวเรือน

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว ๓๕ ชุมชน ๓,๕๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๒ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓,๐๗๒ ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๑๙๐ ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน ๒๗๔ ครัวเรือน

ตารางแสดงความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน)
(สามารถดำเนินการเพิ่มขึ้นรวม - ครัวเรือน)

ผลการดำเนินงาน (ครัวเรือน)	พ.ศ. ๒๕๖๔			
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๓,๐๖๕	๓,๐๖๕	๓,๐๗๒	๓,๐๗๒
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	๑๙๔	๑๙๔	๑๙๐	๑๙๐
- พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	๒๗๗	๒๗๗	๒๗๔	๒๗๔
รวม	๓,๕๓๖	๓,๕๓๖	๓,๕๓๖	๓,๕๓๖
คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๒	๕๐.๐๒	๕๐.๐๒	๕๐.๐๒
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (ครัวเรือน)	-	-	-	-

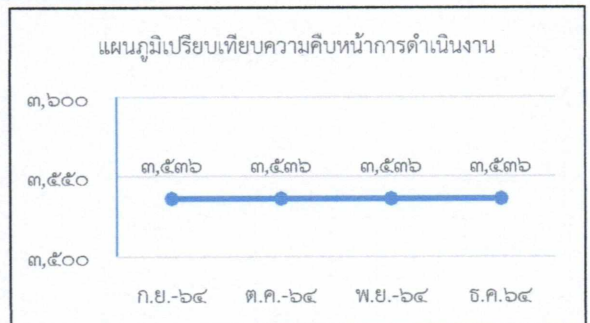

แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินงานในระยะต่อไปคาดว่าจะสามารถวางแผนการดำเนินการรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่ได้เมื่อมีความชัดเจนเรื่องแผนการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประเมินพื้นที่ชุมชนที่มีความพร้อมดำเนินโครงการตามเงื่อนไขของชุมชน คือ จะดำเนินการรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่ไปพร้อมกับการก่อสร้างเขื่อน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๙ ชุมชน ประมาณ ๓๐๐ ครัวเรือน (กรณีไม่มีการก่อสร้างเขื่อนคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้เพิ่มเติมตามแผนงานที่ประเมินไว้)

๑.๒ คลองเปรมประชากร


กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) เมื่อมิถุนายน ๒๕๖๑ คือ มีผู้รื้อกล้าลำน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น ๓๘ ชุมชน ๖,๓๘๖ ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร) จำนวน ๓๒ ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๖ หมู่

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว ๕ ชุมชน ๗๗๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๑๖ ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕๕๒ ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน ๖ ครัวเรือน

ตารางแสดงความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน)
(สามารถดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม ๑๑ ครัวเรือน)

ผลการดำเนินงาน (ครัวเรือน)	พ.ศ. ๒๕๖๔			
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑๙๖	๑๙๖	๑๙๖	๒๑๖
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	๔๗๒	๔๗๒	๔๙๒	๕๕๒
- พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	๙๕	๙๕	๘๖	๖
รวม	๗๖๓	๗๖๓	๗๗๔	๗๗๔
คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๙๕	๑๑.๙๕	๑๒.๑๒	๑๒.๑๒
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (ครัวเรือน)	-	-	๑๑	-

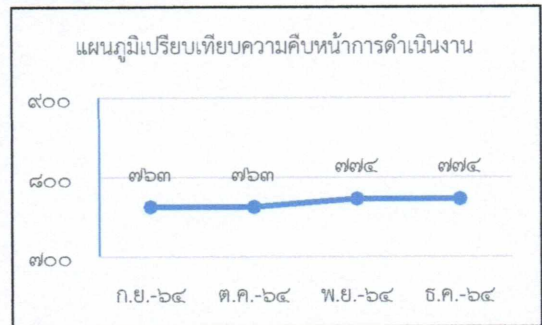

แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินงานในระยะต่อไปมีแผนการรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่ได้ในพื้นที่ ๑๗ ชุมชน ดังนี้

๑. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์ จำกัด เขตดอนเมือง
๒. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด เขตดอนเมือง
๓. สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด เขตดอนเมือง
๔. สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด เขตดอนเมือง
๕. สหกรณ์เคหสถานประชากร ๓ จำกัด เขตดอนเมือง
๖. สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด เขตดอนเมือง
๗. สหกรณ์เคหสถานวัดดอนเมืองด้านเหนือ จำกัด เขตดอนเมือง
๘. สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ ๕ จำกัด เขตดอนเมือง
๙. สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด เขตหลักสี่
๑๐. สหกรณ์เคหสถานพัฒนา ๙๙ มีสุขร่วมใจ จำกัด เขตหลักสี่
(ดำเนินการธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕)
๑๑. สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด เขตหลักสี่
(ดำเนินการธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕)

- ๑๒. สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด เขตหลักสี่
- ๑๓. สหกรณ์เคหสถานร่วมพัฒนา จำกัด เขตหลักสี่
- ๑๔. สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชา จำกัด เขตหลักสี่
- ๑๕. สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด เขตจตุจักร
- ๑๖. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด (หมู่ ๗)
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
- ๑๗. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด (หมู่ ๗)
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

๒. การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้าลำน้ำสาธารณะ

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คลี่คลายปัญหาข้อติดขัดและประชาสัมพันธ์โครงการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ๔ คณะ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุม รายละเอียดดังนี้

การประชุมคณะกรรมการ	สาระสำคัญในการประชุม
<p>การประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ประธานในการประชุม : อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด)</p> <p>คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงภารกิจสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ริมคลอง และเพื่อให้ประชาชนได้ "รู้เข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปใช้ประโยชน์" ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพของคลองในกรุงเทพมหานครและชีวิตของคนริมคลองให้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป โดยการประชาสัมพันธ์มีปัจจัยหลักในการพัฒนา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. น้ำในลำคลองใสสะอาด ๒. ลำคลองใช้เป็นเส้นทางในการระบายน้ำ ๓. ใช้เป็นทางเลือกในการสัญจร-ระบบขนส่ง ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนริมคลอง <p>กำหนดการประชุมครั้งต่อไป : ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p style="text-align: right;">/ การประชุม ...</p>

การประชุมคณะอนุกรรมการ	สาระสำคัญในการประชุม
<p>การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ประธานในการประชุม : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชจิต ชัชวานิชย์)</p> <p>คณะอนุกรรมการได้พิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยประธานได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้เร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทฯ ให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมวางแผนการจัดกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในพื้นที่ที่โครงการบ้านมั่นคงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและชุมชนที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ</p>
<p>การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ประธานในการประชุม : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแผนการดำเนินงานระยะต่อไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คลองลาดพร้าวซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างเขื่อนหยุดดำเนินการและส่งผลถึงการก่อสร้างบ้าน โดยประธานได้มีข้อสั่งการให้มีการจัดชุดลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ เจรจากับผู้ต่อต้านเป็นรายหลัง และดำเนินการไปพร้อมกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์คือ ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำและที่อยู่อาศัย - คลองเปรมประชากรได้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานซึ่งยังคงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของแผนงาน ทั้งนี้ประธานได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานอนุกรรมการรับดำเนินการกรณีโครงการมีปัญหาเรื่องระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาทำให้บางชุมชนดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนงาน อาทิ การพิจารณาอนุญาตเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ การดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิมของการประปาและการไฟฟ้า ฯลฯ
<p>คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง</p>	<p>ประธานในการประชุม : อัยการสูงสุด</p> <p>-ยังไม่กำหนดให้มีการประชุม-</p>

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>๓.๑ มีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมหรือบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชนทำให้บางชุมชนไม่สามารถดำเนินการได้ หรือบางชุมชนไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชนต้องดำเนินการตามระยะที่สามารถหรือย้ายบ้านได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คลองลาดพร้าวมีผู้ไม่เข้าร่วมประมาณ ๑,๔๐๐ ครัวเรือน ส่งผลให้กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๒,๐๐๐ ครัวเรือนไม่สามารถก่อสร้างบ้านใหม่ได้ - คลองเปรมประชากรมีแกนนำชุมชนคัดค้านโครงการ ๗๒ ราย (ประเมินเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๔) ส่งผลให้ประชาชนรวม ๑,๖๙๖ ครัวเรือนไม่เข้าร่วมโครงการ โดยมีบางชุมชนไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการได้ อาทิ ชุมชนคนรักถิ่น ชุมชนเปรมสุขสันต์ เขตหลักสี่ ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร เขตดอนเมือง ฯลฯ นอกจากนี้ มีการรวมตัวกันปิดล้อมพื้นที่งานก่อสร้าง (ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว เขตหลักสี่) ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านใหม่ได้ตามแผนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการแล้ว โดยได้เสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดชุดเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่กับกองทัพภาคที่ ๑ กทม. (สำนักงานเขต) พอช. กรมธนารักษ์และหน่วยงานอื่น ๆ และให้มีการดำเนินการทางกฎหมายกรณีมีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย (กรณีต้องใช้มาตรการทางกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลองต่อไป) - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์บูรณาการโครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจโครงการและรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว - ในส่วนของผู้คัดค้านคลองเปรมประชากรจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะทำงานเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการรुक้าลำน้ำสาธารณะและพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร (แต่งตั้งโดยปลัดกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งที่ ๒๖๓๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีองค์ประกอบเป็นคณะทำงานในระดับเขต ๓ คณะ คือ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง)
<p>๓.๒ ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับความเร่งด่วนของแผนงานชุมชน เช่น การพิจารณาอนุญาตเช่าที่ดินและอนุญาตก่อสร้างของกรมธนารักษ์ การอนุญาตก่อสร้างของสำนักงานเขต การรื้อย้ายระบบไฟฟ้าประปาเดิมและวางระบบใหม่ของการประปาและการไฟฟ้า เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมธนารักษ์ สำนักงานเขต เทศบาลหลักหก กปน. กพน. กปภ. กพภ. และพอช. เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงานและกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
<p>๓.๓ การรังวัดสอบเขตที่ดินใน บางชุมชนในพื้นที่คลองเปรมประชาราษฎร์ โดยบางชุมชนที่มีปัญหาขอบเขตที่ดินไม่ชัดเจน/ทับซ้อน อาทิ ชุมชนมิตรประชาพัฒนา ชุมชนเทวสุนทร เขตหลักสี่ ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ เขตดอนเมือง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน สนน. และสำนักงานเขตพื้นที่ เร่งรัดดำเนินงานให้มีข้อสรุปโดยเร็ว

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>๓.๔ การดำเนินงานบางชุมชนในพื้นที่คลองเปรมประชากร มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ปรากฏในแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานฯ ส่งผลให้ยังมีข้อพิพาทเรื่องการรังวัดขอบเขตที่ดิน และไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาคลองเปรมประชากร เพื่อปรับแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานฯ ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับการดำเนินงานจริงแล้ว โดยเสนอขอปรับแผนแม่บทฯ รวม ๖ ชุมชน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ ๒) ชุมชนแจ้งวัฒนะ ๕ เขตหลักสี่ ๓) ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ เขตดอนเมือง ๔) ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ เขตดอนเมือง ๕) ชุมชนร่วมพัฒนา เขตดอนเมือง ๖) ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร เขตดอนเมือง
<p>๓.๕ การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ไม่ยอมรับบ้านใช้ระยะเวลาานาน ไม่สามารถใช้ผลทางคดีไปเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการได้</p> <p>- คลองลาดพร้าว โดย กทม. ได้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ (ปว.๔๔) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ดำเนินการรวม ๕ ๓๓ ราย และสำนักงานเขตได้ใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการทางกฎหมายแล้วจำนวน ๗๓ ราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ศาลได้พิพากษาคดีแล้ว ๒๖ คดี</p> <p>- คลองเปรมประชากร ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีได้ดำเนินการทางกฎหมาย จำนวน ๓ ราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีสมาชิกยินยอมรื้อย้ายแล้ว ๒ ราย และสหกรณ์ของชุมชนได้ดำเนินการฟ้องร้องแล้ว ๓ ราย</p>	<p>- ร่วมกับฝ่ายเลขานุการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป</p>


ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>๓.๖ บางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าว หยุดดำเนินการตามแผนงาน เพราะขาดความมั่นใจในความชัดเจนของแผนการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งหยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการแล้ว</p> <p>- ประสานแผนงานร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รวมถึงการเสนอแนวทางการดำเนินการต่อคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการรुकล้ำล้ำน้ำ สาธารณะและพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองลาดพร้าว ของ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ</p>



(นางสาวทชชกร ศิลพรหม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลอาวุโส
ผู้จัดทำ



(นางสาวณัฐสา ใจชื่น)
หัวหน้างานบริหารสำนักงาน
ผู้ตรวจสอบ



(นายสุริยะบุตร สดแสงจันทร์)
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ผู้ตรวจสอบ



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
ใบติดต่อกงานภายใน

๕๖๐๐๒ (๐๖๖๖)

จาก	สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนรวมพลัง
ลงนาม	น.ส.พัชรินทร์ จิวเจริญ
วันที่	30 ธ.ค. 2564

เลขที่	เพื่อ	ลงนาม	วันที่
1	พนักงานบริหารส่วนกลาง	น.ส.พัชรินทร์	4 ม.ค. 2565
2	พนักงานบริหารส่วนกลาง	น.ส.พัชรินทร์	5 ม.ค. 2565
3	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร (น.ส.พัชรินทร์)	น.ส.พัชรินทร์	6 ม.ค. 2565
4	ผู้อำนวยการ	น.ส.พัชรินทร์	6 ม.ค. 2565
5			
6			

- | | |
|---|----------------------|
| 1. โปรดทราบ <input type="checkbox"/> และผ่านต่อไป | 8. โปรดตรวจแก้ |
| 2. โปรดพิจารณา | 9. โปรดให้ข้อคิดเห็น |
| 3. โปรดอนุมัติ | 10. ขอส่งคืน |
| 4. โปรดสั่งการ | 11. โปรดเก็บเรื่อง |
| 5. โปรดลงนาม | 12. อื่น ๆ..... |
| 6. โปรดดำเนินการ | |
| 7. โปรดเสนอ.....ผอ.พอช.....ลงนาม | |

เรียน ผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ /พนักงานบริหารส่วนกลาง

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนรวมพลัง ได้จัดทำขบวน สภานโยบายการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยและชุมชนรวมพลัง ประจำปี 2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2560-2564)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
