

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด (ตัวชี้วัดร่วม)


1. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2568

(กลุ่มโครงการใหม่)

1.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2568 มีเป้าหมายดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายปีในพื้นที่คลองเปรมประชากร จำนวน 70 ครัวเรือน วงเงินรวม 12,320,000 บาท (สิบสองล้านบาทสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 1,047,200 บาท และงบสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชน 11,272,800 บาท

การดำเนินการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 มีการพิจารณาและเห็นชอบงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 2 โครงการ 70 ครัวเรือน งบประมาณ 11,010,000 บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 9,642,370 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.58 ของงบประมาณที่อนุมัติ และคงเหลือรอเบิกจ่าย 1,367,630 บาท ดังนี้

องค์กรชุมชน	อนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย
	ครัวเรือน	จำนวนเงิน		
1.สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	60	9,540,000.00	8,672,370.00	867,630.00
2.สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	10	1,470,000.00	970,000	500,000.00
	70	11,010,000.00	9,642,370.00	1,367,630.00

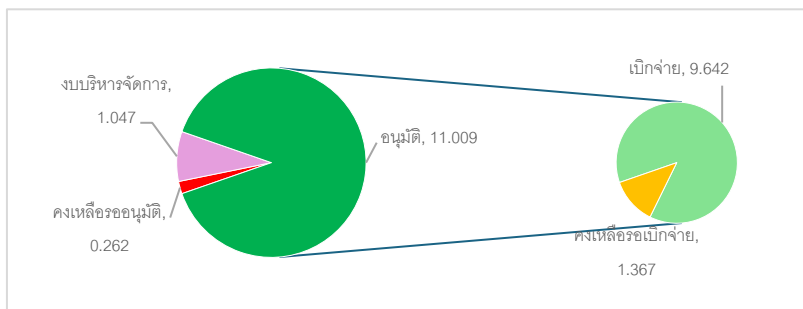

ทั้งนี้ คงเหลืองบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวน 262,800 บาท




ชุมชนร่มไทรงาม
ก่อสร้างเสร็จ 28 ครัวเรือน ระหว่างสร้าง 160 ครัวเรือน



ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา
ก่อสร้างเสร็จ 93 ครัวเรือน ระหว่างสร้าง 93 ครัวเรือน และเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง 8 ครัวเรือน

1.2 ภาพรวมการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนา รวม 12 โครงการ 173 ครัวเรือน งบประมาณ 34,983,957 บาท โดยเบิกจ่ายแล้ว 21,283,112 บาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของงบประมาณที่อนุมัติ และคงเหลือรอเบิกจ่าย 13,700,845 บาท ดังนี้




ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	ปีงบ	(ณ 1 ต.ค. 67)		ดำเนินการปี 2568 (กลุ่มใหม่ อนุมัติ 2568)			ร้อยละการ เบิกจ่าย	
		คงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อ		อนุมัติระหว่างปี		คงเหลือรอเบิกจ่าย		
		คร่าวเรือน	วงเงินอนุมัติได้	คร่าวเรือน	จำนวนเงิน			
งบโครงการบ้านมั่นคง	2559	-	-		1,049,552	1,049,552	-	100.00
งบสนับสนุนการพัฒนาฯ และงบช่วยเหลือฯ	2560	1,709	296,702,077	78	12,365,875	375,980	11,989,895	3.04
1. งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลอง		1,709	142,972,239.00	78	5,616,000	-	5,616,000	
2. งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง		-	153,729,838.00		6,749,875	375,980	6,373,895	
3. งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง	2561	-	4,815,396.54	-	4,392,000	4,239,000	153,000	96.52
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2563	326	30,946,372.00	25	6,166,530	5,976,210	190,320	96.91
5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2564	980	158,977,776.00				-	
6. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2565	200	32,971,840.00				-	
7. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2566	100	16,485,900.00				-	
8. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2567	-	1,075,144.00				-	
9. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2568	70	12,320,000.00	70	11,010,000	9,642,370	1,367,630	87.58
รวมทั้งสิ้น		3,385	554,294,505.54	173	34,983,957	21,283,112	13,700,845	60.84

*รายชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณโดยใช้งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง รวม 21 โครงการ 173 คร่าวเรือน จำนวนเงิน 33,934,405 บาท

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ลาดพร้าว เปรมประชากร)								
ลำดับ	องค์กรผู้เสนอ	วันที่อนุมัติ	ไตรมาส	คร่าวเรือน	จำนวนเงินอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	กลุ่มพัฒนากรุงเทพ-สวนผัก	8 ต.ค. 67	1	-	525,000	525,000	-	
2	สหกรณ์เคหสถานร่วมไทรงามพัฒนา จำกัด	28 พ.ย. 67	1	60	9,540,000	8,672,370	867,630	
3	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	27 ธ.ค. 67	1	10	1,470,000	970,000	500,000	
4	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	27 ธ.ค. 67	1	25	4,201,950	4,011,630	190,320	
5	โครงการสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคลอง	7 ม.ค. 68	2	-	690,000	690,000	-	
6	ชุมชนลาดพร้าว 80 โดยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	7 ม.ค. 68	2	-	108,000	108,000	-	
7	ชุมชนหลังสมาคม ร.ร.ไทย-ญี่ปุ่น โดยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	7 ม.ค. 68	2	-	36,000	36,000	-	
8	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	7 ม.ค. 68	2	-	558,000	558,000	-	
9	สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด	7 ม.ค. 68	2	-	207,000	207,000	-	
10	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	7 ม.ค. 68	2	-	396,000	396,000	-	
11	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	7 ม.ค. 68	2	-	846,000	846,000	-	
12	ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น โดย สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	30 ม.ค. 68	2	36	5,940,000	-	5,940,000	
13	สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด	4 เม.ย. 68	3	-	288,000	288,000	-	
14	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	4 เม.ย. 68	3	-	1,004,850	1,004,850	-	
15	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	4 เม.ย. 68	3	-	585,000	585,000	-	
16	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด	4 เม.ย. 68	3	42	6,049,895	-	6,049,895	
17	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพลโยธิน 32 จำกัด	4 เม.ย. 68	3	-	375,980	375,980	-	
18	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	4 เม.ย. 68	3	-	809,730	809,730	-	
19	สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด	4 เม.ย. 68	3	-	150,000	150,000	-	
20	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	20 พ.ค. 68	3	-	45,000	-	45,000	
21	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	20 พ.ค. 68	3	-	108,000	-	108,000	
รวมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง				173	33,934,405	20,233,560	13,700,845	
						คิดเป็นร้อยละ(ของวงเงินอนุมัติ)	59.63	40.37
งบอื่น ๆ								
ลำดับ	องค์กรผู้เสนอ	วันที่อนุมัติ	ไตรมาส	คร่าวเรือน	จำนวนเงินอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ้านใหม่พัฒนา จำกัด	28 ก.พ. 68	2	-	647,552	647,552	-	
2	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด	4 เม.ย. 68	3	-	240,000	240,000	-	
3	เครือข่ายริมคลองตอนเมือง (ร่วมพัฒนา)	10 เม.ย. 68	3	-	162,000	162,000	-	
รวมโครงการที่เสนอขอใช้งบสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท				-	1,049,552	1,049,552	-	
						คิดเป็นร้อยละ(ของวงเงินอนุมัติ)	100.00	-
รวมทั้งสิ้น				173	34,983,957	21,283,112	13,700,845	
						คิดเป็นร้อยละ(ของวงเงินอนุมัติ)	60.84	39.16

2. งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2567 (กลุ่มโครงการเดิม)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 170,972,406 บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 17,734,725 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่ายที่ยกมา และมีการพิจารณาคืนโครงการและงบประมาณ จำนวน 408 ครั้วเรือน 60,592,217 บาท โดยได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 6,836,550 บาท อยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 12,257,583 บาท และมีการอนุมัติคงงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ดำเนินการตามแผนงานแล้วไม่) จำนวน 106,250 บาท ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย (กรณีได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) จำนวน 111,845,847 บาท ดังนี้

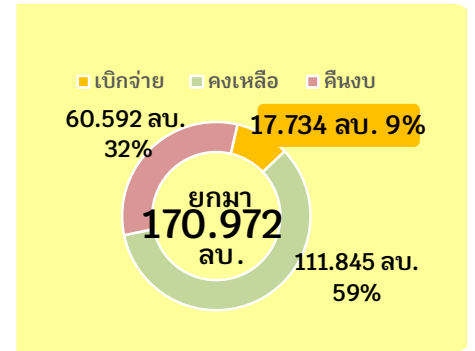

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัสงบ	ปีงบ	ดำเนินการปี 2568 (กลุ่มเดิม)									
			(ณ 30 ก.ย. 67)		คืบหน้าระหว่างปี		คงเหลือรอเบิกจ่าย		อนุมัติคงงบ			
			คงเหลือ รอเบิกจ่าย A	เบิกจ่ายระหว่างปี B	ครั้วเรือน ระหว่างปี	จำนวนเงิน C	รับคืนเงินที่ เบิกจ่ายไปแล้ว D=A-B-C	ระหว่างเรียกคืนเงินที่ เบิกจ่ายไปแล้ว E	อนุมัติคงงบที่ เบิกจ่ายไปแล้วไว้ F	คงเหลือรอเบิกจ่าย (กรณีรับ คืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) G=D+E+F		
งบโครงการบ้านมั่นคง		2559	-	-	-	504,000	-	504,000		504,000		-
สนับสนุนการพัฒนา และช่วยเหลือ		2560	23,143,848	-	224	32,248,967	-	9,105,119	6,836,550	11,753,583	106,250	9,591,264
1. งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลอง	886568		18,377,048		224	16,303,417		2,073,631	2,552,000	2,937,333		7,562,964
2. งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง	886668		4,766,800			15,945,550		11,178,750	4,284,550	8,816,250	106,250	2,028,300
3. งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง	886700	2561	-	-				-				-
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86800	2563	140,335,358	17,734,725	184	27,839,250		94,761,383				94,761,383
5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86900	2564	796,000					796,000				796,000
6. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86000	2565	-					-				-
7. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86100	2566	-					-				-
8. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86200	2567	6,697,200					6,697,200				6,697,200
9. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86300	2568	-					-				-
รวมทั้งสิ้น			170,972,406	17,734,725	408	60,592,217		92,645,464	6,836,550	12,257,583	106,250	111,845,847




ชุมชน กสบ.สามัคคี (เขตสายไหม)
คลองลาดพร้าว



ชุมชนมิตรประชาพัฒนา (เขตหลักสี่)
คลองเปรมประชากร

3. ภาพรวมงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2568

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ รวม 10,151 ครั้วเรือน งบประมาณ 1,751,840 บาท โดยมีการอนุมัติงบประมาณสุทธิ 7,528 ครั้วเรือน 1,355,832,264.42 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1,242,761,937.42 บาท โดยอยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 12,257,583 บาท และมีการอนุมัติคงงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ดำเนินการแล้วไม่สามารถคืนได้) จำนวน 218,782 บาท ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย (หลังได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) จำนวน 125,546,692 บาท



ทั้งนี้ ในการดำเนินการระยะต่อไป คงเหลือเป้าหมายดำเนินการ รวม 3,436 ครัวเรือน* ประกอบด้วย เป้าหมายในพื้นที่คลองลาดพร้าว 1,855 ครัวเรือน และเป้าหมายในพื้นที่คลองเปรมประชากร 1,581 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติได้ 579,401,117.54 บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัสข	ปีข	(ณ 31 พฤษภาคม 2568)									รวมคงเหลือ ดำเนินการ		
			กรอบที่ได้รับจัดสรร		อนุมัติสุทธิ (สะสม)		เบิกจ่ายสุทธิ (สะสม)		ระหว่างเรียกคืนข		คงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อ			
			ครัวเรือน	งบประมาณ	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่เบิกจ่ายไปแล้ว	อนุมัติคงข	คงเหลือรอเบิกจ่าย (กรณีคงขที่เบิกจ่ายไปแล้ว)	ครัวเรือน		รวม	
	A	B	C	D	E	F=B+C+E+D	G=A-B	H=F+G						
ขโครงการบ้านมั่นคง		2559	-	-	813	183,393,381.96	183,897,381.96	504,000.00			0	-	-	0.00
สนับสนุนการพัฒนา และช่วยเหลือ		2560	4,696	751,360,000	2,841	434,774,831.00	425,166,037.00	11,753,583		218,782	21,581,159	1,855	316,585,169	338,166,328.00
1. ขช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง	ค86568		4,696		2,841	184,452,344.00	174,211,413.00	2,937,333.00			13,178,264	1,855	153,659,656.00	166,837,920.00
2. ขช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง	ค86668					202,916,087.00	203,548,224.00	8,816,250.00		218,782.00	8,402,895		162,925,513.00	171,328,408.00
3. ขช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง	ค86700	2561	905	199,680,000	905	199,256,603.46	199,103,603.46	-			153,000	-	423,396.54	576,396.54
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86800	2563	3,115	548,240,000	2,814	495,620,908.00	400,669,205.00	-			94,951,703	301	52,619,092.00	147,570,795.00
5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86900	2564	995	175,120,000	15	16,142,224.00	15,346,224.00	-			796,000	980	158,977,776.00	159,773,776.00
6. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86000	2565	200	35,200,000	-	2,228,160.00	2,228,160.00	-			-	200	32,971,840.00	32,971,840.00
7. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86100	2566	100	17,600,000	-	1,114,100.00	1,114,100.00	-			-	100	16,485,900.00	16,485,900.00
8. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86200	2567	70	12,320,000	70	11,244,856.00	4,547,656.00	-			6,697,200	-	1,075,144.00	7,772,344.00
9. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	86300	2568	70	12,320,000	70	12,057,200.00	10,689,570.00	-			1,367,630	-	262,800.00	1,630,430.00
รวมทั้งสิ้น			10,151	1,751,840,000	7,528	1,355,832,264.42	1,242,761,937.42	12,257,583.00		218,782.00	125,546,692	3,436	579,401,117.54	704,947,809.54

*ไม่นับผลการอนุมัติครัวเรือนของขโครงการบ้านมั่นคงจำนวน 813 ครัวเรือน

4. โครงการที่คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง รวม 125,546,692 บาท

4.1 ขปี พ.ศ. 2560 ขสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลอง ค86568 และขช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง ค86668 คงเหลือ 21,581,159 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือ	ระหว่างเรียกคืน	อนุมัติคงไว้	คงเหลือสุทธิ
1	PT116868-03028	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด (หลังกรมวิทยาศาสตร์)	6,049,895			6,049,895
2	PT116868-01832	ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น โดย สหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	5,940,000			5,940,000
3	HS-60-0025	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80	-	112,532	112,532	-
4	HS-60-0039	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ	-	175,000	175,000	-
5	HS-60-0058	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34	-	8,540,833	8,434,583	106,250
6	HS-60-0081	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองเสนานิคม 2	-	2,103,914	3,144,000	1,040,086
7	PT116867-07028	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญ จำกัด (พัฒนาหมู่ 2)	261,500			261,500
8	HS-60-0036	สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชน พหลโยธิน 32 กลุ่ม 2)	1,872,000			1,872,000
9	HS-60-0080	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46	1,950,040			1,950,040
10	HS-60-0083	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา	2,700,342			2,700,342
11	HS-60-0084	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์	1,767,296			1,767,296
			9,608,794	11,753,583	218,782	21,581,159

4.2 ขปี พ.ศ. 2561 ขช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง ค86700 คงเหลือ 153,000 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล)	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	45,000
2	(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล)	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	108,000
			153,000

4.3 ขปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86800 คงเหลือ 94,951,703 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116868-01874	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	190,320
2	PT116863-09472	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	14,538,700

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
3	PT176864-04202	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	3,328,500
4	PT116863-07909	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐไพรมประชา จำกัด	7,497,000
5	PT116863-07912	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	16,464,000
6	PT116863-07925	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	1,284,775
7	PT116863-07926	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	477,630
8	PT176864-03270	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	68,250
9	PT176864-04277	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปุ่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	804,000
10	PT116865-06532	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปุ่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	152,858
11	PT176864-04278	สหกรณ์เคหสถานวัดดอนเมืองด้านเหนือ จำกัด	5,620,835
12	PT116863-09417	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	6,473,000
13	PT116866-05598	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	105,000
14	PT116863-09415	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบุญทรัพย์ จำกัด (ตาลคู่65 หน้าท่า60)	4,410,000
15	PT116866-05592	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบุญทรัพย์ จำกัด (ตาลคู่)	82,500
16	PT116866-05596	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปุ่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	89,000
17	PT116863-09414	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	26,709,835
18	PT116865-06462	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	1,800,000
19	PT116863-05813	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	820,000
20	PT176864-04204	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	730,000
21	PT116866-05597	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	135,000
22	PT116866-05595	สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด	67,500
23	PT116863-05817	สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด	477,205
24	PT116863-05818	สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด	800,000
25	PT176864-04203	สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด	445,125
26	PT116865-06529	สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด	677,500
27	PT116866-05594	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด (ซอยต้นสน)	300,000
28	PT116866-05616	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	270,000
29	PT116867-01528	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด (อยู่ดีมีสุข)	133,170
			94,951,703

4.4 งบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86900

คงเหลือ 796,000 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116867-07135	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	796,000
			796,000

4.5 งบประมาณปี พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86200

คงเหลือ 6,697,200 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116867-01530	ชุมชนประชากร 4	2,541,500
2	PT116867-06117	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบุญทรัพย์ จำกัด (ตาลคู่พัฒนา)	4,155,700
			6,697,200

4.6 งบประมาณปี พ.ศ. 2568 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86300

คงเหลือ 1,367,630 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116868-00028	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	867,630
2	PT116868-01874	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	500,000
			1,367,630
