

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด (ตัวชี้วัดร่วม)


1. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2568

(กลุ่มโครงการใหม่)

1.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2568 มีเป้าหมายดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายปีในพื้นที่คลองเปรมประชากร จำนวน 70 ครัวเรือน วงเงินรวม 12,320,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 1,047,200 บาท และงบสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชน 11,272,800 บาท

การดำเนินการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 มีการพิจารณาและเห็นชอบงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 3 โครงการ 70 ครัวเรือน งบประมาณ 11,160,000.00 บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 9,792,370.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.75 ของงบประมาณที่อนุมัติ และคงเหลือรอเบิกจ่าย 1,367,630.00 บาท ดังนี้

องค์กรชุมชน	อนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย
	ครัวเรือน	จำนวนเงิน		
1.สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	60	9,540,000.00	8,672,370.00	867,630.00
2.สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	10	1,470,000.00	970,000	500,000.00
3.สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	-	150,000.00	150,000.00	-
	70	11,160,000.00	9,792,370.00	1,367,630.00

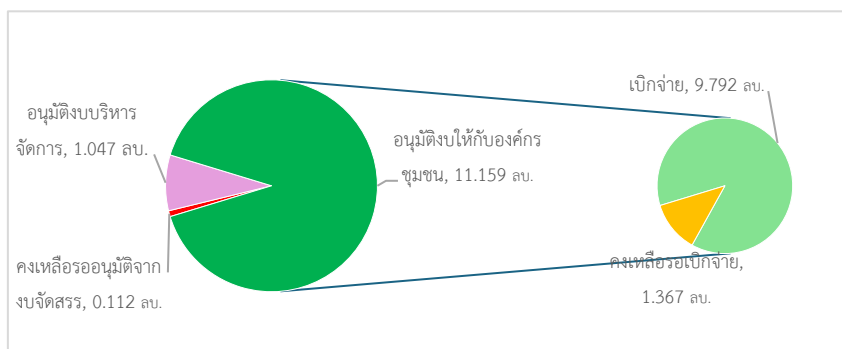

ทั้งนี้ จากงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรรายปี คงเหลืองบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวน 112,800.00 บาท



ชุมชนร่มไทรงาม

ก่อสร้างเสร็จ 28 ครัวเรือน ระหว่างสร้าง 160 ครัวเรือน และเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง 8 ครัวเรือน



ชุมชนคลองเปรมประชากรพัฒนา

ก่อสร้างเสร็จ 93 ครัวเรือน ระหว่างสร้าง 93 ครัวเรือน และเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง 8 ครัวเรือน



1.2 ภาพรวมการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 24 โครงการ 173 ครัวเรือน 36,168,405 บาท และงบภายใต้การสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง 6 โครงการ 5,105,552 บาท รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ 173 ครัวเรือน 41,273,957 บาท โดยมีการคืนงบประมาณบางส่วน 48,000 บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 32,304,617 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.36 ของงบประมาณที่อนุมัติ และคงเหลือรอเบิกจ่าย 8,921,340 บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	ปีงบ	(ณ 1 ต.ค. 67)		คำเป็นฉบับ 2568 (กลุ่มใหม่ อนุมัติ 2568)				ร้อยละการ เบิกจ่าย	
		คงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อ		อนุมัติระหว่างปี		เบิกจ่าย (กลุ่ม2568)	คืนงบประมาณ (กลุ่ม2568)		คงเหลือระยะเบิกจ่าย
		ครัวเรือน	วงเงินอนุมัติได้	ครัวเรือน	จำนวนเงิน				
งบโครงการบ้านมั่นคง	2559	-	-		5,105,552	1,049,552		4,056,000	20.56
งบสนับสนุนการพัฒนาฯ และงบช่วยเหลือฯ	2560	1,709	296,702,077	78	12,365,875	9,058,485		3,307,390	73.25
1. งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลอง		1,709	142,972,239.00	78	5,616,000	4,373,110		1,242,890	
2. งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง		-	153,729,838.00		6,749,875	4,685,375		2,064,500	
3. งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง	2561	-	4,815,396.54	-	4,626,000	4,578,000	48,000	-	100.00
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2563	326	30,946,372.00	25	8,016,530	7,826,210		190,320	97.63
5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2564	980	158,977,776.00					-	
6. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2565	200	32,971,840.00					-	
7. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2566	100	16,485,900.00					-	
8. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2567	-	1,075,144.00					-	
9. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	2568	70	12,320,000.00	70	11,160,000	9,792,370		1,367,630	87.75
รวมทั้งสิ้น		3,385	554,294,505.54	173	41,273,957	32,304,617	48,000	8,921,340	78.36

รายชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ลาดพร้าว เปรมประชากร)


ลำดับ	องค์กรผู้เสนอ	วันที่อนุมัติ	ครัวเรือน	จำนวนเงินอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	กลุ่มพัฒนากรุงเทพ-สวนผัก	8 ต.ค. 67	-	525,000	525,000	-
2	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	28 พ.ย. 67	60	9,540,000	8,672,370	867,630
3	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	27 ธ.ค. 67	10	1,470,000	970,000	500,000
4	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	27 ธ.ค. 67	25	4,201,950	4,011,630	190,320
5	โครงการสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง	7 ม.ค. 68	-	690,000	690,000	-
6	ชุมชนลาดพร้าว 80 โดยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	7 ม.ค. 68	-	108,000	108,000	-
7	ชุมชนหลังสมาคม ร.ร.ไทย-ญี่ปุ่น โดยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	7 ม.ค. 68	-	36,000	36,000	-
8	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	7 ม.ค. 68	-	558,000	558,000	-
9	สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด	7 ม.ค. 68	-	207,000	207,000	-
10	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	7 ม.ค. 68	-	396,000	396,000	-
11	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	7 ม.ค. 68	-	846,000	846,000	-
12	ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น โดย สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	30 ม.ค. 68	36	5,940,000	4,167,110	1,772,890
13	สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด	4 เม.ย. 68	-	240,000	240,000	-
14	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	4 เม.ย. 68	-	1,004,850	1,004,850	-
15	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	4 เม.ย. 68	-	585,000	585,000	-
16	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด	4 เม.ย. 68	42	6,049,895	4,515,395	1,534,500
17	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพลโยธิน 32 จำกัด	4 เม.ย. 68	-	375,980	375,980	-
18	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	4 เม.ย. 68	-	809,730	809,730	-
19	สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด	4 เม.ย. 68	-	150,000	150,000	-
20	สหกรณ์เคหสถานท่านบสตรี้เหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	20 พ.ค. 68	-	45,000	45,000	-
21	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	20 พ.ค. 68	-	108,000	108,000	-
22	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	24 มิ.ย. 68	-	234,000	234,000	-
23	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	24 มิ.ย. 68	-	1,850,000	1,850,000	-
24	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	24 มิ.ย. 68	-	150,000	150,000	-
รวมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง			173	36,120,405	31,255,065	4,865,340

งภายใต้โครงการบ้านมั่นคง (อื่น ๆ)

ลำดับ	องค์กรผู้เสนอ	วันที่อนุมัติ	ครัวเรือน	จำนวนเงินอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ้านใหม่พัฒนา จำกัด	28 ก.พ. 68	-	647,552	647,552	-	
2	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด	4 เม.ย. 68	-	240,000	240,000	-	
3	เครือข่ายริมคลองดอนเมือง (ร่วมพัฒนา)	10 เม.ย. 68	-	162,000	162,000	-	
4	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวฯ ของสหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	21 ส.ค. 68	-	621,000		621,000	
5	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวฯ ของสหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	21 ส.ค. 68	-	2,136,000		2,136,000	
6	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวฯ ของสหกรณ์เคหสถานท่านบสตรี้เหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	21 ส.ค. 68	-	1,299,000		1,299,000	
รวมโครงการที่เสนอขอใช้เงินสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท			-	5,105,552	1,049,552	4,056,000	
รวมทั้งสิ้น			173	41,225,957	32,304,617	8,921,340	
					คิดเป็นร้อยละ(ของวงเงินอนุมัติ)	78.36	21.64

2. งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2560-2567 (กลุ่มโครงการเดิม)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย ยกมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 170,972,406 บาท มีการคืนโครงการและงบประมาณ จำนวน 408 ครั้วเรือน 60,592,217 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 18,266,225 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.89 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่ายที่ยกมาหลังหักคืนงบประมาณระหว่างปีแล้ว ทั้งนี้ ได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 6,836,550 บาท อยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 12,257,583 บาท และมีการอนุมัติค่างบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ดำเนินการตามแผนงานแล้ว) จำนวน 106,250 บาท ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย (กรณีได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) จำนวน 111,314,347 บาท ดังนี้



ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัสง	ปีงบ	ดำเนินการปี 2568 (กลุ่มเดิม)											
			(ณ 30 ก.ย. 67)		เบิกจ่ายระหว่างปี		คืนงบระหว่างปี		คงเหลือรอเบิกจ่าย		ยอดการเบิกจ่าย (หักคืนงบประมาณแล้ว)			
			คงเหลือ	รอเบิกจ่าย	ครั้วเรือน	จำนวนเงิน	ครั้วเรือน	จำนวนเงิน	ครั้วเรือน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
A	B	C	D=A-B-C	E	F	G=D+E+F								
งบโครงการบ้านมั่นคง		2559	-	-	-	504,000	-	504,000	-	-	504,000	-	-	-
งบสนับสนุนการพัฒนา และช่วยเหลือ		2560	23,143,848	261,500	224	32,248,967	-	9,366,619	59.69	6,836,550	11,753,583	106,250	9,329,764	
1. งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลอง	ศ86568		18,377,048	104,500	224	16,303,417	-	1,949,131	59.41	2,552,000	2,937,333	-	7,458,464	
2. งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง	ศ86668		4,766,800	157,000	-	15,945,550	-	11,335,750	60.74	4,284,550	8,816,250	106,250	1,871,300	
3. งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง	ศ 86700	2561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองประเภทเช่า	86800	2563	140,335,358	18,004,725	184	27,839,250	-	94,491,383	32.67	-	-	-	94,491,383	
5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองประเภทเช่า	86900	2564	796,000	-	-	-	-	796,000	-	-	-	-	796,000	
6. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองประเภทเช่า	86000	2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองประเภทเช่า	86100	2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองประเภทเช่า	86200	2567	6,697,200	-	-	-	-	6,697,200	-	-	-	-	6,697,200	
9. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองประเภทเช่า	86300	2568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			170,972,406	18,266,225	408	60,592,217	92,113,964	34.89	6,836,550	12,257,583	106,250	111,314,347		



ชุมชน กส.สามัคคี (เขตสายใหม่)




ชุมชนมิตรประชาพัฒนา (เขตหลักสี่) คลองเปรมประชากร



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสามแสนสุข จำกัด (จ.ระยอง)

3. ภาพรวมงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองสะสม ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2560-2568

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ รวม 10,151 ครั้วเรือน งบประมาณ 1,751,840,000 บาท โดยมีการอนุมัติงบประมาณสุทธิ 7,528 ครั้วเรือน 1,362,074,264.42 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1,254,314,942.42 บาท โดยอยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 12,257,583 บาท และมีการอนุมัติค่างบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ดำเนินการแล้วไม่สามารถคืนได้) จำนวน 218,782 บาท ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย (หลังได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) จำนวน 20,235,687 บาท



ทั้งนี้ ในการดำเนินการระยะต่อไป คงเหลือเป้าหมายดำเนินการ รวม 3,436 ครัวเรือน* ประกอบด้วย เป้าหมายในพื้นที่คลองลาดพร้าว 1,855 ครัวเรือน และเป้าหมายในพื้นที่คลองเปรมประชากร 1,581 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติได้ 577,215,117.54 บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัส งบ	ปีงบ	กรอบที่ได้รับจัดสรร		(ณ 26 สิงหาคม 2568)							รวมคงเหลือ ดำเนินการ		
			ครัวเรือน	งบประมาณ A	อนุมัติสุทธิ (สะสม)		เบิกจ่ายสุทธิ (สะสม)		ระหว่างเรียกคืน ที่เบิกจ่ายไปแล้ว	อนุมัติคงไว้ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือรอเบิกจ่าย (กรณีเงินที่เบิกจ่ายไม่ถึง)		คงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อ	
					ครัวเรือน	จำนวนเงิน B	จำนวนเงิน C	จำนวนเงิน D					จำนวนเงิน E	F=B+C+E+D
งบโครงการบ้านมั่นคง		2559	-	-	813	187,449,381.96	183,897,381.96	504,000.00			4,056,000	-	-	4,056,000.00
งบสนับสนุนการพัฒนา และช่วยเหลือ		2560	4,696	751,360,000	2,841	434,774,831.00	434,110,042.00	11,753,583	218,782	12,637,154	1,855	316,585,169	329,222,323.00	
1. งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลอง	ค86568		4,696		2,841	184,452,344.00	178,689,023.00	2,937,333.00		8,700,654	1,855	153,659,656.00	162,360,310.00	
2. งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง	ค86668					202,916,087.00	208,014,619.00	8,816,250.00	218,782.00	3,936,500		162,925,513.00	166,862,013.00	
3. งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง	ค86700	2561	905	199,680,000	905	199,442,603.46	199,442,603.46	-		-		237,396.54	237,396.54	
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแบบปะชากร	86800	2563	3,115	548,240,000	2,814	497,470,908.00	402,789,205.00	-		94,681,703	301	50,769,092.00	145,450,795.00	
5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแบบปะชากร	86900	2564	995	175,120,000	15	16,142,224.00	15,346,224.00	-		796,000	980	158,977,776.00	159,773,776.00	
6. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแบบปะชากร	86000	2565	200	35,200,000	-	2,228,160.00	2,228,160.00	-		-	200	32,971,840.00	32,971,840.00	
7. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแบบปะชากร	86100	2566	100	17,600,000	-	1,114,100.00	1,114,100.00	-		-	100	16,485,900.00	16,485,900.00	
8. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแบบปะชากร	86200	2567	70	12,320,000	70	11,244,856.00	4,547,656.00	-		6,697,200	-	1,075,144.00	7,772,344.00	
9. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแบบปะชากร	86300	2568	70	12,320,000	70	12,207,200.00	10,839,570.00	-		1,367,630	-	112,800.00	1,480,430.00	
รวมทั้งสิ้น			10,151	1,751,840,000	7,528	1,362,074,264.42	1,254,314,942.42	12,257,583.00	218,782.00	120,235,687	3,436	577,215,117.54	697,450,804.54	

*ไม่นับผลการอนุมัติครัวเรือนของงบโครงการบ้านมั่นคงจำนวน 813 ครัวเรือน

4. โครงการที่คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง รวม 120,235,687 บาท

4.1 งบโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 4,056,000 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT046868-03546	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้เลื้อย ภัยพิบัติ ของสหกรณ์ เคหสถานประชากร 3 จำกัด	621,000
2	PT046868-03547	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้เลื้อย ภัยพิบัติ ของสหกรณ์ เคหสถานร่วมไทรงามพัฒนา จำกัด	2,136,000
3	PT046868-03548	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้เลื้อย ภัยพิบัติ ของสหกรณ์ เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	1,299,000
			4,056,000

4.2 งบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลอง ค86568 และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง ค86668 คงเหลือจำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 12,637,154 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือ	ระหว่างเรียกคืน	อนุมัติคงไว้	คงเหลือสุทธิ
1	PT116868-03028	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด (หลังกรมวิทยาศาสตร์)	1,534,500			1,534,500
2	PT116868-01832	ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น โดย สหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	1,772,890			1,772,890
3	HS-60-0025	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80	-	112,532	112,532	-
4	HS-60-0039	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ	-	175,000	175,000	-
5	HS-60-0058	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34	-	8,540,833	8,434,583	106,250
6	HS-60-0081	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองแสนานิคม 2	-	2,103,914	3,144,000	1,040,086
7	HS-60-0036	สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชน พหลโยธิน 32 กลุ่ม 2)	1,872,000			1,872,000
8	HS-60-0080	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46	1,950,040			1,950,040
9	HS-60-0083	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา	2,700,342			2,700,342
10	HS-60-0084	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์	1,767,296			1,767,296
			664,789.00	11,753,583	218,782	12,637,154

4.3 งบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86800 คงเหลือ
จำนวน 29 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 94,681,703 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116863-05813	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	820,000
2	PT116863-05817	สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด	477,205
3	PT116863-05818	สหกรณ์เคหสถานเทวมันคง จำกัด	800,000
4	PT116863-07909	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด	7,497,000
5	PT116863-07912	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	16,464,000
6	PT116863-07925	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	1,284,775
7	PT116863-07926	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	477,630
8	PT116863-09414	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	26,709,835
9	PT116863-09415	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด (ตาลคู่65 หน้าท่า54)	4,410,000
10	PT116863-09417	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	6,473,000
11	PT116863-09472	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	14,538,700
12	PT116865-06462	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	1,800,000
13	PT116865-06529	สหกรณ์เคหสถานเทวมันคง จำกัด	677,500
14	PT116865-06532	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ตอนเมือง จำกัด	152,858
15	PT116866-05592	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด (ตาลคู่)	82,500
16	PT116866-05594	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด (ซอยต้นสน)	300,000
17	PT116866-05595	สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด	67,500
18	PT116866-05596	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ตอนเมือง จำกัด	89,000
19	PT116866-05597	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	135,000
20	PT116866-05598	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	105,000
21	PT116867-01528	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด (อยู่ดีมีสุข)	133,170
22	PT116868-01874	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	190,320
23	PT116868-03513	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	68,250
24	PT176864-03270	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	3,328,500
25	PT176864-04202	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	445,125
26	PT176864-04203	สหกรณ์เคหสถานเทวมันคง จำกัด	730,000
27	PT176864-04204	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	804,000
28	PT176864-04277	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ตอนเมือง จำกัด	5,620,835
29	PT176864-04278	สหกรณ์เคหสถานวัดตอนเมืองด้านเหนือ จำกัด	820,000
			94,681,703

4.4 งบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86900
คงเหลือจำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 796,000 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116867-07135	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	796,000
			796,000

4.5 งบประมาณปี พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86200
 คงเหลือจำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 6,697,200 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116867-01530	ชุมชนประชากร 4	2,541,500
2	PT116867-06117	สหกรณ์เคหสถานตาลคูสมบูรณพูนทรัพย์ จำกัด (ตาลคูพัฒนา)	4,155,700
			6,697,200

4.6 งบประมาณปี พ.ศ. 2568 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86300
 คงเหลือจำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 1,367,630 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116868-00028	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	867,630
2	PT116868-01874	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	500,000
			1,367,630

5. สถานะการดำเนินงานในระบบโปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

จำนวน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมบริหารงานบ้านมั่นคง CodiBMOS และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ CodiPMS โดยมีโครงการทั้งหมดรวม 197 รหัสโครงการ มีสถานะดังนี้

โปรแกรม	ดำเนินการ / Active	ปิดโครงการ / Closed	รวม
CodiBMOS	54	19	73
CodiPMS	104	20	124
รวม	158	39	197

ปรากฏรายชื่อโครงการตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้โครงการที่มีสถานะ “ดำเนินการ / Active” จำนวน 158 โครงการ

- มีการเบิกจ่ายงบประมาณครบทั้งวงเงินแล้ว 111 โครงการ โดยอยู่ระหว่างการติดตามสถานะด้านการก่อสร้างบ้าน สรุปผลการดำเนินงาน และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ
- คงเหลือโครงการที่คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 47 โครงการ (ตามข้อ 4) โดยอยู่ระหว่างการติดตามสถานะงานเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน
