

รายงานสถานะ

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ เดือนมีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมของคนในชุมชนและสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนดำเนินการโดยความต้องการของคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายใต้การจัดสวัสดิการชุมชนที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่ดำเนินการ จำนวน 6,002 กองทุน สมาชิก 6,652,676 คน เงินกองทุน (สะสม) 23,065.43 ล้านบาท มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนและผู้เปราะบางทางสังคม (สะสม) จำนวน 9,584,693 คน งบประมาณ (สะสม) 9,550,935,881.26 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2568)


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถาบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบกองทุน พัฒนากองทุนและกลไกสวัสดิการชุมชนทุกระดับ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวนงบประมาณ 242,866,500 บาท โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) งบค่าบริหารจัดการ งบประมาณ 12,143,325 บาท (ร้อยละ 5) 2) งบสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ งบประมาณ 230,723,175 บาท (ร้อยละ 95) ภายใต้ 4 แผนงานสำคัญ ประกอบด้วย 1) การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเป้าหมาย 1,480 กองทุน สมาชิก 2,074,744 คน งบประมาณ 201,143,998 บาท 2) การจัดสวัสดิการและการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน เป้าหมาย 277 กองทุน งบประมาณ 2,770,000 บาท 3) การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับชาติ ภาค จังหวัดและโซน งบประมาณ 25,809,177 บาท 4) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เป้าหมาย 100 กองทุน งบประมาณ 1,000,000 บาท

จากการติดตามข้อมูลการอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2568) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบ งบประมาณ (บาท)	เสนอ ผอ.อนุมัติ									งบประมาณ คงเหลือที่ ยังไม่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจากการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM (R07)				บันทึกข้อมูลในระบบ CODI - PM (R01)		
			ภาค	จังหวัด			ตำบล		รวม โครงการ ทั้งหมด	งบอนุมัติ	ร้อยละ งบ อนุมัติ		จน. โครงการ	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	จน. สมาชิก (คน)	งบอนุมัติ (บาท)
				(1) กลไก	(2) พัฒนา	(3) จัดตั้ง	สมทบ												
							จน. โครงการ	จน. สมาชิก											
1.	กทม - ตะวันออก	25,278,436	1	10	14	2	136	178,991	147	19,372,252	76.64	5,906,184	1	273,000	19,099,252	1.41	178	350,262	2,191,800
2.	กลาง - ตะวันตก	17,048,003	1	13	18	29	143	142,732	157	17,035,907	99.93	12,096	108	12,086,865	4,949,042	70.95	112	125,122	12,770,265
3.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	78,115,064	1	20	136	55	478	746,186	499	78,115,064	100	0	309	43,130,668	34,984,396	55.21	451	837,393	59,072,300
4.	ใต้	43,960,393	1	14	52	-	335	422,304	350	43,773,961	99.58	186,432	204	22,588,661	21,185,300	51.60	206	228,187	24,396,861
5.	เหนือ	54,602,102	-	16	50	13	271	380,683	287	39,847,334	72.98	14,754,768	30	4,011,252	35,836,082	10.07	266	459,380	28,721,414
6.	เครือข่ายสวัสดิการ ชุมชน 5 ภาค	11,719,177	2	-	-	-	-	-	2	11,719,177	100	0	2	8,203,423	3,515,754	70	1	-	11,719,177
7.	งบบริหารจัดการ	12,143,325	1	-	-	-	-	-	1	12,143,325	100	0	1	12,143,325	0	100	1	-	12,143,325
รวมทั้งหมด		242,866,500	7	73	270	99	1,363	1,870,896	1,443	222,007,020	91.41	20,859,480	655	102,437,194	119,569,826	46.14	1,215	2,000,344	151,015,142

- **โครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการ** พบว่ามีการมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,443 โครงการ วงเงินงบประมาณ 222,007,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.41 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร วงเงินงบประมาณ 102,437,194 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.14 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเพียง 20,859,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.59 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ มาจากสำนักงานภาค 4 ภาค ได้แก่ (1) ภาคกรุงเทพฯ ปริมาณและตะวันออก วงเงินงบประมาณ 5,906,184 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอกลไกพิจารณาและเสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติตามกระบวนการ (2) ภาคกลางและตะวันตก วงเงินงบประมาณ 12,096 บาท (3) ภาคใต้ วงเงินงบประมาณ 186,432 บาท และ (4) ภาคเหนือ มีวงเงินงบประมาณสูงถึง 14,754,768 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างการเสนอผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พิจารณาลงนามอนุมัติ
- **เบิกจ่ายงบประมาณจากการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PMS (R07)** พบว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 655 โครงการ งบประมาณจำนวน 102,437,194 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.14 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย วงเงินงบประมาณ 119,569,826 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ขอให้สำนักงานภาค เร่งรัดการอนุมัติงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2568 และเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2568 เพื่อให้ขบวนองค์กรชุมชนใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
- **จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการบันทึกในระบบโปรแกรมฯ Codi\_PMS (R01)** พบว่า มีการบันทึกโครงการในระบบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,215 โครงการ วงเงินงบประมาณ 151,015,142 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.18 ของงบกรอบงบที่ได้รับการจัดสรร ครอบคลุม 5 ภูมิภาค ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ – แผนงาน – กิจกรรมและงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในระบบโปรแกรมฯ Codi\_PMS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อจะได้สรุปภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

กราฟแสดงผลการอนุมัติเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
การบันทึกข้อมูลการอนุมัติ/เบิกจ่ายโครงการและงบประมาณ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน  
ในระบบโปรแกรม CODI – PMS (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2568) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

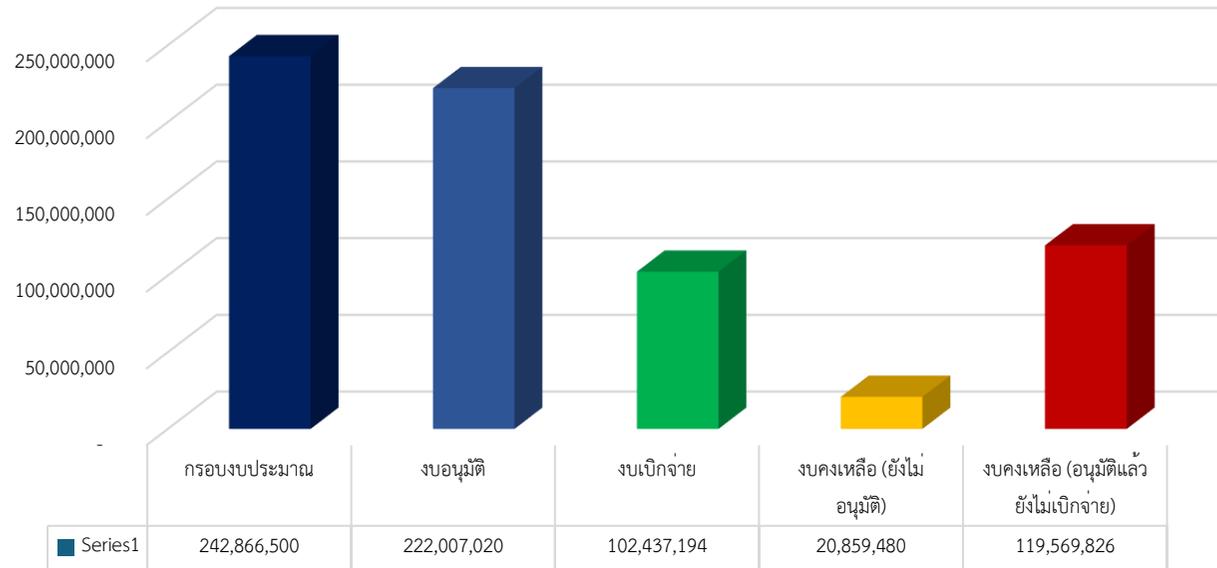


จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,443 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 222,007,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.41 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด แบ่งเป็น

1) งบสนับสนุนขบวนการองค์กรชุมชน จำนวน 1,442 โครงการ วงเงินงบประมาณ 209,863,695 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.96 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งยังคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเพียง 20,859,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.04 ซึ่งมาจากสำนักงานภาค 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ตามลำดับ ในส่วนของงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติของสำนักงานภาคกลางและตะวันตกและภาคใต้ เป็นงบประมาณคงเหลือคืบส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้

- ▶ โครงการระดับชาติ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค
- ▶ โครงการระดับภาค จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ภาคกลางและตะวันตก ภาคใต้ *คงเหลือจำนวน 1 ภาค คือ ภาคเหนือ*
- ▶ โครงการระดับจังหวัด จำนวน 73 โครงการ ครอบคลุม 73 จังหวัด ทั้งนี้ การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับจังหวัด ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่
  - (1) การจัดสวัสดิการและการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 270 โครงการ
  - (2) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 99 กองทุน
  - (3) กลไกระดับโซน

2) งบบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 12,143,325 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

## กราฟแสดงการอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณ “เปรียบเทียบ” กับ กรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (รายภาค)

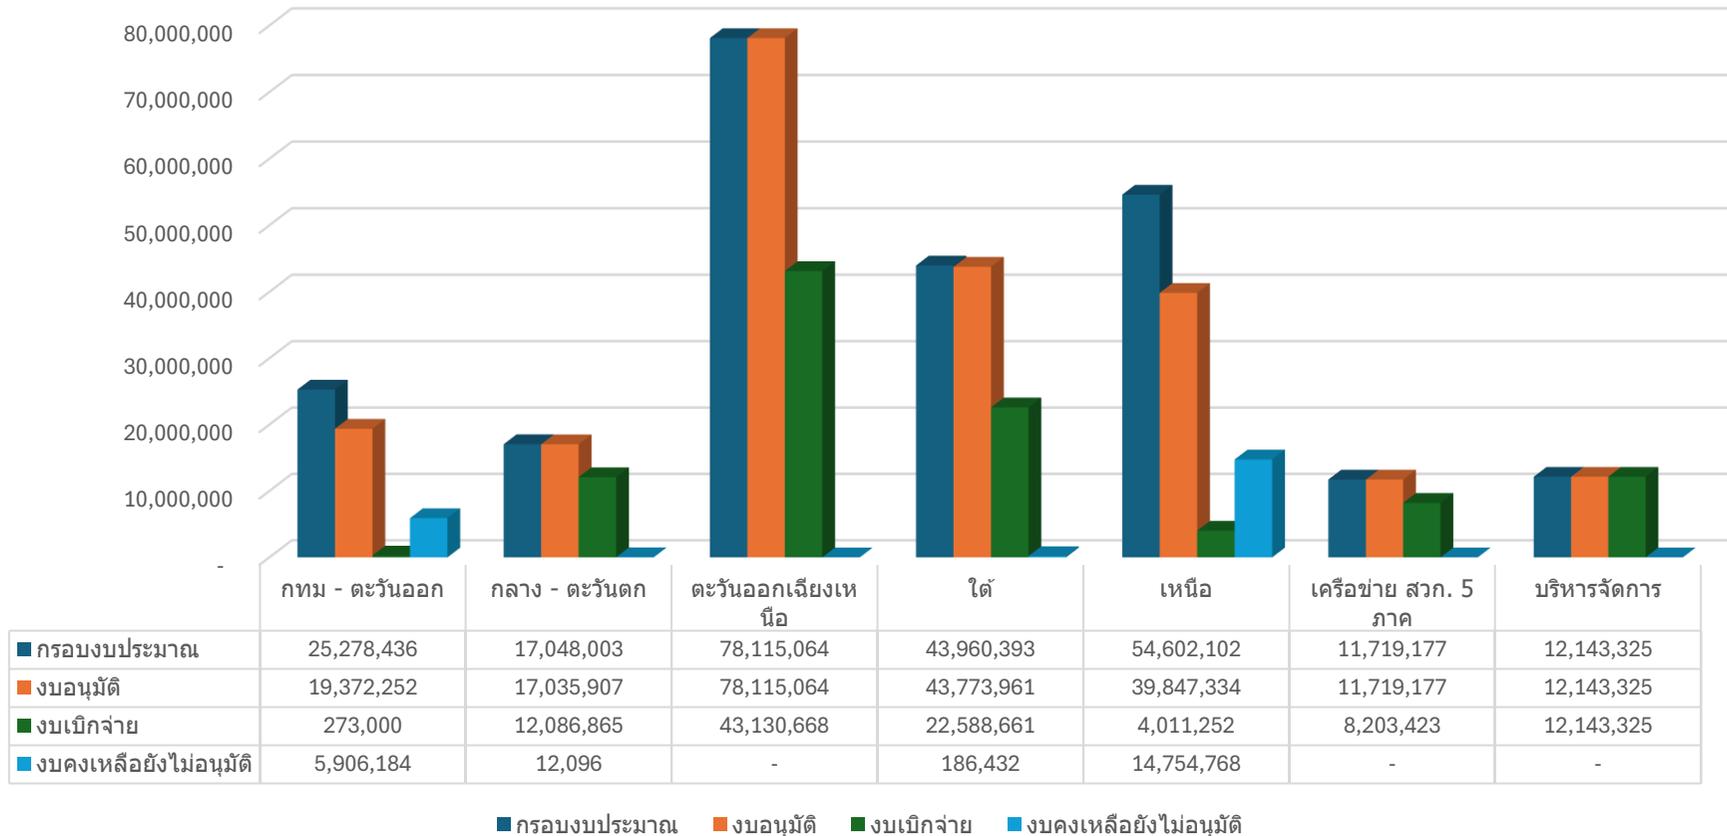

ตารางการแสดงผลสถานการณ์บันทึกข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi\_pms/)

ภาค	จน.โครงการ ที่อนุมัติ	จน. โครงการ ที่บันทึก	สถานะข้อมูลการบันทึก						เอกสารแนบ				
			มติ.กก ภาค/จว	ข้อมูล โครงการ	ข้อมูล องค์กร	กิจกรรม โครงการ	MOU	แผนการ เบิกจ่าย	MOU	แบบ แสดงผล อนุมัติ	สำเนา บัญชี	เอกสาร เบิกจ่าย งวด 2	เอกสาร ปิด โครงการ
กทม - ตะวันออก	147	144	144	144	144	144	147	147	2	89	5	5	0
กลาง - ตะวันตก	157	111	111	111	111	111	157	111	111	157	111	111	0
ตะวันออกเฉียงเหนือ	499	387	387	387	387	387	415	387	297	397	297	296	0
ใต้	350	205	205	205	205	205	205	205	129	268	125	125	0
เหนือ	287	228	228	228	228	228	235	228	37	45	45	45	0
เครือข่าย สวก. 5 ภาค	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
รวมทั้งหมด	1,442	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,161	1,080	578	958	585	584	0
คิดเป็นร้อยละ	99.93	74.69	74.69	74.69	74.69	74.69	80.51	74.90	40.08	66.44	40.57	60.96	0

หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi\_pms/) ไม่รวมงบบริหารจัดการ

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่ามีการบันทึกข้อมูลและการแนบเอกสาร ในระบบโปรแกรมฯ CODI – PMS เฟส 2 ประกอบด้วย ข้อมูลโครงการและการแนบไฟล์เอกสาร ได้แก่ บันทึกความร่วมมือ (MOU) แบบแสดงผลอนุมัติสำเนาสมุดบัญชี เอกสารเบิกจ่าย งวด 2 เอกสารปิดโครงการ ฯลฯ โดยมีโครงการที่อนุมัติจำนวน 1,442 โครงการ แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน จำนวน 1,442 โครงการ และ (2) งบบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมฯ จำนวน 1,077 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนโครงการทั้งหมด คงเหลือ 365 โครงการ ทั้งนี้ เงื่อนไข กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในระบบโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ CODI – PMS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมนี้ ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแนบเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนต่อไป

ตารางแสดงระยะเวลาการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2568

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตะวันออก จำนวน 147 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 12 โครงการ	8.16	1 - 14 วัน	15 - 38 วัน	29 - 39 วัน	33 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 135 โครงการ	91.84	9 - 14 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 37 - 42 วัน		
กลางและตะวันตก จำนวน 157 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	3.18	5 - 13 วัน	17 - 50 วัน	30 - 55วัน	62 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 152 โครงการ	96.82	0 - 15 วัน	44 - 65 วัน	56-73วัน	64วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 499 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 72 โครงการ	14.43	13 - 29 วัน	25 - 42 วัน	41 - 55 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 225 โครงการ	45.09	13 - 50 วัน	17 - 59 วัน	56 - 89 วัน	67 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 202 โครงการ	40.48	13 - 51 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 55 - 78 วัน		
ใต้ จำนวน 350 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 6 โครงการ	1.71	1 - 8 วัน	41 - 46 วัน	42 - 53 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 281 โครงการ	80.29	6 - 12 วัน	50 - 59 วัน	56 - 68 วัน	63 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 63 โครงการ	18	50 - 59 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 60 - 73 วัน		
เหนือ จำนวน 287 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 22 โครงการ	7.67	6 วัน	44 วัน	50 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 38 โครงการ	13.24	11 - 29 วัน	29 - 59 วัน	57 - 80 วัน	61 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 227 โครงการ	79.09	5 - 29 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 37 - 67 วัน		
เครือข่ายสวัสดิการ ชุมชน 5 ภาค	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 2 โครงการ	100	24 วัน	13 วัน	37 วัน	37 วัน
รวม 1,442 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 119 โครงการ	8.25	1 - 29 วัน	9 - 50 วัน	20 - 55 วัน	47 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 696 โครงการ	48.27	0 - 50 วัน	17 - 65 วัน	56 - 89 วัน	64 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 627 โครงการ	43.81	5 - 59 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 37 - 78 วัน		

หมายเหตุ : ตารางแสดงระยะเวลาการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ไม่รวมงบบริหารจัดการ

จากระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ ได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับงาน ดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถือเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน กลไกสวัสดิการชุมชนทุกระดับ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นจากกลไกการกลั่นกรองโครงการ ตั้งแต่คณะพิจารณาโครงการระดับภาค พิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึงผู้อำนวยการภาค ลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และกระบวนการเบิกจ่ายโครงการ ระยะเวลาหลังจากผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึงกระบวนการเบิกจ่ายงวดแรก จำนวน 25 วัน จากการติดตามผลการบริหารโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ

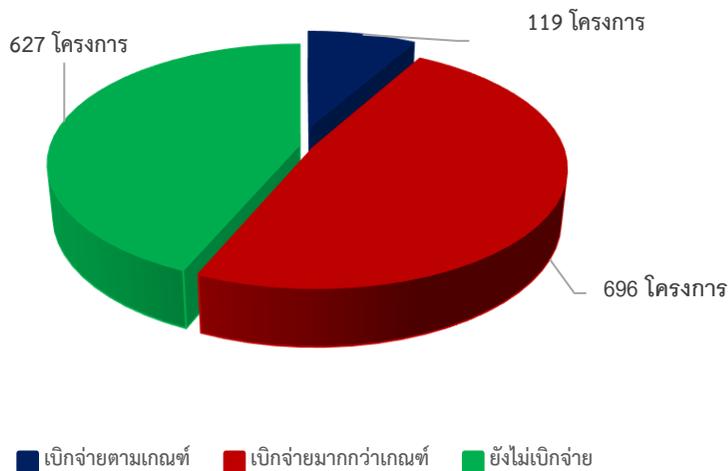

จากกราฟแสดงข้อมูลพบว่า มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากงบประมาณก่อนจำนวน 1,422 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาในการบริหารโครงการตามเกณฑ์ จำนวน 119 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.25 ของจำนวนโครงการที่บันทึกทั้งหมด
- โครงการที่ใช้ระยะเวลาในการบริหารโครงการมากกว่าเกณฑ์ จำนวน 696โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.27 ของจำนวนโครงการที่บันทึกทั้งหมด
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 627 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.81 ของจำนวนโครงการที่บันทึกทั้งหมด

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า จากกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ - เบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าเกณฑ์สูงถึง 696 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.27 ของจำนวนโครงการที่บันทึกทั้งหมด และยังมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 627 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.81 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ขอให้เร่งรัดการอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนและกลไกสวัสดิการชุมชนทุกโครงการ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

## ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน

- 1) การปรับแบบฟอร์มการอนุมัติ – เบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ (Codi Project Management System) หรือ Codi\_PMS ส่งผลให้ต้องมีการทำความเข้าใจทั้งเรื่องแบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการฯ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การอนุมัติ - เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
- 2) ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ที่ใช้ประกอบการเสนอขอรับงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน (งบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน) ไม่เรียบร้อย ส่งผลให้มีกองทุนสวัสดิการชุมชนขอคืนงบประมาณมายังส่วนกลาง
- 3) กลไกสวัสดิการชุมชนบางพื้นที่ ยังขาดความเข้าใจหลักคิด เจตนารมณ์ อุดมการณ์การสวัสดิการชุมชน ทำให้กองทุนสวัสดิการชุมชนในหลายพื้นที่ไม่เข้มแข็ง ซึ่งสำนักงานประสานขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชนมีแผนในการจัดทำคู่มือการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเครื่องมือดำเนินงานให้กับขบวนองค์กรชุมชน ผู้ปฏิบัติงาน พอช. รวมถึงหน่วยงานภาคีและผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และมีการส่งเสริมการอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน (Codi\_SWF) เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล
