


รายงานสถานะ
โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ เดือนมีนาคม 2566
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 210 ตำบล 7 จังหวัด 35 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 14,095.1 ล้านบาท ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ								งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน		การเบิกจ่าย		
			จำนวนโครงการ				กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์		งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		โปรแกรม CODI PM (RO1)		(ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน.โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล	ตำบลใหม่ 2566	ยกระดับตำบลเดิม 2565				จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
1	เหนือ	2,840,000	8	1	7	-	50	10	2,840,000	100.00	-	8	2,840,000	1,876,400	963,600	66.07
2	อีสาน	2,486,000	4	1	3	-	10	9	849,500	34.17	1,636,500	3	399,500	-	849,500	-
3	ใต้	2,486,000	13	-	7	6	32	29	2,286,000	91.95	200,000	13	2,286,000	1,301,500	984,500	56.93
4	กลางและตะวันตก	2,840,000	81	-	4	77	48	29	2,606,000	91.76	234,000	81	2,606,000	978,910	1,627,090	37.56
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,386,000	4	-	4	-	38	29	2,186,000	91.62	200,000	4	2,186,000	1,530,200	655,800	70.00
6	งบบริหารจัดการ	1,057,100	-	-	-	-	-	-	1,057,100	100.00	-	-	1,057,100	1,057,100	-	100.00
รวม		14,095,100	110	2	25	83	178	106	11,824,600	83.89	2,270,500	109	11,374,600	6,744,110	5,080,490	57.03

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน จำนวน 109 โครงการ งบประมาณ 11,374,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.69 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันตก และภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ที่ได้มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชนแล้ว ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคที่อนุมัติโครงการไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งรัดการอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งจัดส่งบันทึกที่ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายเลขา เพื่อดำเนินการสรุปภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 6,744,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.03 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 5,080,490 บาท ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานต่อไป ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ

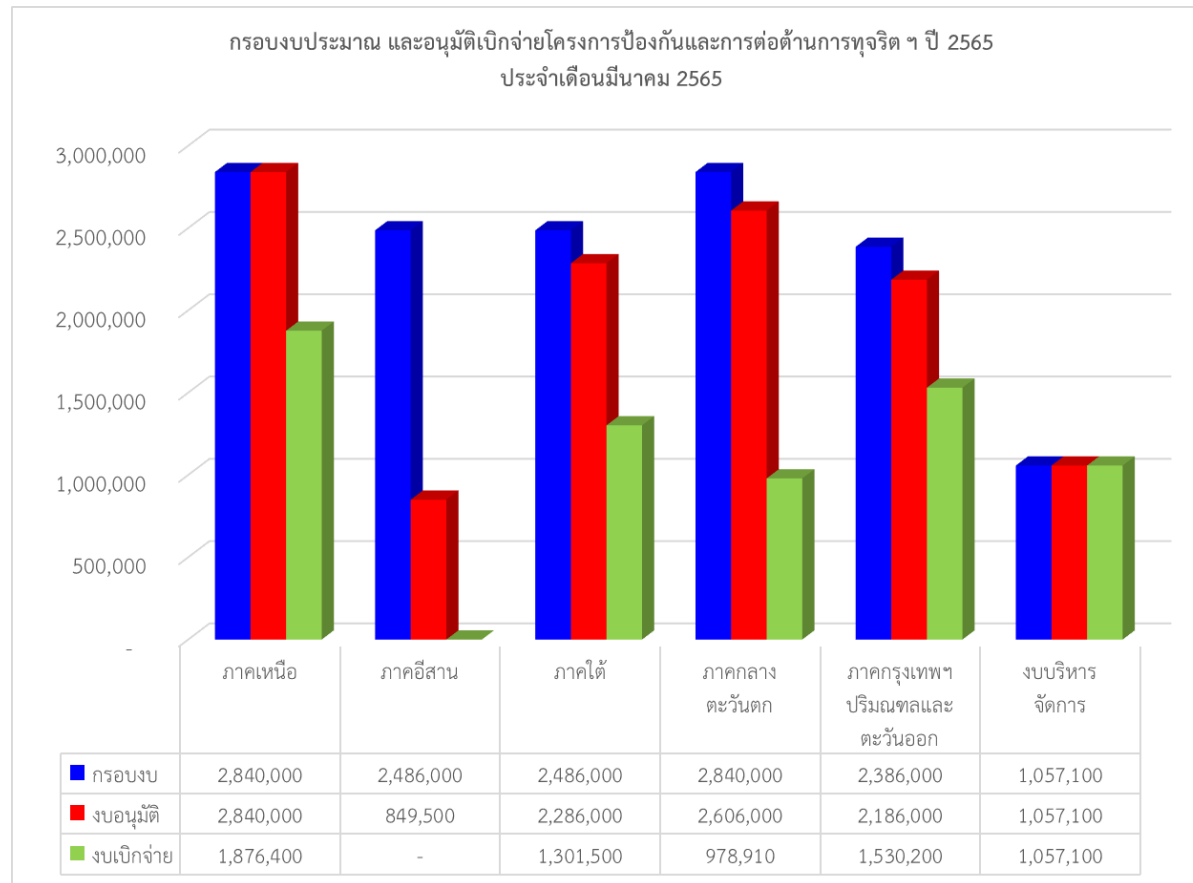

- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi_pms/) จากการตรวจทานข้อมูลโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 110 โครงการ ของ 5 ภาค และส่วนกลาง พบว่า มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวน 109 โครงการ และข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 99.09 ของจำนวนโครงการอนุมัติ ทั้งนี้ เจื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้แนบเอกสาร รายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ

ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก										เอกสารแนบ			
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนผู้รับผลประโยชน์		ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1
							ตำบลใหม่ 2566	ยกระดับตำบลเดิม 2565							
ภาคเหนือ	8	8	8	8	8	8	50	10	-	8	8	6	6	6	6
ภาคอีสาน	4	3	3	3	3	3	-	20	-	3	3	-	-	-	-
ภาคใต้	13	13	13	13	13	13	32	29	-	13	13	6	6	6	6
กลางตะวันตก	81	81	81	81	81	81	48	29	-	81	81	29	29	29	29
กทม.ตะวันออก	4	4	4	4	4	4	38	29	-	4	4	4	4	4	4
รวมคิดเป็นร้อยละ	110	109 99.09	109 99.09	109 99.09	109 99.09	109 99.09	168	117	-	109 99.09	109 99.09	45 40.91	45 40.91	45 40.91	45 40.91

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาหลักนกรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 110 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 34 วัน
- ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.82 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 56 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.18 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 62 วัน

จึงขอให้สำนักงานภาคที่รับผิดชอบเร่งการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐานพร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่ายงวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 8 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	50	17 - 27 วัน	14 - 37 วัน	41 - 54 วัน	49 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	25	17 - 25 วัน	31 - 42 วัน	56 - 59 วัน	58 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 2 โครงการ	25	13 - 20	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 60 วัน		
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ - โครงการ		-	-	-	-
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ		-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 4 โครงการ	100	27 - 37 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 62 วัน		
ใต้ 13 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 6 โครงการ	46.15	8 - 15 วัน	14 - 19 วัน	22 - 34 วัน	26 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 7 โครงการ	53.85	14 - 15 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 30 วัน		
กลางและตะวันตก 81 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 30 โครงการ	37.04	14 วัน	33 - 41 วัน	47 - 55 วัน	51 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 51 โครงการ	62.96	9 - 21 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 57 วัน		
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตะวันออก 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	100	1 วัน	6 - 13 วัน	7 - 14 วัน	10 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก - วัน		
รวม 110 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 44 โครงการ	40	1 - 27 วัน	6 - 37 วัน	7 - 54 วัน	34 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	1.82	17 วัน	31 วัน	56 วัน	56 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 64 โครงการ	58.18	9 - 37 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 57 - 62 วัน		
