

รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


ณ เดือนมีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 120 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 7,237,100 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ										งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบโปรแกรม CODI Project		การเบิกจ่าย		
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์				งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
							จังหวัดใหม่ ปี 68	ยกระดับจังหวัดเดิม	ตำบลใหม่ ปี 68	ยกระดับตำบลเดิม								
1	เหนือ	1,120,000	4	-	4	-	1	3	20	25	1,120,000	100	-	4	1,120,000	70,000	1,050,000	6.25
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,785,000	8	1	7	-	2	5	40	25	1,785,000	100	-	7	1,665,000	1,005,200	779,800	56.31
3	ใต้	1,120,000	6	-	6	-	1	5	20	25	1,120,000	100	-	6	1,120,000	777,100	342,900	69.38
4	กทม.ตะวันออก	1,275,000	7	-	7	-	1	6	20	30	1,275,000	100	-	7	1,275,000	892,500	382,500	70.00
5	กลางตะวันตก	1,120,000	47	-	2	45	1	1	20	25	1,120,000	100	-	47	1,120,000	1,064,500	55,500	95.04
6	งบส่วนกลาง	201,947	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	201,947	-	-	-	-	-
7	งบบริหารจัดการ	615,153	1	1	-	-	-	-	-	-	615,153	100	-	1	615,153	615,153	0	100
	รวม	7,237,100	73	2	26	45	6	20	120	130	7,035,153	97.21	201,947	72	6,915,153	4,424,453	4,564,153	62.89

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 73 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับภาค/ชาติ จำนวน 2 โครงการ , โครงการระดับจังหวัด จำนวน 26 โครงการ และโครงการระดับตำบล จำนวน 45 โครงการ จำนวนงบประมาณ 7,237,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาค 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ครบทั้งหมด จากจำนวน 72 โครงการ ร้อยละ 100 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ บบริหารจัดการ ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ส่วนงบส่วนกลาง ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ
- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi\_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 72 โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,915,153 บาท ซึ่งโครงการ ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุมัติในระบบโปรแกรม codi\_pms ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2568 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสำนักงาน ภาคดำเนินการบันทึกอนุมัติโครงการที่เหลือในระบบโปรแกรมให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เสร็จไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi\_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 66 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,424,453 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.89 ของงบอนุมัติ โดยมีจำนวน 6 โครงการ ที่ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1) ภาคเหนือ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเครือข่ายสร้างสังคมสุจริต จังหวัดพิจิตร ปี 2568 2) โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ปี 2568 3) โครงการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน จังหวัดพะเยา ปี 2568 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2568 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ 2) โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2568 จังหวัดสุรินทร์ 3) โครงการป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2568 จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เสร็จไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่าย งบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ตาม จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน นำไปใช้ขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้นั้น

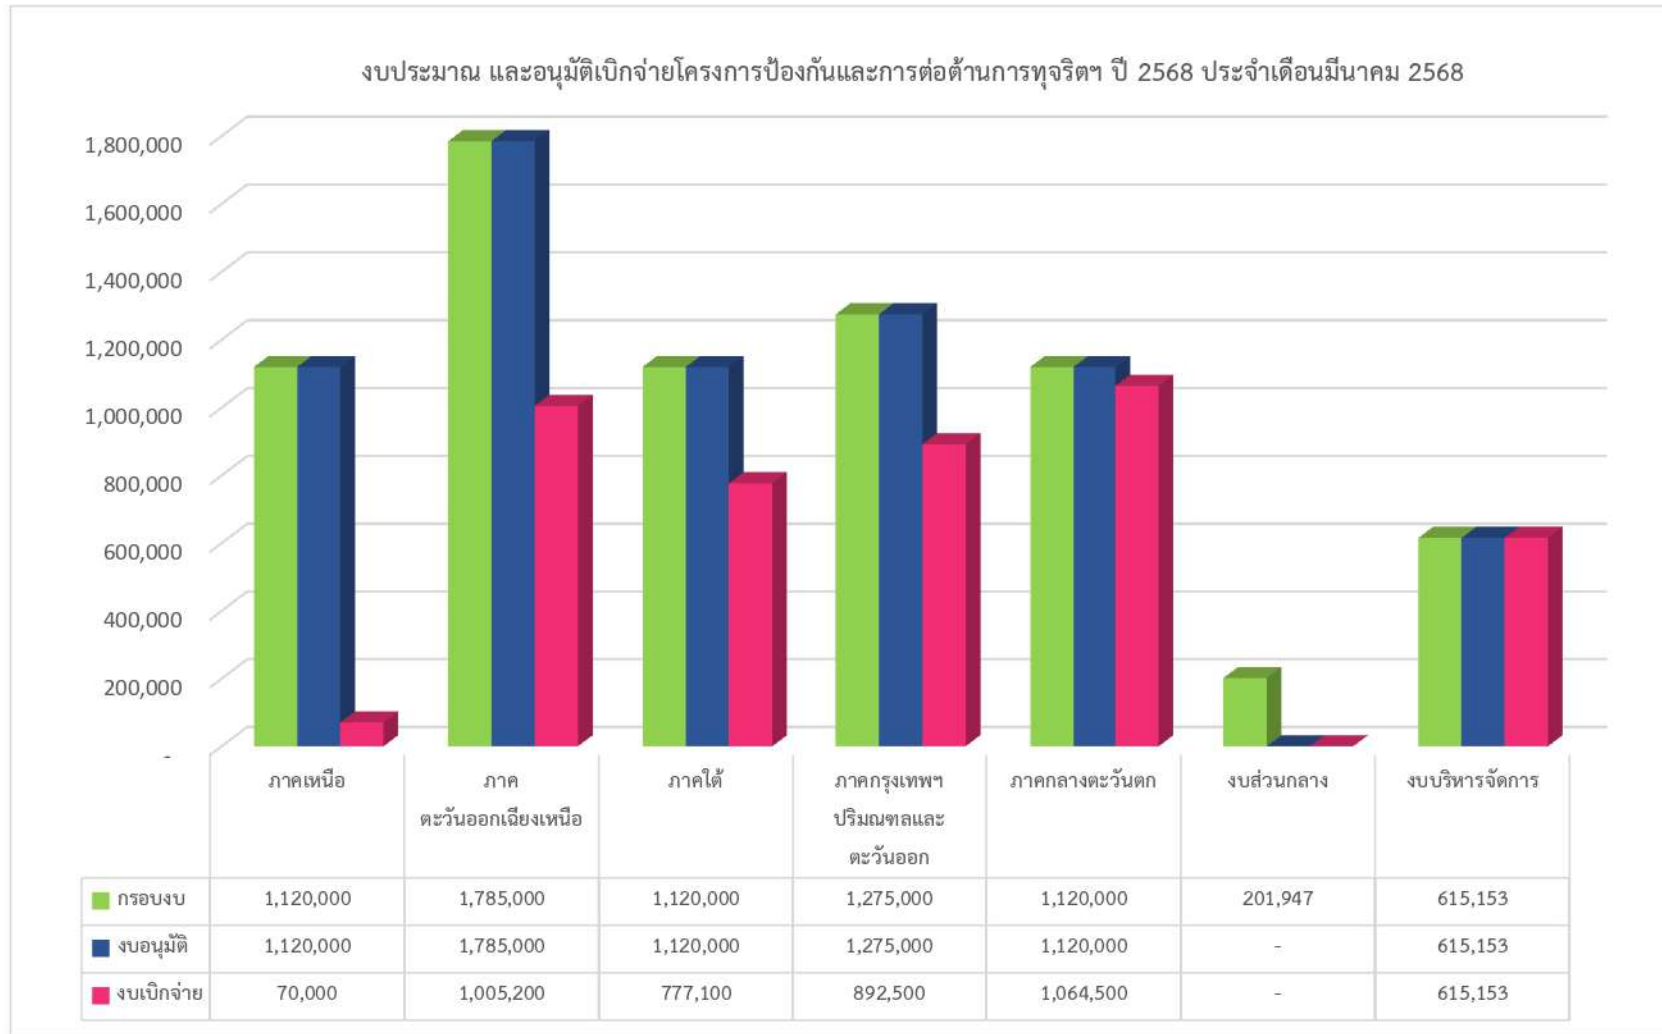

- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI - PM เฟส 2 ([app2.codi.or.th/codi\\_pms/](http://app2.codi.or.th/codi_pms/)) จากการตรวจทานข้อมูลโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร โดยโครงการที่ได้อนุมัติในระบบ codi\_pms จำนวนทั้งหมด 72 โครงการ พบว่า มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 72 โครงการ ซึ่งข้อมูลที่มีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 91.67 ของจำนวนโครงการอนุมัติ

ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่ได้กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ ต่อไป


ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก										เอกสารแนบ			
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนผู้รับผลประโยชน์		ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1
							ตำบลใหม่ปี 2568	ยกระดับตำบลเดิม							
เหนือ	4	4	4	4	4	4	20	25	-	4	1	1	1	1	1
ตะวันออกเฉียงเหนือ	7	7	7	7	7	7	40	25	-	7	7	6	5	6	6
ใต้	6	6	6	6	6	6	20	25	-	6	6	6	6	6	6
กทม.ตะวันออก	7	7	7	7	7	7	20	30	-	7	7	7	7	7	7
กลางตะวันตก	47	47	47	47	47	47	20	25	-	47	47	47	47	47	47
งบบริหารจัดการ	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1
รวมคิดเป็นร้อยละ	72	72 (100%)	72 (100%)	72 (100%)	72 (100%)	72 (100%)	120	130	-	72 (100%)	69 (95.83%)	67 (93.06%)	66 (91.67%)	68 (94.44%)	68 (94.44%)

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาถ้อยแถลงจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแบ่งเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 71 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.54 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 46 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.01 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 59 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.45 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลายังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 74 วัน

ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคเร่งการเบิกจ่ายในอีก 6 โครงการ รายละเอียดตามรายงานข้างต้น โดยตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายโครงการ ฯ เพื่อดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน และเกิดการออกแบบการบริหารโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

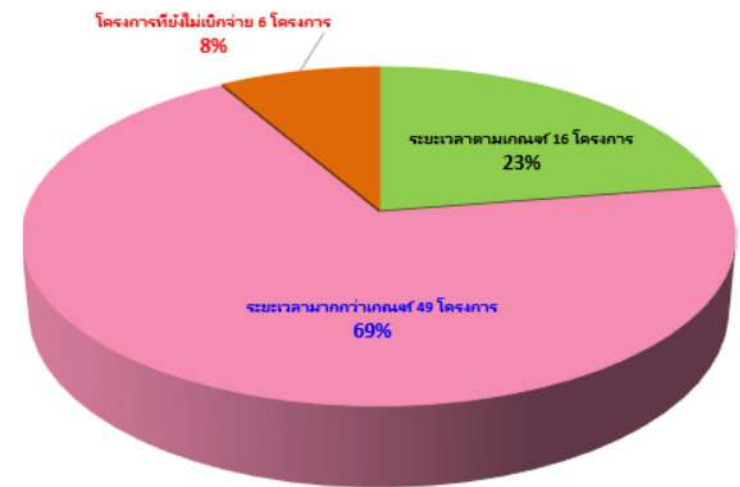

แผนภูมิ : แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการภาพรวม

ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 4 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	25	12 วัน	46 วัน	58 วัน	58 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 3 โครงการ	75	5 - 29 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 33 - 57 วัน		
ตะวันออกเฉียงเหนือ 7 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	14.29	18 วัน	31 วัน	49 วัน	49 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	42.86	18 - 29 วัน	42 - 60 วัน	60 - 89 วัน	77 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 3 โครงการ	42.86	10 - 18 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 60 - 74 วัน		
ใต้ 6 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	50	7 - 8 วัน	43 - 47 วัน	51 - 54 วัน	53 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	50	6 - 10 วัน	51 - 59 วัน	57 - 67 วัน	62 วัน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 7 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 7 โครงการ	100	1 - 14 วัน	19 - 53 วัน	27 - 54 วัน	43 วัน
กลางและตะวันตก 47 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	10.64	5 - 12 วัน	27 - 46 วัน	39 - 51 วัน	47 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 42 โครงการ	89.36	5 - 12 วัน	44 - 58 วัน	56 - 63 วัน	58 วัน
รวม 71 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 16 โครงการ	22.54	1 - 18 วัน	19 - 53 วัน	27 - 54 วัน	46 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 49 โครงการ	69.01	5 - 29 วัน	42 - 60 วัน	56 - 89 วัน	59 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 6 โครงการ	8.45	5 - 29 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 33 - 74 วัน		

## ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน

- 1) งบประมาณที่จัดสรรไม่สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานขององค์กรชุมชน ส่งผลให้การใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตขาดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพ
- 2) ยังไม่มีการพัฒนากลไกคณะทำงานกลาง ที่มีบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุน เชื่อมโยง และเสริมพลังการขับเคลื่อนงานในประเด็นการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นระบบ
- 3) ขาดกลไกการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และระดับนโยบาย ทำให้การขับเคลื่อนงานระหว่างตำบล จังหวัด และภาคส่วนต่าง ๆ ไม่สอดคล้องประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
