

รายงานสถานะ


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนมีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการและงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 250 ตำบล/เมือง 77 จังหวัด โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 19,996,900 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2568 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (1)	เสนอ ผอ. อนุมัติ						งบ คงเหลือ ที่ยัง ไม่อนุมัติ (1)-(2)	โครงการอนุมัติใน CODI Project		การเบิกจ่าย			ร้อยละการ เบิกจ่ายจาก กรอบงบ (3)/(1)*100
			จน. โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	งบอนุมัติ (2)	ร้อยละการ อนุมัติ (2)/(1)*100		จน. โครงการ ที่อนุมัติ	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย R07 (3)	งบคงเหลือ (2)-(3)	ร้อยละ เบิกจ่ายจาก งบอนุมัติ (3)/(2)*100	
1	เหนือ	1,200,000	4	4			1,200,000	100	-	4	1,200,000	-	1,200,000	0.00	0.00
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,200,000	4	4			1,200,000	100	-	4	1,200,000	695,000	505,000	57.92	57.92
3	ใต้	1,200,000	14	4		10	1,200,000	100	-	14	1,200,000	790,000	410,000	65.83	65.83
4	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก	1,200,000	4	4			1,200,000	100	-	4	1,200,000	560,000	640,000	46.67	46.67
5	กลางตะวันตก	1,200,000	4	4			1,200,000	100	-	4	1,200,000	840,000	360,000	70.00	70.00
6	สนง.ประสานขบวนฯ	246,248					-	-	246,248						
7	งบบริหารจัดการ	580,252	1	1			580,252	100	-	1	580,252		580,252	0	0
	รวม	6,826,500	31	21	-	10	6,580,252	96	246,248	31	6,580,252	2,885,000	3,695,252	43.84	42.26

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 161 โครงการ และงบบริหารจัดการ ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แล้วจำนวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 18,376,636 บาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาค 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่องค์กรชุมชน จำนวน 160 โครงการ รวมงบประมาณ 16,706,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.68 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ส่วนงบส่วนกลาง งบเครือข่ายสลัมสี่ภาคและงบประชาสังคม ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ
- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 161 โครงการ จำนวนงบประมาณ 19,132,472 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 161 โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,535,261 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.56 ของงบอนุมัติ โดยมีจำนวน 40 โครงการ ที่ยังไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1) ภาคเหนือ จำนวน 20 โครงการ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 โครงการ 3) ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก จำนวน 7 โครงการ ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ตามจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ขบวนองค์กรชุมชน นำไปใช้ขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้นั้น

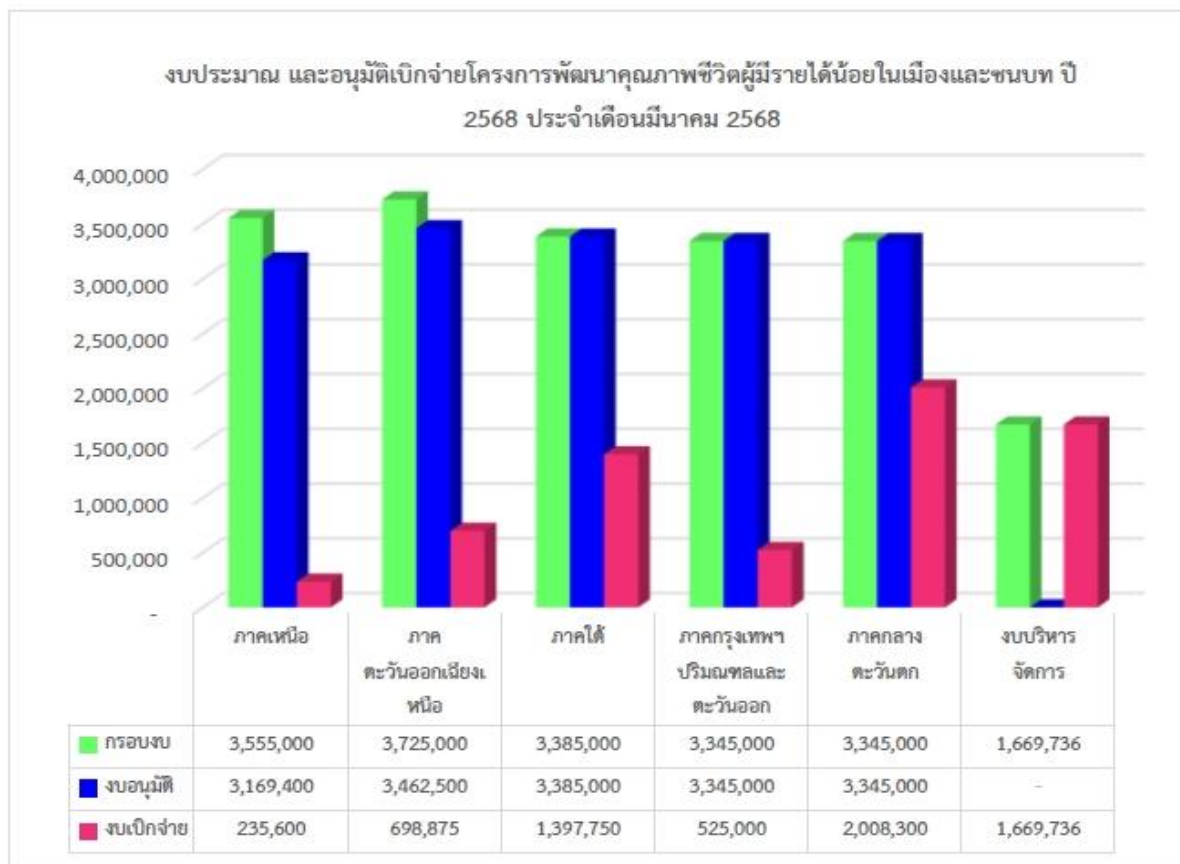

- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI - PM เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi_pms/) จากการตรวจทานข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร โดยโครงการของสำนักงานภาค 5 ภาค มีโครงการที่ได้อนุมัติในระบบ codi_pms จำนวนทั้งหมด 161 โครงการ พบว่า มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 161 โครงการ ซึ่งข้อมูลที่มีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 74.53 ของจำนวนโครงการอนุมัติ


ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก										
		มติ กก. ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กร ผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	บัญชีผู้รับ เงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารแนบ			
									MOU	สำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคาร	แบบแสดง ผล อนุมัติ	เอกสาร เบิกจ่าย งวดที่1
ภาคเหนือ	23	23	23	23	23	23	15	6	6	6	6	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20	20	20	20	20	20	18	12	14	12	12	
ภาคใต้	48	48	48	48	48	48	48	37	37	37	37	
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	12	12	12	12	12	12	9	8	12	8	8	
ภาคกลางตะวันตก	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
งบบริหารจัดการ	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	
รวม	161	161	161	161	161	161	148	120	126	121	121	
คิดเป็นร้อยละ		100	100	100	100	100	91.93	74.53	78.26	75.16	75.16	

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับ การสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาครั้งรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแบ่งเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึงผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึง การเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 161 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.33 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 43 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.83 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 63 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.84 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลายังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 53 วัน

ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคเร่งการเบิกจ่ายโครงการ รายละเอียดตามรายงานข้างต้น โดยตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายโครงการ ฯ เพื่อดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน และเกิดการออกแบบการบริหารโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

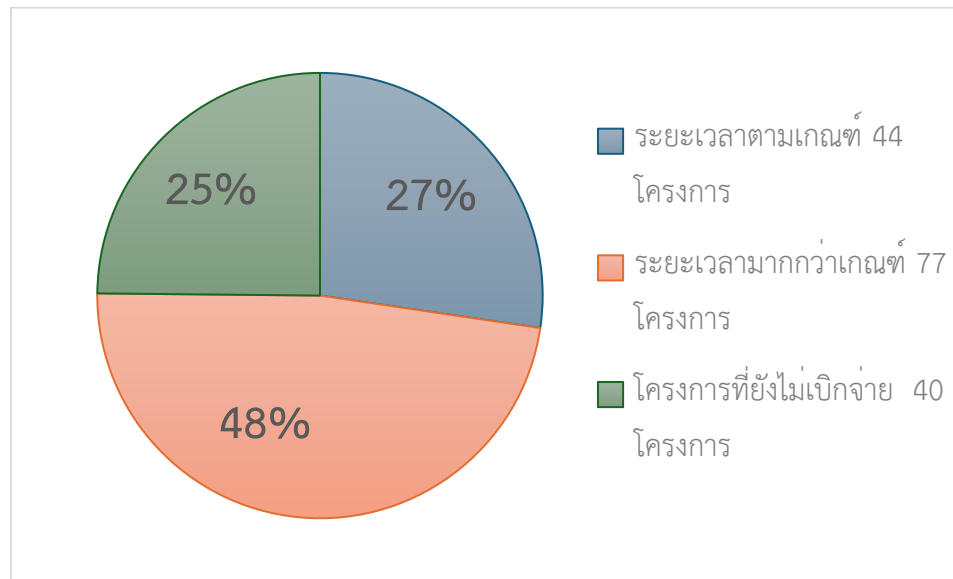

แผนภูมิ : แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการ

ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่ายงวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 23 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	13.04	12 - 21 วัน	46 - 53 วัน	58 - 74 วัน	63 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 20 โครงการ	86.96	5 - 29 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 35 - 63 วัน		
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 2 โครงการ	10	18 - 29 วัน	25 - 31 วัน	49 - 54 วัน	51 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 5 โครงการ	25	18 - 30 วัน	36 - 57 วัน	57 - 87 วัน	65 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 13 โครงการ	65	10 - 38 วัน	22 - 58 วัน	37 - 76 วัน	63 วัน
ใต้ 48 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	10.42	7 - 8 วัน	43 - 47 วัน	51 - 54 วัน	53 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 43 โครงการ	89.58	6 - 8 วัน	50 - 60 วัน	57 - 66 วัน	61 วัน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 12 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	41.67	1 - 14 วัน	13 - 47 วัน	27 - 48 วัน	36 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 7 โครงการ	58.33	9 - 14 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 36 - 41 วัน		
กลางและตะวันตก 57 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 32 โครงการ	56.14	5 - 15 วัน	17 - 50 วัน	29 - 55 วัน	42 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 25 โครงการ	43.86	5 - 15 วัน	44 - 57 วัน	56 - 72 วัน	60 วัน
งบบริหารจัดการ 1 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	100	112 วัน	66 วัน	178 วัน	178 วัน
รวม 161 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 44 โครงการ	27.33	5 - 29 วัน	13 - 50 วัน	27 - 55 วัน	43 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 77 โครงการ	47.83	5 - 112 วัน	36 - 66 วัน	56 - 178 วัน	63 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 40 โครงการ	24.84	5 - 38 วัน	22 - 58 วัน	35 - 76 วัน	53 วัน

ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน

- 1) กระบวนการเสนอโครงการจากเครือข่ายภาคประชาสังคมยังมีข้อจำกัด ทั้งในด้านความพร้อมและขั้นตอนที่ซับซ้อน ทำให้การพิจารณาและอนุมัติโครงการเกิดความล่าช้า และมีเวลาในการดำเนินโครงการน้อยกว่าที่ควร
