

รายงานสถานะ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนมิถุนายน 2568 รอบ 9 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 100 ตำบล/เมือง 20 จังหวัด โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6,826,500 บาท


(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568)

ที่	ภาค	กรอบงบ (1)	เสนอ ผอ. อนุมัติ						งบ คงเหลือ ที่ยัง ไม่อนุมัติ (1) - (2)	โครงการอนุมัติใน CODI Project		การเบิกจ่าย			
			จน. โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	งบอนุมัติ (2)	ร้อยละการ อนุมัติ (2)/(1)*100				จน. โครงการ ที่อนุมัติ	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย R07 (3)	งบคงเหลือ (2)-(3)
1	เหนือ	1,200,000	4	4	-		1,200,000	100	-	4	1,200,000	1,200,000	-	100.00	0.00
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,200,000	4	4	-		1,200,000	100	-	4	1,200,000	828,000	372,000	69.00	69.00
3	ใต้	1,200,000	24	4	-	20	1,200,000	100	-	14	1,200,000	790,000	410,000	65.84	65.84
4	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก	1,200,000	4	4	-		1,200,000	100	-	4	1,200,000	840,000	360,000	70.00	70.00
5	กลางตะวันตก	1,200,000	4	4	-		1,200,000	100	-	4	1,200,000	840,000	360,000	70.00	70.00
6	สนง.ประสานขบวนฯ	246,248	1	-	-		246,248	-	-	1	246,248	-	246,248	-	-
7	งบบริหารจัดการ	580,252	1	-	-		580,252	100	-	1	580,252	580,252	-	100	100
รวม		6,826,500	42	20	-	20	6,826,500	100	-	32	6,826,500	5,078,052	1,748,248	74.39	74.39

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น 32 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับจังหวัด 20 โครงการ โครงการระดับตำบล 10 โครงการ โดยสำนักงานภาค 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่องค์กรชุมชน จำนวน 30 โครงการ รวมงบประมาณ 6,000,000 บาท นอกจากนี้มีงบบริหารจัดการและงบส่วนกลาง ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แล้วจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 826,500 บาท รวมงบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น 6,826.500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หมายเหตุ สำนักงานภาคใต้ จำนวนโครงการที่เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ 24 โครงการ(องค์กร) จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม 14 โครงการ)
- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 32 โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,826,500 บาท ทั้งนี้ สำนักงานภาค 5 ภาค และส่วนกลางได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว มีการบันทึกข้อมูลโครงการแผนงานกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการครบถ้วน
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 5,078,252 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.39 ของงบอนุมัติ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวนงบประมาณ 1,748,248 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.61 ของงบอนุมัติ โดยสำนักงานภาค ทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการฯ ในงวดแรกครบ 100% ทั้งนี้ มีโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 2 งวด ทั้งหมด 26 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 โครงการ ภาคใต้ จำนวน 14 โครงการ ภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก จำนวน 4 โครงการ และภาคกลางและตะวันตก จำนวน 4 โครงการ เพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชน มีงบประมาณในการขับเคลื่อนงานตามแผนกิจกรรมที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือสำนักงานภาคในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวด 2 พร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่ายในระบบโปรแกรมให้ครบถ้วน

ข้อสังเกต จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบโปรแกรม พบว่าโครงการฯ ครบกำหนดแผนการเบิกจ่ายงวดที่ 2 ของแต่ละภาค ดังนี้ **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** ครบกำหนดเดือน มิถุนายน - กันยายน 2568 จำนวน 2 โครงการ และเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568 จำนวน 2 โครงการ **ภาคใต้** ครบกำหนดเดือนมิถุนายน - กันยายน 2568 จำนวน 14 โครงการ **ภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก** ครบกำหนด เดือนมิถุนายน - กันยายน 2568 จำนวน 4 โครงการ และ**ภาคกลางและตะวันตก** ครบกำหนด เดือนมิถุนายน - กันยายน 2568 จำนวน 4 โครงการ

กราฟแสดง งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TP MAPและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2568

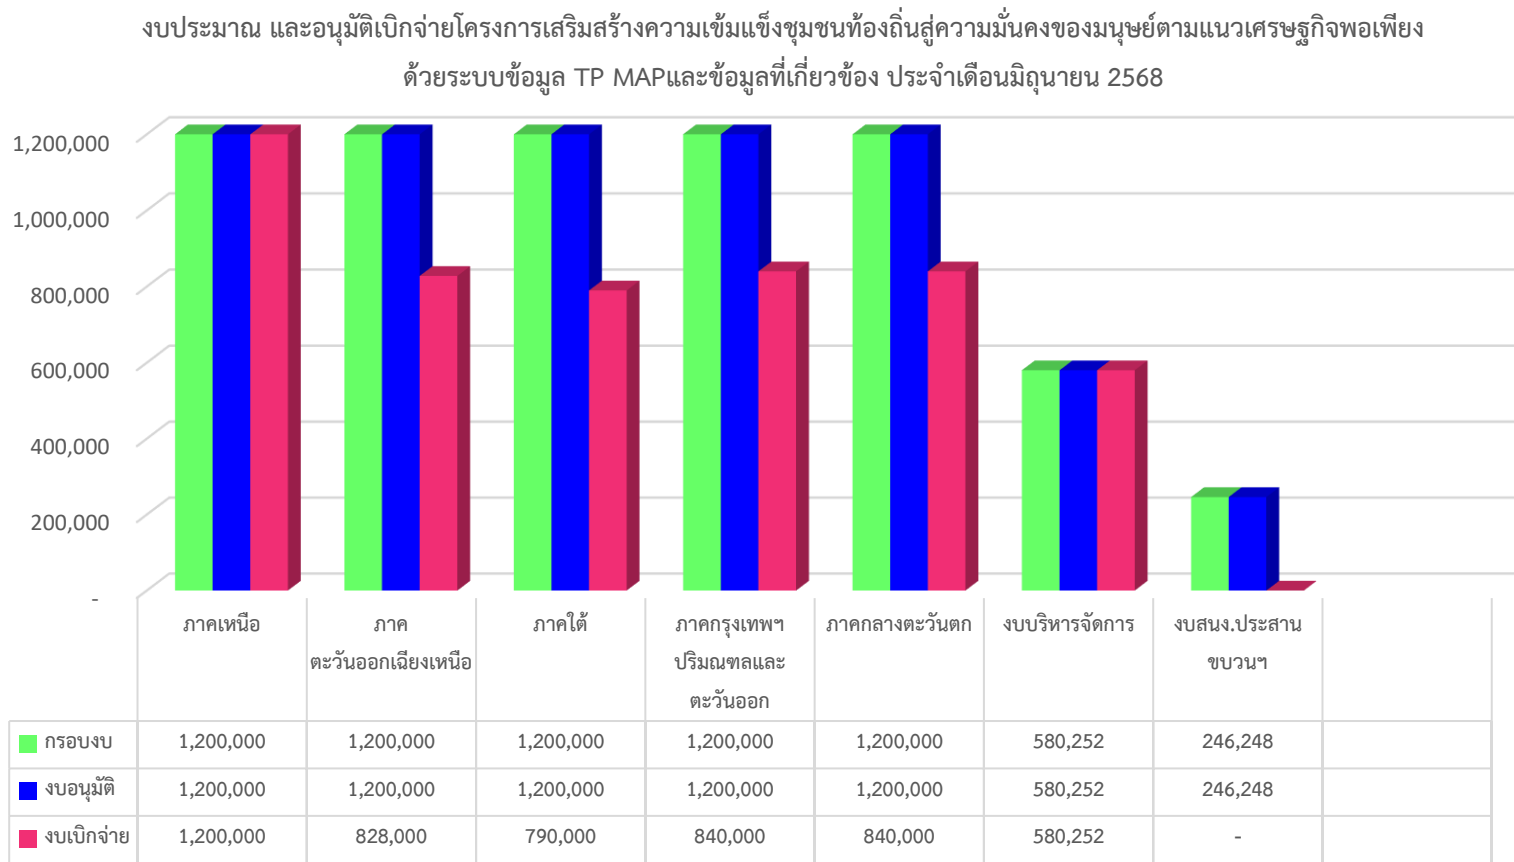

ตารางการแสดงผลสถานะการดำเนินงานบันทึกข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi_pms/)

ตารางการแสดงผลสถานะการดำเนินงานบันทึกข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI- PMS (app2.codi.or.th/codi_pms/)


ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก													
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารแนบ						
									MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	หนังสือมอบอำนาจ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่2	เอกสารปิดโครงการ
ภาคเหนือ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
ภาคใต้	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
ภาคกลางตะวันตก	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
สนง.ประสานขบวนฯ (เครือข่าย 5 ภาค)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบบริหารจัดการ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวม	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
คิดเป็นร้อยละ		97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97		

- จากการตรวจทานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TP MAP และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการบันทึกข้อมูลและการแนบเอกสาร ในระบบโปรแกรมฯ CODI – PMS ประกอบด้วย ข้อมูลโครงการและการแนบไฟล์เอกสาร ได้แก่ บันทึกความร่วมมือ (MOU) แบบแสดงผลอนุมัติสำเนาสมุดบัญชี หนังสือมอบอำนาจ เอกสารเบิกจ่าย งวด 1 โดยมีโครงการที่อนุมัติจำนวน 31 โครงการ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในระบบโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ CODI – PMS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมนี้ ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแนบเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการในระยะต่อไป

ตารางแสดงระยะเวลาการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TP MAPและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่ายงวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	25	6 วัน	44 วัน	50 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	75	5 - 29 วัน	53 - 79 วัน	58 - 89 วัน	76 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 4 โครงการ	100	18 - 37 วัน	54 - 60 วัน	77 - 91 วัน	84 วัน
ใต้ 14 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 6 โครงการ	42.86	6 วัน	34 วัน	40 วัน	40 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 8 โครงการ	57.14	6 - 10 วัน	51 - 59 วัน	57 - 67 วัน	63 วัน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	100	9 - 14 วัน	19 - 39 วัน	33 - 50 วัน	40 วัน
กลางและตะวันตก 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	75	5 - 15 วัน	8 - 36 วัน	23 - 41 วัน	31 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	25	5 - 14 วัน	36 - 46 วัน	41 - 60 วัน	51 วัน
งบบริหารจัดการ 1 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	100	112 วัน	66 วัน	178 วัน	178 วัน
งบบัณฑิตส่วนกลาง 1 โครงการ	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	100	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ			
รวม 32 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 14 โครงการ	43.75	5 - 15 วัน	8 - 44 วัน	23 - 50 วัน	38 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 17 โครงการ	53.13	5 - 112 วัน	46 - 79 วัน	57 - 178 วัน	77 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	3.125	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ			

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา ได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาครั้งกรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแบ่งเป็น
 - 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึงผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ
 - 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

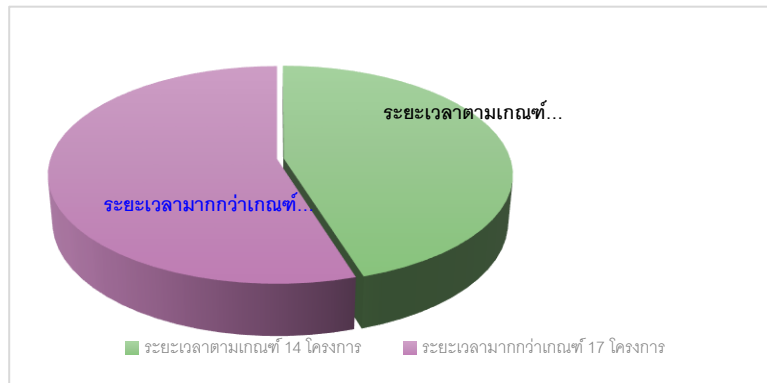

การบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมจำนวน 31 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 38 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.13 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 77 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.12 ของโครงการทั้งหมด

ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาค 5 ภาคและส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งการเบิกจ่ายโครงการ รายละเอียดตามรายงานข้างต้น โดยตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายโครงการ ฯ เพื่อดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน และเกิดการออกแบบการบริหารโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TP MAPและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลชุมชนกับข้อมูล TP MAP ภาครัฐ โดยชุมชนร่วมกันทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มคนเปราะบาง ปัญหาความเดือดร้อนและบริบทของชุมชนใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ในการปฏิบัติงานจริงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานเป็นไปได้ยาก เนื่องจากวิธีการและเครื่องมือหรือแบบฟอร์ม มีความหลากหลาย ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มายังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของผู้รับประโยชน์ และการนำไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อน ยังไม่ได้ผล ควรจะมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และร่วมกันหารือออกแบบและวางแผนโครงการในการช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้น
- 2) เป้าหมายผลลัพธ์ของโครงการกำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่การปฏิบัติจริงไม่สามารถแก้ไขหรือตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด เช่น กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนเดือดร้อน คนจน ที่ตรวจสอบจากข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งขาดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ยังคงรอระบบการช่วยเหลือจากหน่วยงาน ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ไม่บรรลุตามเป้าหมายเท่าที่ควร
