

รายงานสถานะ

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมของคนในชุมชนและสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนดำเนินการ โดยความต้องการของคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายใต้การจัดสวัสดิการชุมชนที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่ดำเนินการ จำนวน 6,053 กองทุน สมาชิก 6,736,097 คน เงินกองทุนสะสม 23,731,727,565 บาท มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนและผู้เปราะบางทางสังคม จำนวน 12,909,992 คน งบประมาณ 10,880,486,353.53 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถาบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบกองทุน พัฒนากองทุนและกลไกสวัสดิการชุมชนทุกระดับ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวนงบประมาณ 242,866,500 บาท โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) งบค่าบริหารจัดการ จำนวนงบประมาณ 12,143,325 บาท (ร้อยละ 5) 2) งบสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ งบประมาณ 230,723,175 บาท (ร้อยละ 95) ภายใต้ 4 แผนงานสำคัญ ประกอบด้วย (1) การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเป้าหมาย 1,480 กองทุน สมาชิก 2,074,744 คน จำนวนงบประมาณ 201,143,998 บาท (2) การจัดสวัสดิการและการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน เป้าหมาย 277 กองทุน จำนวนงบประมาณ 2,770,000 บาท (3) การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับชาติ ภาค จังหวัดและโซน จำนวนงบประมาณ 25,809,177 บาท และ (4) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เป้าหมาย 100 กองทุน จำนวนงบประมาณ 1,000,000 บาท

จากการติดตามข้อมูลการอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568) โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ที่	ภาค	กรอบ งบประมาณ (บาท)	เสนอ ผอ.อนุมัติ									งบประมาณ คงเหลือที่ยัง ไม่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจากการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM (R07)				บันทึกข้อมูลในระบบ CODI - PM (R01)		
			ภาค	จังหวัด			ตำบล		รวม โครงการ ทั้งหมด	งบอนุมัติ	ร้อย ละงบ อนุมัติ		จน. โครงการ	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	จน. สมาชิก (คน)	งบอนุมัติ (บาท)
				กลไก	พัฒนา	จัดตั้ง	สมทบ												
							จน. โครงการ	จน. สมาชิก											
1.	กทม - ตะวันออก	25,278,436	1	13	21	3	168	233,963	182	25,278,436	100	0	179	25,001,584	276,852	98.90	187	274,828	25,278,436
2.	กลาง - ตะวันตก	17,048,003	1	13	18	29	143	142,732	157	17,035,907	99.93	12,096	110	17,035,907	0	100	121	109,596	17,055,683
3.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	78,115,064	1	20	136	55	478	745,819	499	78,079,832	99.95	35,232	459	78,079,832	0	100	474	714,876	78,079,832
4.	ใต้	43,960,393	1	14	52	-	334	414,321	349	42,821,161	97.41	1,139,232	210	42,821,161	0	100	215	218,834	42,821,161
5.	เหนือ	54,602,102	1	17	50	13	347	523,905	365	54,257,846	99.37	344,256	308	54,137,366	120,480	99.78	319	435,219	54,187,166
6.	เครือข่ายสวัสดิการ ชุมชน 5 ภาค	11,719,177	3	-	-	-	-	-	3	13,249,993	113.06	0	3	11,787,493	1,462,500	88.96	3	-	13,249,993
7.	งบบริหารจัดการ	12,143,325	1	-	-	-	-	-	1	12,143,325	100	0	1	12,143,325	0	100	1	-	12,143,325
รวมทั้งหมด			9	77	277	100	1,470	2,060,740	1,556	242,866,500	100	1,530,816	1,270	241,006,668	1,859,832	99.23	1,320	1,753,353	242,815,596

- จากตารางแสดงข้อมูล พบว่างบประมาณเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ มียอดงบประมาณคงเหลือยังไม่อนุมัติจำนวน 1,530,816 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งเป็นงบคงเหลือคืนในหมวดงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน ฝ่ายเลขานุฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการสานพลังภาคีพัฒนาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค พร้อมนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว
- การอนุมัติงบประมาณของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค มีการอนุมัติงบประมาณเกินจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,530,816 บาท เนื่องจากเป็นงบที่จัดสรรเพิ่มเติมจากงบประมาณคงเหลือตามมติคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568
- กรณีจำนวนโครงการที่เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (จำนวน 1,556 โครงการ) กับจำนวนโครงการที่เบิกจ่ายในระบบโปรแกรม CODI – PM (R07) (จำนวน 1,270 โครงการ) มีจำนวนต่างกัน 286 โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการในหมวดงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งการอนุมัติและเบิกจ่ายรวมอยู่ในโครงการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด (จังหวัดจัดการตนเอง) 13 จังหวัด ที่มีการบันทึกอนุมัติ/เบิกจ่ายเพียงโครงการเดียวจึงทำให้ข้อมูลการอนุมัติและโครงการเบิกจ่ายไม่เท่ากัน มีรายละเอียด ดังนี้
 - ▶ ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก จำนวน 3 โครงการ ในจังหวัดตราด
 - ▶ ภาคกลางและตะวันตก รวมจำนวน 47 โครงการ จาก 2 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดชัยนาท 12 โครงการ และ (2) สุพรรณบุรี 35 โครงการ
 - ▶ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวน 40 โครงการ จาก 2 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดหนองคาย 11 โครงการ และ (2) อานาจเจริญ 29 โครงการ
 - ▶ ภาคใต้ รวมจำนวน 139 กองทุน จาก 4 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดนครศรีธรรมราช 94 โครงการ (2) พัทลุง 29 โครงการ (3) กระบี่ 5 โครงการ (4) ภูเก็ต 8 โครงการ และ (5) พังงา 3 โครงการ
 - ▶ ภาคเหนือ รวมจำนวน 57 โครงการ จาก 3 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดพะเยา 35 โครงการ (2) แม่ฮ่องสอน 7 โครงการ และ (3) เชียงราย 15 โครงการ
- โครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการ พบว่ามีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,556 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 242,866,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- การเบิกจ่ายงบประมาณจากการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PMS (R07) พบว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,270 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณเบิกจ่ายจำนวน 241,006,668 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.23 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย เพียงจำนวน 1,859,832 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณงวดที่ 2 ของ (1) งบสนับสนุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,265,044 บาท และงบประมาณสนับสนุนกลไกสวัสดิการชุมชนระดับภาคและจังหวัด งวดที่ 2 ของสำนักงาน 2 ภาค ได้แก่ **ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 276,852 บาท** จากโครงการระดับภาค จำนวน 1 โครงการ และโครงการระดับจังหวัด 3 โครงการ ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ และภาคเหนือจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 120,480 บาท จากโครงการระดับจังหวัด 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงรายและตาก จากการติดตามการ

ดำเนินงานสำนักงานภาค ได้ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2568 ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ขอให้สำนักงานภาคและสำนักงาน ประสานขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568 เพื่อให้ขบวนองค์กรชุมชนใช้ในการดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนงานโครงการ


- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการบันทึกในระบบโปรแกรมฯ Codi_PMS (R01) พบว่ามีจำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรมฯ CODI – PM ได้ จำนวน 1,320 โครงการ วงเงินงบประมาณ 242,815,596 บาท ซึ่งมากกว่าจำนวนโครงการการอนุมัติเบิกจ่ายในระบบโปรแกรม CODI – PM (R07) จำนวน 50 โครงการ เนื่องจากมีการบันทึก ข้อมูลโครงการซ้ำและยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ – แผนงาน – กิจกรรมและงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในระบบโปรแกรมฯ Codi_PMS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

กราฟแสดงการติดตามข้อมูลการอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

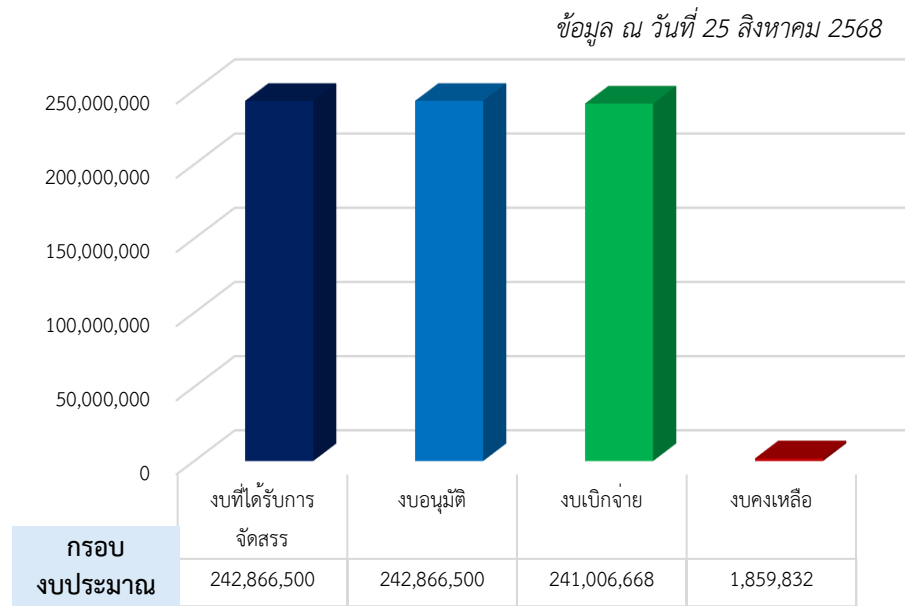

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,556 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 242,866,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบ่งเป็น
 - 1) งบสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,555 โครงการ วงเงินงบประมาณ 230,723,175 บาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีรายละเอียด ดังนี้
 - ▶ โครงการระดับชาติ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค
 - ▶ โครงการระดับภาค จำนวน 5 โครงการ ครอบคลุม 5 ภาค
 - ▶ โครงการระดับจังหวัด จำนวน 77 โครงการ ครอบคลุม 76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับจังหวัด ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่
 - (1) การจัดสวัสดิการและการพัฒนากองทุน 277 โครงการ
 - (2) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 100 กองทุน
 - (3) กลไกระดับโซน
 - ▶ โครงการระดับตำบล จำนวน 1,470 โครงการ สมาชิก 2,060,740 คน
 - 2) งบบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 12,143,325 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

กราฟแสดงการอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (รายภาค)

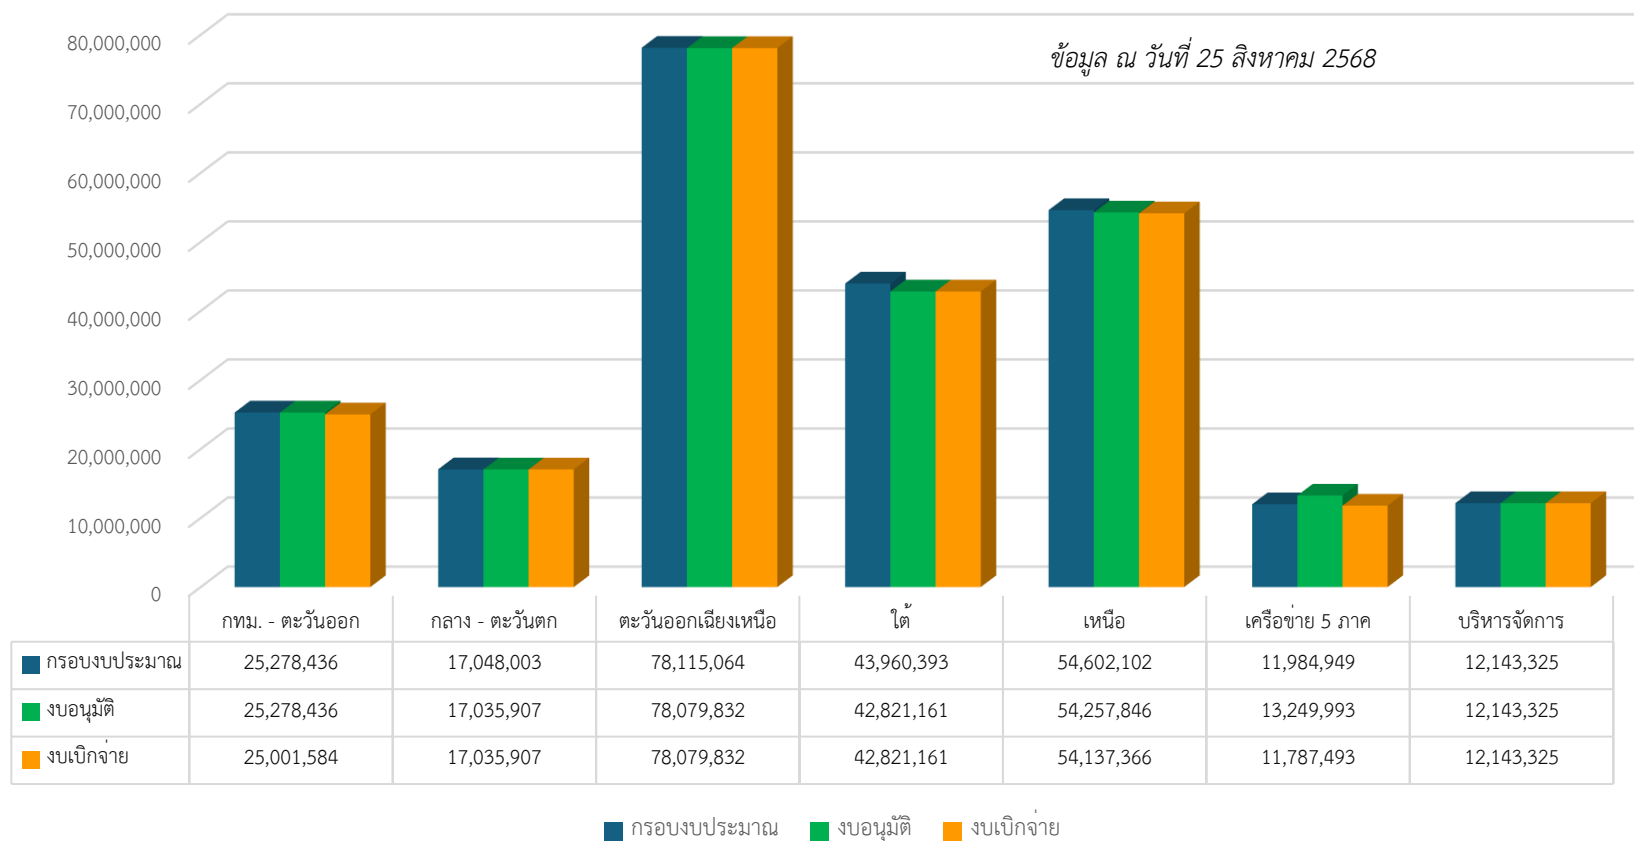

หมายเหตุ การอนุมัติงบประมาณของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค มีการอนุมัติงบประมาณเกินจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,530,816 บาท เนื่องจากเป็นงบที่จัดสรรเพิ่มเติมจากงบประมาณคงเหลืองบตามมติคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เพื่อเพื่อดำเนินงานโครงการสถานพลังภาคีพัฒนาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน ของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค

ตารางการแสดงผลสถานะการบันทึกข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi_pms/)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568

ภาค	จн.โครงการที่อนุมัติ	จн.โครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลการบันทึก						เอกสารแนบ						การปิดโครงการในระบบ
			มติ.กกภาค/จว	ข้อมูลโครงการ	ข้อมูลองค์กร	กิจกรรมโครงการ	MOU	แผนการเบิกจ่าย	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	เอกสารเบิกจ่ายงวด 1	เอกสารเบิกจ่ายงวด 2	เอกสารปิดโครงการ	
เหนือ	308	308	308	308	308	308	308	308	308	290	290	290	28	11	-
กทม - ตะวันออก	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	42	11	32
ใต้	210	210	210	210	210	210	210	210	210	93	93	93	51	10	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	453	459	21	170	170
กลาง - ตะวันตก	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	14	14	-
เครือข่าย สวก. 5 ภาค	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-
งบบริหารจัดการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
รวมทั้งหมด	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,135	1,129	1,135	156	216	202
คิดเป็นร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89.37	88.90	89.37	12.28	17.01	15.91

หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi_pms/)

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่ามีการบันทึกข้อมูลและการแนบเอกสาร ในระบบโปรแกรมฯ CODI – PMS เฟส 2 ประกอบด้วย ข้อมูลโครงการและการแนบไฟล์เอกสาร ได้แก่ บันทึกความร่วมมือ (MOU) แบบแสดงผลอนุมัติสำเนาสมุดบัญชี เอกสารเบิกจ่ายงวด 1 งวด 2 และเอกสารปิดโครงการ ฯลฯ โดยมีโครงการที่อนุมัติจำนวน 1,270 โครงการ แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน จำนวน 1,269 โครงการ และ (2) งบบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมฯ จำนวน 1,270 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เงื่อนไขกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในระบบโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ CODI – PMS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ และมีการปิดสถานะโครงการในระบบโปรแกรมฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 202 โครงการ จากภาคกรุงเทพฯ ปริมาณและตะวันออกจำนวน 32 โครงการ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 170 โครงการ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแนบเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด


ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนต่อไป

***ตารางแสดงระยะเวลาการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
เหนือ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 22 โครงการ	4.14	6 วัน	44 วัน	50 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 286 โครงการ	93.97	5 - 48 วัน	9 - 60 วัน	56 - 89 วัน	64 วัน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตะวันออก	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 39 โครงการ	21.79	7 - 29 วัน	3 - 48 วัน	32 - 55 วัน	44 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 140 โครงการ	78.21	9 - 14 วัน	46 - 85 วัน	57 - 99 วัน	74 วัน
ใต้	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	2.38	1 - 8 วัน	41 - 47 วัน	42 - 54 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 205 โครงการ	97.62	1 - 65 วัน	1 - 60 วัน	56 - 72 วัน	62 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 73 โครงการ	15.90	13 - 29 วัน	0 - 42 วัน	21 - 55 วัน	73 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 386 โครงการ	84.10	13 - 80 วัน	0 - 98 วัน	56 - 129 วัน	75 วัน
กลางและตะวันตก	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	4.55	5 - 13 วัน	17 - 50 วัน	30 - 55 วัน	43 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 5 โครงการ	95.45	0 - 67 วัน	0 - 65 วัน	56 - 73 วัน	62 วัน
เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค 3 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 2 โครงการ	66.67	35 วัน	14 วัน	49 วัน	49 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	33.33	55 วัน	25 วัน	80 วัน	80 วัน
งบบริหารจัดการ 1 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	100	112 วัน	75 วัน	187 วัน	187 วัน
รวมทั้งสิ้น 1,270 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 146 โครงการ	11.50	1 - 35 วัน	0 - 50 วัน	21 - 55 วัน	48 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1,124 โครงการ	88.50	0 - 112 วัน	0 - 98 วัน	56 - 187 วัน	69 วัน

จากระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ ได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับงาน ดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและถือเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน กลไกสวัสดิการชุมชนทุกระดับ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นจากกลไกการกลั่นกรองโครงการ ตั้งแต่คณะพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึงผู้อำนวยการภาค ลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และกระบวนการเบิกจ่ายโครงการ ระยะเวลาหลังจากผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึงกระบวนการเบิกจ่ายงวดแรก จำนวน 25 วัน จากการติดตามผลการบริหารโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

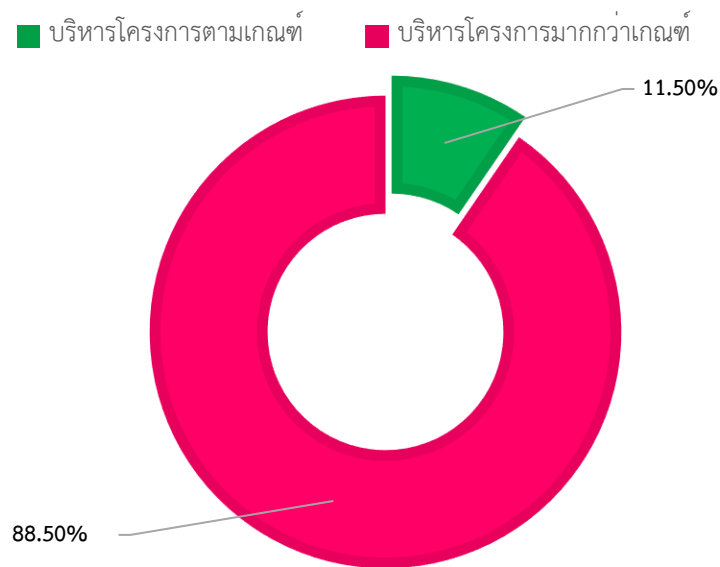

จากกราฟแสดงข้อมูลพบว่ามีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,270 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดระยะเวลาในการบริหารโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาในการบริหารโครงการตามเกณฑ์ จำนวน 146 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.50 ของจำนวนโครงการที่บันทึกทั้งหมด
- โครงการที่ใช้ระยะเวลาในการบริหารโครงการมากกว่าเกณฑ์ จำนวน 1,124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.50 ของจำนวนโครงการที่บันทึกทั้งหมด

การยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้งานสวัสดิการชุมชน

- 1) การส่งเสริมด้านระบบบัญชี การเงินและการบริหารจัดการที่ดี เครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับภาคร่วมกับกองเลขาสวัสดิการชุมชนระดับภาค ลงพื้นที่จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน (Codi_SWF) ให้กับกองเลขาสวัสดิการชุมชนระดับตำบล ระดับจังหวัด และระดับภาค ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเปิดใช้งานโปรแกรมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,323 กองทุน แบ่งเป็น ภาคกรุงเทพฯ ปริมาณและตะวันออก จำนวน 361 กองทุน ภาคเหนือ จำนวน 576 กองทุน ภาคกลางและตะวันตก จำนวน 520 กองทุน ภาคใต้ 515 กองทุน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,351 กองทุน
- 2) การยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นพื้นที่ต้นแบบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค และภาคีร่วมจัดประกอบด้วย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมมือสนับสนุนดำเนินงานการจัดประกวดรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศา สตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีผลงานโดดเด่นสมัครรับรางวัล รวมจำนวน 65 กองทุน และมีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ชนะการประกวด จำนวน 8 กองทุน จาก 10 ประเภทรางวัล สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้งานสวัสดิการชุมชนในระดับพื้นที่ในด้านต่างๆ ดังนี้
 - ด้านการพัฒนาสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองงูเห่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 - ด้านการพัฒนาสังคมสูงวัย : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 - ด้านการพัฒนาศึกษา การเรียนรู้ ทักษะการดำรงชีวิต : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ : กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 - ด้านการพัฒนาสมาชิกในชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 - ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน : องค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง (โคกสูง) อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 - ด้านการสร้างสังคมที่เป็นธรรม : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 - ด้านการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมและสุนทรียะ : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโชคชัย (นอกเขต) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อสังเกตปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

- 1) การปรับแบบฟอร์มการอนุมัติ – เบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ (Codi Project Management System) หรือ Codi_PMS ส่งผลให้ต้องมีการทำความเข้าใจทั้งเรื่องแบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการฯ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การอนุมัติ - เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
- 2) กลไกสวัสดิการชุมชนบางพื้นที่ ยังขาดความเข้าใจหลักคิด เจตนารมณ์ อุดมการณ์การสวัสดิการชุมชน และระบบการบริหารจัดการที่ดี ทำให้กองทุนสวัสดิการชุมชนในหลายพื้นที่ไม่เข้มแข็ง ซึ่งสำนักงานประสานขบวนการชุมชนและประชาสังคม ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค มีแผนในการจัดทำคู่มือการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเครื่องมือดำเนินงานให้กับขบวนการชุมชน ผู้ปฏิบัติงาน พอช. รวมถึงหน่วยงานภาคีและผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และมีการส่งเสริมการอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน (Codi_SWF) เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล
- 3) การสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งกองทุนที่จะได้รับการสมทบงบประมาณต้องได้รับรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 3472 ลงวันที่ 18 เมษายน 2568 ซึ่งมีหลายกองทุนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้หลายกองทุนขาดโอกาสในการที่จะได้รับการสมทบงบประมาณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค จึงประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนในระดับพื้นที่ จึงมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3472 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 เมษายน 2568 แจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ จัดเวทีสานพลังภาคีเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อาคารคอนเวนชัน (ชั้น 4) โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 450 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนสมาคมสันนิบาต ผู้แทนสมาคม อบต. และผู้แทนสมาคม อบจ. ผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิการชุมชน จากการจัดเวทีเกิดการสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานของเครือข่ายสวัสดิการชุมชนที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน หลักการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนในรูปแบบการสมทบสามขา (รัฐ : ประชาชน : ท้องถิ่น) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การสานพลังภาคีทุกภาคส่วนเพื่อหนุนเสริมงานสวัสดิการชุมชนในระดับพื้นที่ต่อไป
